

ផ្នែកទី ១

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ថ្នាក់រោងចាត់ ទេត្ត

354.968 - PDP-PIP. 2011
sh: Training

library.ncdd.gov.kh



015348

គ.ជ.អ.ប
NCDD



វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត

គម្រោងសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការ
នៅថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត (PILAC2)

មាតិកានៃឯកសារ

- ផ្នែកទី១៖
 - > សេចក្តីណែនាំពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត
- ផ្នែកទី២ ដល់ផ្នែកទី១០៖
 - > ដំណើរការ និងឧបករណ៍វិភាគលម្អិតសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត
- ផ្នែកទី១១ ដល់ផ្នែកទី១៤៖
 - > ដំណើរការ និងឧបករណ៍វិភាគលម្អិតសម្រាប់ការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
- ផ្នែកទី១៥៖
 - > ការពិភាក្សាស្តីពីគោលការណ៍ទាំងប្រាំបួន (០៩) នៃ CPDP និង CPIP

គ.ប.ស.ប
NCDD



ផ្នែកទី ១

សេចក្តីណែនាំពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

គម្រោងសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការ
នៅថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត (PILAC2)

គោលបំណង និងមាតិកា

គោលបំណងនៃផ្នែកទី ១៖

សិក្ខាកាមនឹងយល់ពីគោលបំណងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
និងចំណុចសំខាន់ៗនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល។

- មាតិកា៖
១. គោលបំណងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
 ២. សាវតារនៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
 ៣. វិន័យនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

គោលបំណងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

- អ្នកចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាចរៀបចំ ចាត់ចែងដំណើរការនៃការកសាង CPDP និង CPIP ។
- អ្នកចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាចពន្យល់ និងគាំទ្រដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដើម្បីត្រៀមរៀបចំឯកសារចាំបាច់នានា និងតារាងក្នុង CPDP និង CPIP ។

ទម្រង់អក្សរកាត់សំខាន់ៗ

CPDP = ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត

CPIP = កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

សិទ្ធិកាមគោលដៅ

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត
- មន្ត្រីរាជធានី ខេត្តពាក់ព័ន្ធ ដែលគាំទ្រដល់ការកសាង CPDP និង CPIP

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តសំខាន់ៗ

- ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (OL) ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨
- អនុក្រឹត្យស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ (អនុក្រឹត្យលេខ ២១៩ អនក្រ.បក)
- អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១២នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ (អនុក្រឹត្យលេខ ១៥២ អនក្រ.បក)
- ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ (ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៤១៧ ប្រក)

6

ច្បាប់រៀបចំអង្គការ

- ច្បាប់នេះជាច្បាប់មូលដ្ឋានដើម្បីកំណត់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក និងខណ្ឌ
- ច្បាប់នេះកំណត់អាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្នុងការកសាង CPDP និង CPIP
- រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវមានក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួនដែលត្រូវជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតអសកល
- ក្រុមប្រឹក្សា មានអាណត្តិ ០៥ឆ្នាំ។ (OL មាត្រា ១៥)

7

ច្បាប់រៀបចំអង្គការ (ត)

- ក្រុមប្រឹក្សា ត្រូវរៀបចំកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេល ៥ឆ្នាំ ដែលត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ឆ្នាំ តាមការរៀបចំ កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលប្រចាំឆ្នាំ។

8

អនុក្រឹត្យលេខ ២១៩

- ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩
- កំណត់នីតិវិធីសម្រាប់ការកសាងផែនការ CPDP និង CPIP
- កំណត់អំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា

9

អនុក្រឹត្យលេខ ២១៩ (ត)

■ ផែនការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ត្រូវប្រើប្រាស់ធ្វើជាមូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ណែនាំរាល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការងារអភិវឌ្ឍ ការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល។

អនុក្រឹត្យលេខ ២១៩ (ត)

- ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ខណ្ឌ សង្កាត់ត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍ និងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានីភ្នំពេញ
- ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់សង្កាត់ក្នុងក្រុងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ក្រុង

អនុក្រឹត្យលេខ ១៥២

- ប្រកាសឲ្យប្រើ នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០
- កែសម្រួលក្របខ័ណ្ឌពេលវេលាក្នុងការកសាង CPDP និង CPIP ដោយតម្រូវឲ្យក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ចាំបាច់ត្រូវកសាង CPDP និង CPIP ឱ្យបានយ៉ាងយូរ បំផុតក្នុងឆ្នាំទី២ នៃអាណត្តិក្រុមប្រឹក្សា

ប្រកាសអនុក្រឹត្យលេខ ២៤១៧

- ប្រកាសឲ្យប្រើ នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០
- កំណត់នីតិវិធីលម្អិតក្នុងការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល

វិន័យនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

▪ ក្នុងអំឡុងពេលនៃសិក្ខាសាលារយៈពេលបួន (០៤) ថ្ងៃ សិក្ខាកាមត្រូវគោរពនូវវិន័យមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

- សូមគោរពតាមពេលវេលា
- សិក្ខាកាមទាំងអស់ គួរចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឱ្យបានពេញលេញ
- សូមបិទទូរស័ព្ទដៃ ឬសូមដាក់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដោយសំលេងស្ងាត់ ដោយមិនមានសំលេងរោទី
- ធ្វើសំណួរសាកល្បងមុនវគ្គ និងក្រោយវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

សំណួរ និងចម្លើយ

▪ តើមានសំណួរទាក់ទងនឹងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឬទេ?

ಸ್ವಚ್ಛತೆ

16

ថ្ងៃកម្ចី ២

ចំណេញ ការ កសាង ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍

រយៈពេល ប្រាំឆ្នាំ រាជធានី ភ្នំពេញ

ជំហានទី ១

គ.ប.ស.ប
NCDD



ផ្នែកទី ២

**ដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត
ជំហានទី ១**

គម្រោងសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការ
នៅថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត (PILAC2)

គោលបំណង និងមាតិកា

គោលបំណងនៃផ្នែកទី ២ ៖

សិក្ខាកាមនឹងយល់ពីដំណើរការកសាងផែនការ
អភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត (CPDP)
ជំហានទី ១

មាតិកា៖

- ១- សាវតា
- ២- លទ្ធផលនៃដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
ជំហានទី ១

**ទំនាក់ទំនងរវាងសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេស
ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល និងឯកសារបទបង្ហាញ**

- សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
រាជធានី ខេត្ត ជាឯកសារផ្លូវការ រៀបចំដោយក្រសួងផែនការ និង
ក្រសួងមហាផ្ទៃ។
- ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី CPDP ត្រូវបានរៀបចំដើម្បីជួយ
អ្នកពាក់ព័ន្ធ ដែលទាក់ទងនឹងការកសាង CPDP ដោយផ្អែកលើ
សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសជាឯកសារយោង ។
- ឯកសារបទបង្ហាញរៀបចំឡើងដើម្បីបង្ហាញសិក្ខាកាម នូវចំណុច
ជ្រើសរើសសំខាន់ៗមួយចំនួន ផ្អែកលើឯកសារបណ្តុះបណ្តាល ។

គោលការណ៍ទាំងប្រាំមួយ (០៩) នៃ CPDP

- ការចែករំលែកព័ត៌មាន
- តម្លាភាព
- សង្គតិភាព និងសុខដុមនីយកម្ម
- ការចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ជាទូទៅ
- ការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ
- គណនេយ្យភាពតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
- ប្រសិទ្ធភាព និងសុក្រឹតភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
- ការធានាចីរភាពធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន
- ការធានាសមធម៌

អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ នៃ CPDP

- ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរាជធានី ខេត្ត (TFC) និងគណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សា
- គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ក្រុមការងារកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគ
- ទីចាត់ការនានានៃសាលារាជធានី ខេត្ត
- មន្ទីរ អង្គភាពនានាប្រចាំរាជធានី ខេត្ត
- ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- ប្រជាពលរដ្ឋ
- អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជន

តួនាទីរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ

តួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

- ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយទូទៅសម្រាប់រៀបចំខ្លឹមសារផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ពិនិត្យ និងអនុម័តប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ចូលរួមក្នុងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ពិនិត្យ និងអនុម័តផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ពិនិត្យ និងអនុម័តសំណើកែតម្រូវផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងករណីចាំបាច់
- តាមដាន និងវាយតម្លៃជារៀងរាល់ឆ្នាំលើការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍

តួនាទីរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (ត)

**តួនាទីរបស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស និង
គណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សា**

- ចូលរួមក្នុងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- សម្របសម្រួលការចូលរួមរបស់គ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ពិនិត្យ និងជូនយោបល់ទៅក្រុមប្រឹក្សា មុនធ្វើការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍

តួនាទីរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (ត)

តួនាទីរបស់គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត

- ដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលការងារកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ស្របតាមការណែនាំពីក្រុមប្រឹក្សាដោយសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានា
- ដឹកនាំសិក្ខាសាលា វេទិកាពិគ្រោះយោបល់នានា ក្នុងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ មុនក្រុមប្រឹក្សាអនុម័ត
- ដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សា ពិនិត្យនិងអនុម័តផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍

តួនាទីរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (ត)

តួនាទីរបស់ក្រុមការងារកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគ

- រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សា
- រៀបចំសេចក្តីព្រាងប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- រៀបចំសិក្ខាសាលា វេទិកាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- រៀបចំសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍

តួនាទីរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (ត)

តួនាទីរបស់ទីចាត់ការនានានៃសាលារាជធានី ខេត្ត

- ជួយក្រុមប្រឹក្សា និងគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្តក្នុងការដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលដំណើរការកសាង អនុម័ត តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត
- សហការជាមួយក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្តក្នុងការដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលការកសាង ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត
- ចូលរួមក្នុងការវិភាគស្ថានភាពរាជធានី ខេត្ត
- ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នានាស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

គុណទីរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (ត)

គុណទីរបស់មន្ទីរ អង្គភាពប្រចាំរាជធានី ខេត្ត

- ចូលរួម និងផ្តល់នូវព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ចូលរួមក្នុងការវិភាគស្ថានភាពរាជធានី ខេត្ត
- ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នានាស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

គុណទីរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (ត)

គុណទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

- ចូលរួម និងផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត
- ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នានាស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

តួនាទីរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (ត)

តួនាទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

- កំណត់បញ្ហា និងតម្រូវការអាទិភាពនានា តាមរយៈការចូលរួមក្នុងដំណើរការកសាងផែនការឃុំ សង្កាត់
- ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នានាស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត
- ចូលរួមក្នុងការតាមដាន និងវាយតម្លៃលើការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍

12

តួនាទីរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (ត)


តួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជន

- ចូលរួម និងផ្តល់នូវព័ត៌មាននានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ចូលរួមក្នុងការវិភាគស្ថានភាពរាជធានី ខេត្ត
- ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សា និងពិគ្រោះយោបល់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍។

13

ដំណើរការកសាង CPDP និង CPIP


■ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត(CPDP)



■ កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត(CPIP)



នីតិវិធីកសាងផែនការ៖ ជំហានទី១

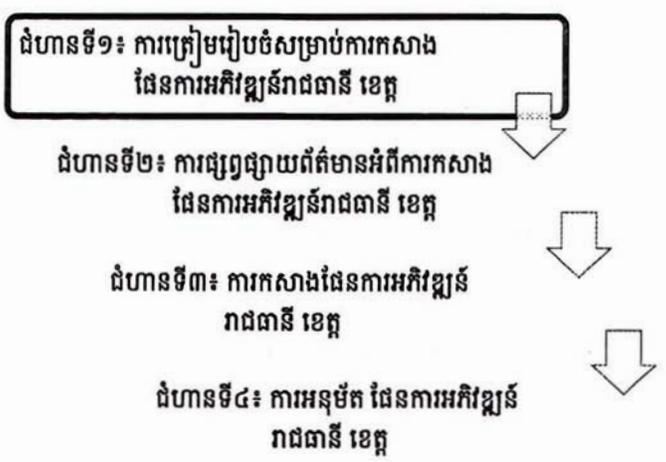

ជំហានទី១៖ ការរៀបរៀងចំណុចសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

គោលបំណង

- រៀបចំគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ប្រតិទិនការងារកសាងផែនការការណែនាំអំពីការបំពេញតារាងចាំបាច់នានា របស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ មន្ទីរ អង្គភាព អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជននានា
- រៀបចំទិន្នន័យ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

ជំហានទី១៖ ការរៀបរៀងចំណុចសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត (បន្ត)

លទ្ធផលរំពឹងទុក

- គោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ ស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត អនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- ប្រតិទិនការងារសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត ត្រូវបានរៀបចំ និងអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- តារាងបញ្ជីបូកសរុបបញ្ហា និងតម្រូវការនានារបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ មន្ទីរ អង្គភាព អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជននានា ត្រូវរៀបចំ (តារាង១.៥ តារាង១.៦ តារាង១.៧ និងតារាង១.៨)
- ឯកសារពាក់ព័ន្ធ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ រាជធានី ខេត្ត

ជំហានទី១៖ ការរៀបរៀងចំណុចសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

១-១. កិច្ចប្រជុំណែនាំ



១-២. ការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ



១-៣. ការរៀបចំប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការកសាងផែនការ
អភិវឌ្ឍន៍



១-៤. ការរៀបចំវឌ្ឍនភាពរបស់រាជធានី ខេត្តក្នុងការអនុវត្តគោល
ដៅអភិវឌ្ឍន៍ សហស្សវត្សកម្ពុជា



១-៥. ការរៀបចំបញ្ជីឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា

ជំហានទី១៖ ការរៀបរៀងចំណុចសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

១-១. កិច្ចប្រជុំណែនាំ

គោលបំណង

ដើម្បីផ្តល់ការណែនាំស្តីពីការបំពេញតារាងបញ្ហា និងតម្រូវការអាទិភាព

សមាសភាព

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត (PWG)
- តំណាងគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត (BOG)
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត និងតំណាងគណៈកម្មាធិការពាក់ព័ន្ធនានា
- តំណាងគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងមន្ទីរ អង្គការក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងវិស័យឯកជនសំខាន់ៗ ក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតតាមការចាំបាច់ ។

ជំហានទី១: ការរៀបរៀងចំណុចសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

១-១. កិច្ចប្រជុំណែនាំ (បន្ត)

លទ្ធផល

- ឯកសារបទបង្ហាញ,
- តារាង១.១ តារាង១.២ តារាង១.៣ និងតារាង១.៤

ជំហានទី១: ការរៀបរៀងចំណុចសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត (ត)

១-២. ការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ

គោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សា គឺជា ឯកសារមូលដ្ឋានគន្លឹះ សម្រាប់ណែនាំ និងតម្រង់ទិសក្នុងការកសាង ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត និងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត។ ឯកសារណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយនេះ ត្រូវផ្អែកលើតម្រូវការ មូលដ្ឋាន សក្តានុពលជាក់ស្តែង ដែលមានក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត និងឯកសារគោលនយោបាយថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត និងថ្នាក់ជាតិ។

ជំហានទី១៖ ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត (ក)

១-៣. ការរៀបចំប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍

- ប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ គឺផែនការសកម្មភាព ដែលកំណត់អំពីសកម្មភាព ពេលវេលា ទីកន្លែង អ្នកទទួលខុសត្រូវ និងធនធានដែលត្រូវការចាំបាច់ (ដូចទម្រង់តំរូវ)។
- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំសេចក្តីព្រាងប្រតិទិនការងារនេះ ដើម្បីដាក់ជូនគណៈអភិបាល ពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ មុននឹងដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យ និងអនុម័ត។

ជំហានទី១៖ ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

១-៣. ការរៀបចំប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ (បន្ត)

ល.រ	សកម្មភាព	ពេលវេលា	ទីកន្លែង	អ្នកទទួលខុសត្រូវ	ថវិកា	ផ្សេងៗ
-----	----------	---------	----------	------------------	-------	--------

ប្រតិទិនការងារកសាងផែនការខាងលើនេះ ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត _____ អនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំ _____ លើកទី _____ នាថ្ងៃទី _____ ខែ _____ ឆ្នាំ _____ ។

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

ជំហានទី១: ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

**១-៤. ការរៀបចំវឌ្ឍនភាពរបស់រាជធានី ខេត្តក្នុងការអនុវត្ត
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សកម្ពុជា**

ការិយាល័យផែនការរាជធានី ខេត្ត ដោយមានការជួយពីមន្ទីរផែនការ
រាជធានី ខេត្ត ត្រូវជួយរៀបចំឯកសារវឌ្ឍនភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត
ក្នុងការអនុវត្ត គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សកម្ពុជា ដោយផ្អែកលើ
ទិន្នន័យមូលដ្ឋានរាជធានី ខេត្ត ដោយធៀបនឹងចំណុចដៅ និង
សូចនាករនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សកម្ពុជា និងផែនការ
យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ទៅតាមនីតិវិធីដែលបានរៀបចំដោយក្រសួង
ផែនការ។

ជំហានទី១: ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

១-៥. ការរៀបចំបញ្ជីឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា

គោលបំណង

រៀបចំបញ្ជីឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា

សមាសភាព

- មន្ទីរ អង្គការរាជធានី ខេត្តពាក់ព័ន្ធ
- ក្រុមការងារកសាងផែនការ (PWG)

លទ្ធផល

ចតុតម្លងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា និងបញ្ជីឯកសារនានា

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ CPDP

- ប្រកាស ឬគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត
- ឯកសារព័ត៌មានស្ថានភាពរាជធានី ខេត្ត ដែលបានមកពីការច្នៃទិន្នន័យមូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់
- សេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានស្ថានភាពរាជធានី ខេត្តតាមផ្នែកនីមួយៗ (ទម្រង់គំរូ)
- ឯកសារវឌ្ឍនភាពនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ក្នុងការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហវត្សរ៍ថ្នាក់មូលដ្ឋាន (ផ្តល់ដោយមន្ទីរផែនការរាជធានីខេត្ត)
- ឯកសារព័ត៌មានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ដែលមានសកម្មភាពក្នុងរាជធានី ខេត្ត

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ CPDP(ត)

- បណ្តាផែនទីធំៗ (ទំហំ A0 ឬ A1) (ប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំកសាងផែនការ) ដូចជា៖
 - ផែនទីភូមិសាស្ត្ររដ្ឋបាលបង្ហាញពីព្រំប្រទល់ ឬដង់ស៊ីតេ ប្រជាជន ការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមសំខាន់ៗ
 - ឯកសារផែនការអភិវឌ្ឍន៍ពីមុនរបស់រាជធានី ខេត្ត (បើមាន)
 - ផែនការអភិវឌ្ឍរបស់វិស័យ និង ឬ ថ្នាក់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធនានា
 - ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
 - តារាងម៉ាទ្រិចសកម្មភាពអាទិភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត (យកតាមកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយ)
 - តារាងបញ្ហា និងតម្រូវការសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖
 - តារាង ១.១/ ១.២/ ១.៣/ ១.៤/ ១.៥/ ១.៦/ ១.៧/ ១.៨

សូមអរគុណ !

28

ផ្នែកទី ៣

ដើមឈើបណ្ណា និង

ដើមឈើដំណោះស្រាយ


គ.ជ.ប
NCDD



ផ្នែកទី ៣

ដើមឈើបញ្ហា និង ដើមឈើដំណោះស្រាយ

គម្រោងសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការ
នៅថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត (PILAC 2)

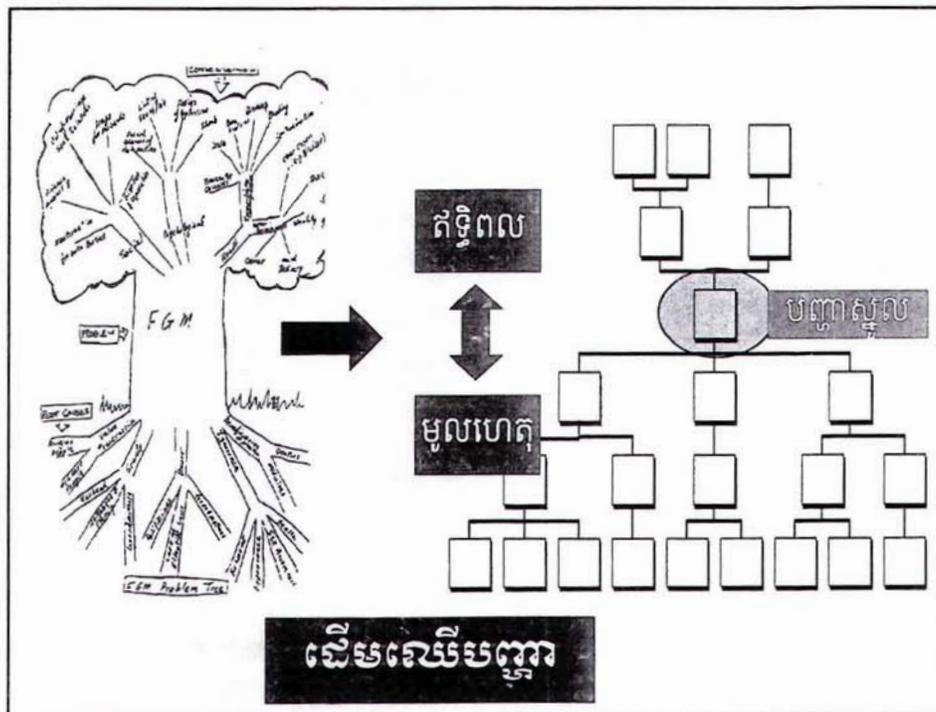

ដើមឈើបញ្ហា

ដើមឈើបញ្ហា៖ ជាឧបករណ៍សម្រាប់វិភាគស្ថានភាព ដោយផ្ដោតលើបញ្ហា មូលហេតុនៃបញ្ហា និងឥទ្ធិពលដែលកើតចេញពីបញ្ហានោះ

គោលបំណង៖ ដើម្បីកំណត់ពីបញ្ហាស្នូល មូលហេតុ និងឥទ្ធិពលដែលនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំចេញជា គម្រោង ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្នូលនោះ


ផ្នែកទាំងបីនៃដើមឈើបញ្ហា៖ ដើម(បញ្ហាស្នូល) ឫស(មូលហេតុ) និងមែកធាង(ឥទ្ធិពល)

3

ការកំណត់បញ្ហាស្នូល

បញ្ហាស្នូល គឺជាចំណុចផ្ដើមនៃការវិភាគដើមឈើបញ្ហា

→ ទំហំនៃការវិភាគ គឺអាស្រ័យទៅលើការកំណត់ បញ្ហាស្នូល

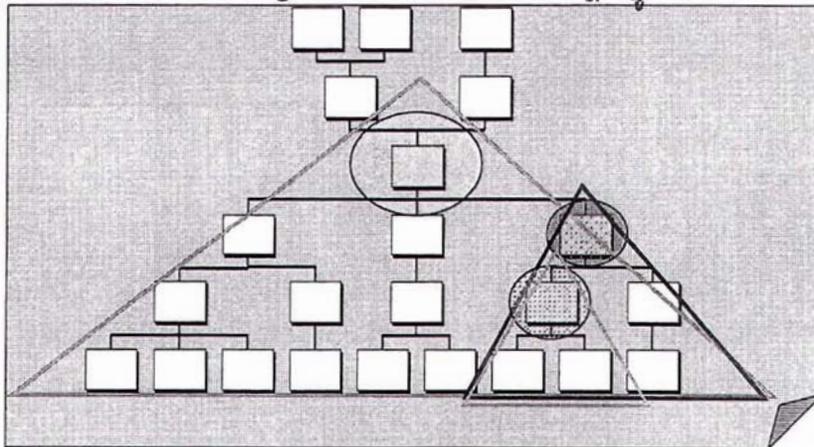

4

**តើគ្រូធ្វើដូចម្តេច
ដើម្បីបង្កើត
ដើមឈើបញ្ហា ?**

5

ជំហានសំខាន់ៗសម្រាប់បង្កើតដើមឈើបញ្ហា

1. ពិចារណាអំពី *បញ្ហា* ដែលអាចមាន ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្តែង
2. កំណត់រក *បញ្ហាស្នូល* ដែលជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់ធ្វើការវិភាគ (ការពិនិត្យមើលនូវទំនាក់ទំនងនៃបញ្ហានានាដែលរកឃើញនៅចំណុចទី1 ខាងលើ អាចជួយឲ្យយើងរកឃើញនូវ *បញ្ហាស្នូល* នេះ)
3. កំណត់ថា *បញ្ហាណាខ្លះជា មូលហេតុ ហើយ បញ្ហាណាខ្លះជា ឥទ្ធិពល*។ *បញ្ហាណាជាមូលហេតុ ត្រូវដាក់នៅខាងក្រោម បញ្ហាស្នូល ហើយបញ្ហាណាជាឥទ្ធិពល ត្រូវដាក់នៅខាងលើ បញ្ហាស្នូល*

6

ជំហានសំខាន់ៗសម្រាប់បង្កើតដើមឈើបញ្ហា

4. បន្តពិចារណារៀបចំជាទំនាក់ទំនងឃាតានុក្រមនៃ មូលហេតុ និង ឥទ្ធិពល ខាងលើ(បញ្ហាណា ជាហេតុដែលនាំឲ្យមាន បញ្ហាមួយ ទៀត ត្រូវដាក់បញ្ហាជាហេតុនោះ នៅខាងក្រោម)៖

- បើបញ្ហា ក គឺជាហេតុដែលនាំឲ្យមានបញ្ហា ខ


នោះបញ្ហា ក ត្រូវនៅពីក្រោមបញ្ហា ខ

- បើបញ្ហា គ គឺជាផលដែលកើតចេញពីបញ្ហា ខ

នោះបញ្ហា គ ត្រូវនៅពីលើបញ្ហា ខ

ជំហានសំខាន់ៗសម្រាប់បង្កើតដើមឈើបញ្ហា

5. គូសបន្ទាត់ភ្ជាប់បញ្ហាទាំងនោះ ដើម្បីបង្កើតជា ដើមឈើបញ្ហា (ត្រូវ ពិចារណារក មូលហេតុ - ឥទ្ធិពល បន្តទៀត បើចាំបាច់)

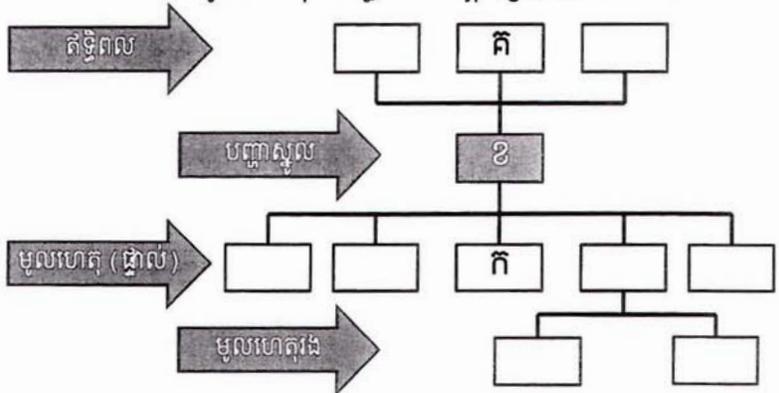

ជំហានសំខាន់ៗសម្រាប់បង្កើតដើមឈើបញ្ហា

6. ពិចារណាលើបញ្ហានីមួយៗ ដើម្បីកំណត់កមើលបញ្ហាយេនឌ័រ ដែលអាចត្រូវបានមើលរំលង

ឧទាហរណ៍៖ ការមិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់

→ បញ្ហាយេនឌ័រដែលមើលរំលង៖ ស្ត្រីត្រូវទទួលបន្ទុកក្នុងការដងទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់

→ បន្ទាប់ពីបង្កើតដើមឈើបញ្ហាហើយ ត្រូវបំរែបំរួលដើមឈើបញ្ហានោះទៅជា ដើមឈើដំណោះស្រាយ

9

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច

ដើម្បីបង្កើត


ដើមឈើដំណោះស្រាយ ?

10

ជំហានសំខាន់ៗសម្រាប់បង្កើតដើមឈើជំនេរការស្រាយ

1. កែសម្រួលឃ្លា បញ្ហាស្នូល ទៅជា គោលដៅ ដោយការប្តូរឃ្លាបញ្ហា ពីមុន ទៅជាស្ថានភាពជាវិជ្ជមាន ដែលក្នុងនោះ បញ្ហាស្នូល ត្រូវ បានដោះស្រាយ
2. កែសម្រួលឃ្លា មូលហេតុផ្ទាល់ ទៅជា គោលបំណង តាមវិធីដូច ខាងលើ
3. កែសម្រួលឃ្លា មូលហេតុរង ទៅជា គោលបំណងរង តាមវិធីដូច ខាងលើ

ដើមឈើជំនេរការស្រាយ

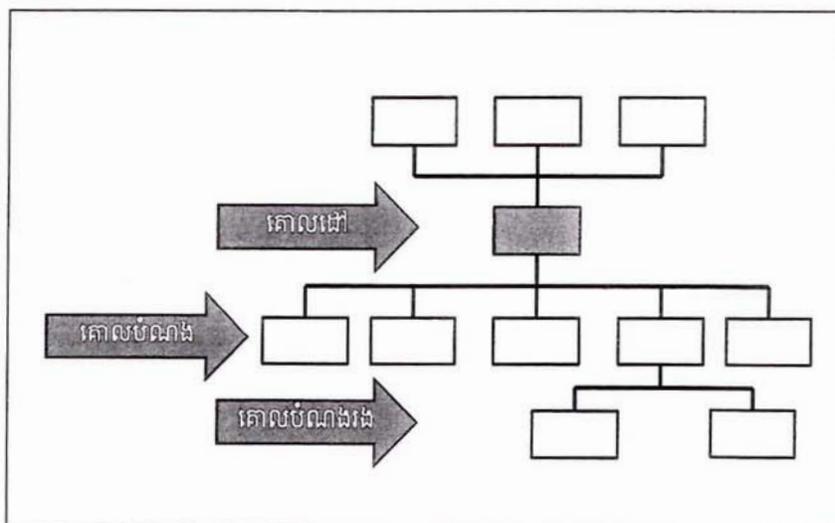

កំណត់សម្គាល់

ត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ននូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

- បញ្ហា គឺជា ឃ្លាដែលមានន័យអវិជ្ជមាន
- ដំណោះស្រាយ គឺជា ឃ្លាដែលមានន័យវិជ្ជមាន
- ហេតុ និង ផល ត្រូវសរសេរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
- បញ្ហា ត្រូវសរសេរតែបញ្ហាណាដែលមានជាក់ស្តែង
- ដំណោះស្រាយ ត្រូវតែជា ដំណោះស្រាយ ដែលអាចអនុវត្តបាន
- ត្រូវសរសេរ ឃ្លា ឲ្យមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់
- បញ្ហាណាដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន ត្រូវដកទុកដោយឡែក

13

កំណត់សម្គាល់ (ត)

- ចៀសវាងសរសេរ ឃ្លាថា "អត់មានរបស់នេះ ឬរបស់នោះ"
- ត្រូវសរសេរ ដោយគិតពីលទ្ធផលដែលកើតចេញពី ការអត់មានរបស់នោះ

ឧទាហរណ៍

មិនល្អ

គ្មានមន្ទីរពេទ្យ



ល្អ

ប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលសេវាសុខភាពបានគ្រប់គ្រាន់

14

ករណីសិក្សា (១)

ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមួយបានឲ្យដឹងថា រយៈពេល១ខែមកហើយ ដែលសត្វពាហនៈរបស់ពួកគាត់បានរងនូវជំងឺអុតក្លាមចម្លែកមួយ ដែលធ្វើឲ្យសត្វទាំងនោះងាប់ក្នុងរយៈពេលពី ៤ ទៅ ៥ថ្ងៃ បើទោះបីជាមានការជួយសង្គ្រោះពីសំណាក់ពួកគាត់យ៉ាងណាក្តី ជាពិសេសគ្រួសារដែលមានស្រ្តីជាមេគ្រួសារ។

ដោយឃើញសភាពបែបនេះ ពួកគាត់ក៏បានរាយការណ៍ជូនទៅលោកមេឃុំ ប៉ុន្តែពុំបានទទួលផលអ្វីជាជុំវិញឡើយ ក្រៅពីការជួយសង្គ្រោះពីសំណាក់មន្ត្រីបសុពេទ្យដែលមានភាពយឺតយ៉ាវ និងឆក់ល្ងែងជាទីបំផុត។ ដោយសារពុំមានលុយបង់ អ្នកភូមិមិនអាចហៅពេទ្យសត្វមកចាក់ថ្នាំបានទេ ជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់បង្ខំលក់សត្វឈឺទាំងនោះ ទៅឲ្យអ្នកកាប់សាច់លក់ (រួចបញ្ជូនទៅទីសត្តុយាត)។

15


ករណីសិក្សា (១)

ប្រជាពលរដ្ឋជាស្រ្តីម្នាក់នៅក្នុងភូមិ បានឲ្យដឹងថា ពួកគាត់នឹងខ្វះកម្លាំងសម្រាប់អូសទាញនាវាដូរបង្កបង្កើនផលឆ្នាំក្រោយ។


លោកមេឃុំបានលើកឡើងថា គាត់បានរាយការណ៍ទៅខាងស្រុក និងបានដុតសត្វដែលងាប់ដោយសារជំងឺនោះខ្លះដែរ ប៉ុន្តែមិនបានទាំងអស់នោះទេ។ ព្រមជាមួយនេះ លោកប្រធានមន្ទីរជំនាញខេត្តក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថា ចំពោះករណីនេះ ខាងមន្ទីរបានចាត់ឲ្យមន្ត្រីពេទ្យសត្វចុះទៅមូលដ្ឋានហើយ តែបើចង់ដឹងច្បាស់សូមសួរទៅខាងពេទ្យសត្វទើបដឹងរឿងកាន់តែច្បាស់។


16


ការវិនិច្ឆ័យលើករណីសិក្សា ១. កំណត់អំពីបញ្ហាសាធារណៈដែលគេគ្រោក

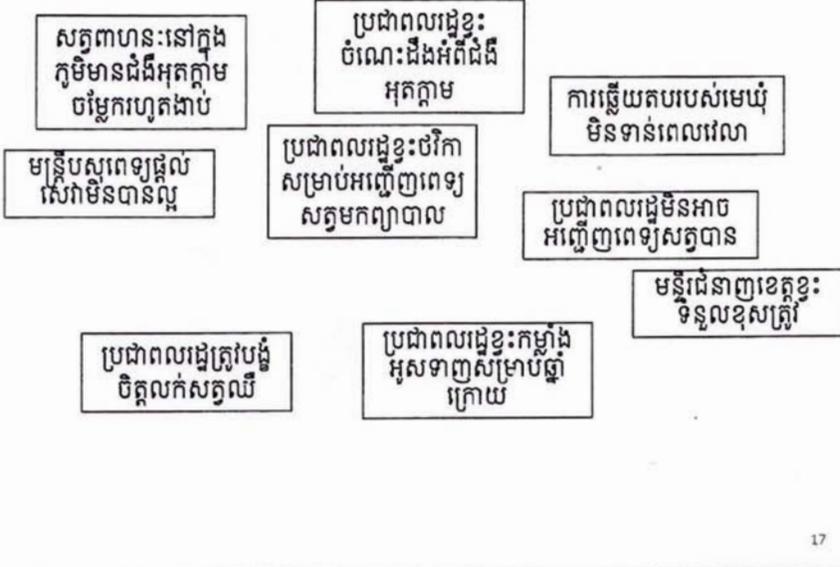


ការវិនិច្ឆ័យលើករណីសិក្សា ២. កំណត់អំពីបញ្ហាស្នូល

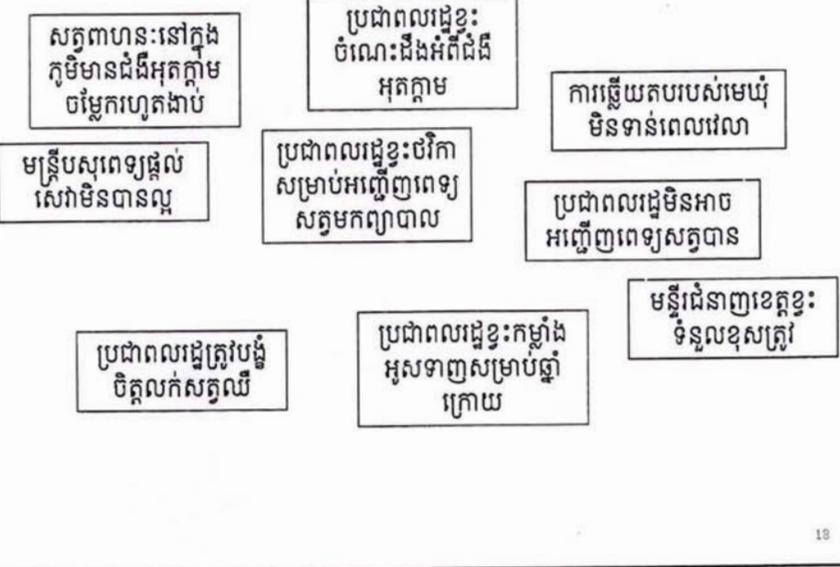

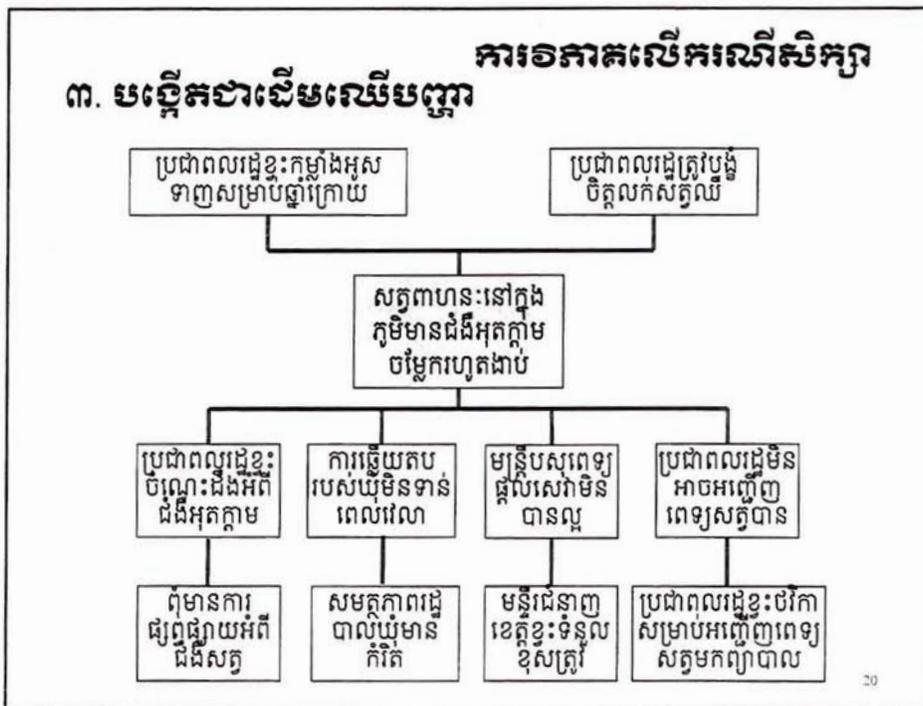

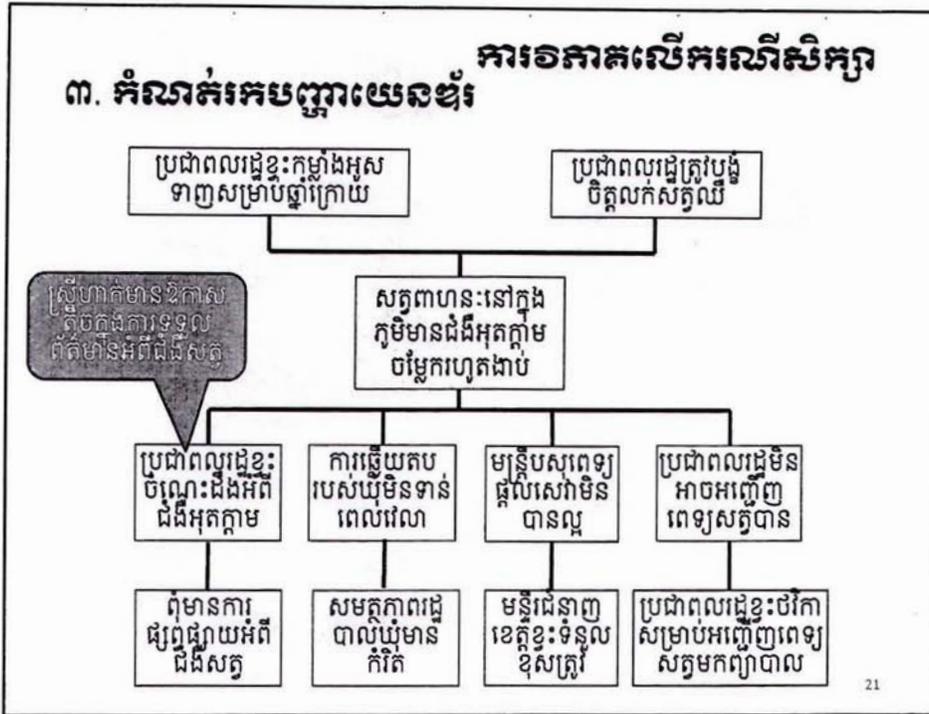

21

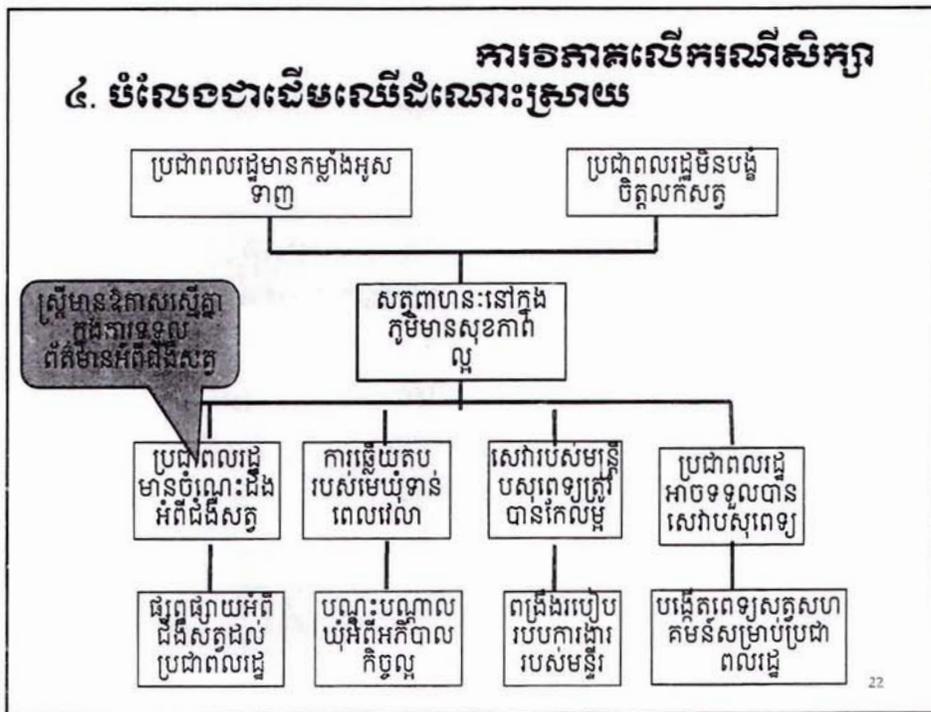

22

**លទ្ធផលវិភាគ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បី
បញ្ជូនទៅក្នុង តារាង ១.១ ជន ១.៤**

ការវិភាគដើមឈើបញ្ហា/ ដើមឈើដំណោះស្រាយ	តារាង ១.១ ដល់តារាង ១.៤
បញ្ហាស្នូល	បញ្ហា
មូលហេតុផ្ទាល់	មូលហេតុ
មូលហេតុរង	-----
គោលដៅ	សកម្មភាព ឬសេវា
គោលបំណង	-----
គោលបំណងរង	ដំណោះស្រាយ

23

លំហាត់

- ១) សិក្ខាកាមត្រូវបែងចែកជា ២ក្រុម
- ២) ស្នើឱ្យសិក្ខាកាមអាននូវករណីសិក្សាដែលបានចែកជូន
- ៣) ជាដំបូង ពិភាក្សា និងពិនិត្យលើបញ្ហាស្នូល
- ៤) កសាងបញ្ហាដើមឈើ
 - ដើម្បីបំពេញតារាងនៃផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេល
ប្រាំឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត សូមរកបញ្ហាឱ្យដល់មូលហេតុរង។
- ៥) កសាងដើមឈើដំណោះស្រាយ

(១ម៉ោង ៤០នាទី)

24

સ્વપક્ષલગ્ન!

ផ្នែកទី ៣:

ករណីសិក្សា: បញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ទឹក

[ព័ត៌មានទូទៅ]

លក្ខណៈទូទៅនៃទីក្រុងបាអាស

ទីក្រុងបាអាស គឺជារាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេស។

ផ្ទៃក្រឡា : ប្រហែល ៧៩០ គីឡូម៉ែតការ៉េ (km²)

ចំនួនប្រជាជន : ប្រហែល ៦លាននាក់

[ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុងទីក្រុងបាអាស និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន]

១. ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក (តំបន់គ្របដណ្តប់ដោយក្រុមហ៊ុន BWSC) នៅក្នុងទីក្រុងបាអាស

ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាធារណៈ ត្រូវបានដំណើរការនិងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន BWSC នៅក្នុងទីក្រុង បាអាស។ សេចក្តីលម្អិតនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងការរៀបចំចាត់ចែងរបស់ BWSC មានបង្ហាញដូចខាងក្រោម។

១-១. បណ្តាញចែកចាយទឹក រោងចក្របន្សុទ្ធទឹក និងប្រភពទឹក

៧៥%នៃទឹកស្អាតត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងតំបន់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុន BWSC តាមរយៈបណ្តាញចែកចាយទឹក។ តំបន់នេះភាគច្រើនជាតំបន់ប្រជុំជន និងតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម។ ទឹកត្រូវបានបន្សុទ្ធផងនៅរោងចក្របន្សុទ្ធទឹកចំនួន២នៅក្នុងទីក្រុងបាអាស។ ប្រភពទឹក គឺទន្លេចៅ។ ទន្លេនេះគឺមិនដែលរឹងស្ងួតទេ ប៉ុន្តែកម្រិតទឹកធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងរដូវប្រាំង។

▶ រោងចក្របន្សុទ្ធទឹក ក:

បានសាងសង់២ឆ្នាំមុន និងមានដំណើរការពេញលេញ។ ថវិកាភាគច្រើនសម្រាប់ការទិញសារធាតុគីមី និងគ្រឿងបន្លាស់ គឺពឹងផ្អែកទៅលើការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីម្ចាស់ជំនួយ។

▶ រោងចក្របន្សុទ្ធទឹក ខ:

រោងចក្រនេះចាស់ ហើយដំណើរការមិនសូវល្អ។ រោងចក្រនេះអាចផ្តល់បានត្រឹមតែ ៦០%នៃសមត្ថភាពដើមរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះ។ សម្ភារៈបរិក្ខារមួយចំនួនត្រូវបានខូចខាត ពីព្រោះសម្ភារៈបរិក្ខារទាំងនេះកម្រធ្វើការសាកល្បង ឬថែទាំជាប្រចាំ។ ជាញឹកញាប់សារធាតុគីមីបន្សុទ្ធទឹកបានអស់ ដោយសារក្រុមហ៊ុន BWSC ខ្វះថវិការ ។

១-២. បណ្តាញចែកចាយទឹក ស្ថានីយ៍បូមទឹក និងប្រភពទឹក

ទឹក២៥% នៃតំបន់ផ្តល់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុន BWSC ត្រូវឆ្លងកាត់បណ្តាញចែកចាយទឹក។ តំបន់នេះ រួមមានទីក្រុងចាស់ និងតំបន់ប្រជាជនដែលមានចំណូលទាបរស់នៅ។ ទឹកត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ពីស្ថានីយ៍បូមទឹកទាំង៥ ដែលដាក់ពង្រាយជុំវិញទីក្រុង។ ស្ថានីយ៍បូមទឹកនីមួយៗ មានអណ្តូងជ្រៅផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធ្វើជាប្រភពទឹក។ ប្រព័ន្ធនេះសមត្ថភាពនៅមានកម្រិត ពីព្រោះវាចាស់ណាស់ទៅហើយ (ដែលបានសាងសង់តាំងពីសម័យអាណានិគមមកម៉្លេះ)។

២. កំណត់មញ្ញានានា

២-១. ចំនួនទឹកផ្គត់ផ្គង់ដោយបណ្តាញចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុន BWSC គឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់

អត្រាជ្រាបទឹក ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានខ្ពស់ជាង ៥០%

- បំពង់ចែកចាយមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោម
- អ្នកបច្ចេកទេសមានសមត្ថភាពនៅមានកម្រិត ដើម្បីស្វែងរក និងជួសជុលកន្លែងជ្រាបទឹក
- ការលើកទឹកចិត្តចំពោះអ្នកបច្ចេកទេសនៅមានកម្រិតទាប

២-២. នៅទីក្រុងបាអាន ទឹកត្រូវបានគេលួចប្រើ

- ការខូចគ្រឿងបំណែកណាមួយ (បំពង់ និងនាឡិកាសម្រាប់វាស់) មិនត្រូវបានជួសជុល
- ប្រជាជនមានសីលធម៌ទាប
- ការពេញចិត្តទៅលើសេវារបស់ក្រុមហ៊ុន BWSC មានកម្រិតទាប

▶ ករណីទី១: ការដោះនាឡិកាវាស់ទឹកចេញ

ជាញឹកញាប់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន ដោះនាឡិកាវាស់ទឹកដែលបំពាក់នៅលើផ្លូវចេញ។ ពួកគាត់ដងទឹកពេញៗធុង។ ក្រុមហ៊ុន BWSC អាចប្តឹងចំពោះបុគ្គលដែលដោះនាឡិកាទឹកចេញ ប្រសិនបើអាចរកឃើញបុគ្គលនោះ។ វិធីសាស្ត្រនេះមិនបានជួយបញ្ឈប់អ្នកដែលលួចទឹកបន្ទាប់ពីបានដោះនាឡិកាទឹកចេញទាំងនោះទេ។

▶ ករណីទី២: ការបំពាក់ទុយយ៉ូទឹក

ប្រជាជនមួយចំនួនក្នុងចំណោមពួកគាត់ ភ្ជាប់ទុយយ៉ូទឹកនៅកន្លែងដំណរដែលខូច ដើម្បីតទៅផ្ទះរបស់ពួកគាត់តែម្តង។ ទម្រង់នៃការលួចបែបនេះកាន់តែមើលឃើញច្បាស់ឡើងប៉ុន្តែពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រង។

២-៣. ទឹកដែលបានចែកចាយតាមបណ្តាញដែលមិនសមរម្យសម្រាប់បរិភោគ

ទឹកដែលចេញមិនទៀងទាត់ និងមានសម្ពាធតាមបណ្តាញទឹកដែលចែកចាយមានគុណភាពអន់។ ទឹកដែលមានសម្ពាធតាម និងចេញមិនទៀងទាត់ គឺបណ្តាលមកពីការជ្រាប ការលូត និងការខូចខាតនូវសមត្ថភាពនៃបំពង់ចែកចាយ។

២-៤. បញ្ហាគ្រប់គ្រង និងរៀបចំ ចាត់ចែងរបស់ក្រុមហ៊ុន BWSC

កម្មករជាច្រើន ត្រូវបានការពារពីការកាត់បន្ថយបុគ្គលិក ហើយក្រុមហ៊ុន BWSC ទទួលរងសម្ពាធពីក្រសួង។ រដ្ឋាភិបាលបានម្តង ការបាត់បង់ការងារ មានន័យថាអ្នកគ្មានការងារមានកម្រិតខ្ពស់។ អ្នកគ្មានការងារធ្វើ អាចបណ្តាលឲ្យមានកុហកម្ម និងការបះបោរខាងនយោបាយ។

អតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន BWSC ដែលបច្ចុប្បន្ននេះបំរើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានបង្ហាញនូវទស្សនៈផ្សេងមួយថាៈ

“វាជាការពិតណាស់ ប្រសិនបើពួកគេអាចបញ្ឈប់ការជ្រាបទឹកនិងការលូតទឹកបាន BWSC នឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដ៏ល្អមួយ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំពុំគិតថា វាអាចធ្វើទៅរួចទេ។ ក្រុមហ៊ុននេះគ្មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អ្នកបច្ចេកទេស និងមិនមានអ្នកប្រមូលលុយគ្រប់គ្រាន់។ វាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់។ ក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកចំនួន ៤០០នាក់ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនមានអ្នកប្រមូលលុយគ្រប់គ្រាន់ ហើយក្រុមហ៊ុនមិនមានអ្នកបច្ចេកទេសល្អ និងមិនមានអ្វីអាចធ្វើបានទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ លុយដែលក្រុមហ៊ុនរកបានភាគច្រើន គឺចំណាយទៅលើប្រាក់ខែ និងឧបករណ៍គ្រឿងម៉ាស៊ីន ។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិក ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថា ក្រុមហ៊ុនមិនអាចធ្វើបានទេ។ ក្រុមហ៊ុនមិនអាចធ្វើអ្វីដែលក្រសួងមិនជំទាស់នោះទេ។ តើការគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងណា? ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវការការកែទម្រង់ជាមូលដ្ឋាន។ មិនមែនសម្ភារៈបរិក្ខារទេ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនតែម្តង។ ”

អ្នកប្រើប្រាស់ទឹកម្នាក់បានផ្តល់នូវទស្សនៈមួយផ្សេងទៀត:

“យើងត្រូវការទឹកដែលមានសុវត្ថិភាព។ ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីសោះ។
កូនស្រីរបស់ខ្ញុំមានជម្ងឺរាគតាំងពីសប្តាហ៍មុន។ គុណភាពទឹកប្រាកដជាមិនល្អ។
ហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវបង់លុយឲ្យសម្រាប់ការប្រើទឹកគុណភាពអន់បែបនេះ? ប្រជាជនលូចទឹក
ដោយសារក្រុមហ៊ុន BWSC មិនបានផ្តល់ទឹកស្អាតដល់ពួកយើង។ យើងត្រូវការទឹកស្អាត
និងអាចជឿទុកចិត្តបាន។ ប្រសិនបើអ្នកអាចធានានូវទឹកដែលមានសុវត្ថិភាព ខ្ញុំនឹងបង់
លុយឲ្យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទឹក។ ឬ ប្រសិនបើអ្នកប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួល
បានទឹកដែលមានសុវត្ថិភាព ខ្ញុំនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ នឹងអនុវត្តតាម។ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិន
ជួយយើង?”

ខាងលើនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាបឋម ដែលបានអនុវត្តដោយក្រុមរៀបចំគម្រោង។
បច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈសិក្ខាសាលាផែនការគ្រប់គ្រងវដ្តគម្រោង សូមពិភាក្សា និងវិភាគពី
លក្ខខណ្ឌ និងបញ្ហាព្រួយបារម្ភនានាអំពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្រុងបាអាស ។

ផ្នែកទី៣:

ករណីសិក្សា: ការលើកកម្ពស់សុខភាពស្រ្តី

[ព័ត៌មានទូទៅ]

ប្រទេស ក ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិន ដែលបានកែលម្អសេវាសុខភាពមាតា និងកុមារ និងសេវាព្យាបាលជាអទិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិ។ អត្រាមរណៈភាពមាតានៅក្នុងខេត្ត ខ ខ្ពស់ជាងអត្រាជាមធ្យមនៅថ្នាក់ជាតិ ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

ខេត្ត ខ គឺជាខេត្តមួយនៅក្នុងចំណោមខេត្តដែលត្រូវបំផុតនៃប្រទេស ក ដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗទ្រុឌទ្រោម។ លើសពីនេះទៀត បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពមានចំនួនតិច។ ការអង្កេតមួយបានធ្វើឡើងនៅក្នុងស្រុក ខ ហើយស្រុកនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាលក្ខខណ្ឌទូទៅនៅក្នុងខេត្ត ខ។

១. សេវាសុខាភិបាលនៅក្នុងស្រុក ខ

ស្ថាប័នព្យាបាលសុខភាពនៅក្នុងស្រុក ខ ខាងក្រោម ផ្តល់សេវាសុខភាពមាតា និងកុមារ។

១-១. មន្ទីរពេទ្យស្រុក

មន្ទីរពេទ្យស្រុក គឺជាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជម្ងឺទូទៅដែលមានទំហំមធ្យម ដោយមានគ្លីនិកពិនិត្យជម្ងឺក្រៅពិសេសមួយចំនួន និងមានគ្រែសម្រាប់អ្នកជម្ងឺប្រហែល ១០០គ្រែ។ អ្នកជម្ងឺអាចវិនិច្ឆ័យរោគពីមណ្ឌលសុខភាពភូមិ ប្រសិនបើត្រូវការការថែទាំពិសេសត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ។ ចំពោះសុខភាពមាតា និងកុមារ មន្ទីរពេទ្យផ្តល់សេវាដូចជា ការថែទាំមាតាការថែទាំកុមារ និងផែនការគ្រួសារ។ មន្ទីរពេទ្យថែមទាំងដើរតួនាទីក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពនៅតាម មណ្ឌលសុខភាពភូមិ ក៏ដូចជាការវិភាគ និងរក្សាទុកទិន្នន័យ។

១-២. មណ្ឌលសុខភាពភូមិ

មណ្ឌលសុខភាពភូមិផ្តល់សេវាសុខភាពនានាទៅដល់សហគមន៍មានដូចជា ការព្យាបាលជម្ងឺទូទៅ ការផ្តល់ថ្នាំបង្ការរោគ និងការឆ្លងទន្លេធម្មតា។ លើសពីនេះ មណ្ឌលសុខភាព ក៏ទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់សកម្មភាពអប់រំសុខភាពនានាដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ ប្រមូលទិន្នន័យស្ថិតិ និងរាយការណ៍ទៅមន្ទីរពេទ្យស្រុក។

២. មញ្ញានានាដែលបានកើតមាន

២-១. គុណភាពសេវាមានកម្រិតទាប

នៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាព កំហុសឆ្គងក្នុងការវិនិច្ឆ័យរោគ និងការឆ្លងរោគបន្ទាប់ពីទទួលការព្យាបាល បានកើតឡើងដោយសារគិលានុបដ្ឋាករិយការ និងឆ្មបខ្វះជំនាញ។ ការខ្វះជំនាញរបស់បុគ្គលិក ដោយសារមិនបានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជាទៀងទាត់ និងការណែនាំផ្លាស់ប្តូរមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់។ មូលហេតុទាំងនេះ ធ្វើអោយមានឱកាសតិចតួចក្នុងការចូលរួមសិក្ខាសាលា និងការបណ្តុះបណ្តាល ការខ្វះខាតច្បាប់ការងារ និងប្រាក់ខែទាបបើធៀបទៅនឹងបុគ្គលិកនៃស្ថាប័នព្យាបាលសុខភាពផ្សេងៗទៀត។

ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលនៃមន្ទីរពេទ្យស្រុក ទទួលបានបន្ទុកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលសមាជិកបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពភូមិ តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលទូទៅ តាមដានការបណ្តុះបណ្តាល និងការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសកម្មភាពអប់រំនានា។ បុគ្គលិកផ្នែក បណ្តុះបណ្តាលត្រូវបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពភូមិ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បុគ្គលិកផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលមិនមានលទ្ធភាពអនុវត្តការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឡើយ ដោយសារមូលហេតុដូចខាងក្រោម។

- បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យស្រុកខ្វះជំនាញសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល និងគ្រងគ្រង។
- ប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុក រៀបចំមិនបានល្អ។
- ខ្លឹមសារ និងចំនួននៃការបណ្តុះបណ្តាលមិនសមស្រប ពីព្រោះបុគ្គលិកផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលមិនយល់ច្បាស់ពីបច្ចេកទេស និងកម្រិតសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពភូមិ។

២-២. ប្រជាជនក្នុងភូមិមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានសេវាព្យាបាលនៅពេលចាំបាច់

លិខិតបទដ្ឋានថ្នាក់ជាតិ កំណត់ឱ្យមានគិលានុបដ្ឋាករិយការចំនួយពីររូប និងឆ្មបមួយរូបទៅបម្រើការក្នុងមណ្ឌលសុខភាពភូមិនីមួយៗ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី បុគ្គលិកដែលចាត់តាំងទៅមណ្ឌលសុខភាពភូមិនៅក្នុងស្រុក ខ មានតិចជាងតម្រូវការ។ មណ្ឌលសុខភាពខ្វះបុគ្គលិកថែទាំសុខភាព ពីព្រោះគិលានុបដ្ឋាករិយការ និងឆ្មបភាគច្រើនចង់ធ្វើការនៅតំបន់ប្រជុំជន។

ការផ្គត់ផ្គង់ឱសថសម្រាប់ព្យាបាលក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរ ដោយសារថវិកាមណ្ឌលសុខភាពភូមិមានតិចតួច ហើយសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ដែលមានប្រើប្រាស់នៅក្នុងភូមិមានកម្រិត។

២-៣. កត្តាអនាម័យរបស់មណ្ឌលសុខភាពភូមិមានកម្រិតទាប

បន្ថែមពីលើនេះ កត្តាអនាម័យរបស់មណ្ឌលសុខភាពភូមិភាគច្រើននៅមានកម្រិតទាប។ មូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុនានា គឺអាគារមានសភាពទ្រុឌទ្រោម និងខ្វះខាតការថែទាំជាប្រចាំ បណ្តាលឲ្យស្ទះទម្ងន់រទឹក និងមានធូលីដី។ ជួនកាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលប្រជាជនក្នុងភូមិ ជួសជុលមណ្ឌលសុខភាពតាមការយល់ឃើញ ដោយគ្មានមាត្រដ្ឋានច្បាស់លាស់ពីស្ថានភាពសម្ភារៈបរិក្ខារនានា។

២-៤. ស្ថានភាពលំបាករបស់ស្រ្តីក្នុងភូមិ

២-៤-១. ការទទួលបានព័ត៌មានចំពោះស្រ្តីនៅមានកម្រិត

នៅក្នុងស្រុក ខ ប្រជាជនជាច្រើនមិនយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំសម្រាប់ស្រ្តី ហើយស្រ្តីជាច្រើនមិនចូលរៀន និងមិនមានលទ្ធភាពចូលរៀន។ ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ស្រ្តីអំពីបញ្ហាសុខភាព និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅមានកម្រិត ដោយសារការខ្វះឱកាសចេញក្រៅភូមិ និងមិនមានសារព័ត៌មានដូចជាកាសែត និងទស្សនាវដ្តីជាដើម។

២-៤-២. ការខ្វះនូវសកម្មភាពអប់រំសមស្របពីមណ្ឌលថែទាំសុខភាពភូមិ

នៅក្នុងភូមិជាច្រើនក្នុង ស្រុក ខ សកម្មភាពអប់រំនានាដែលផ្តល់ដោយមណ្ឌលសុខភាពភូមិទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍តិចតួចណាស់ ពីព្រោះសុខភាពស្រ្តីមិនមែនជាអទិភាព។ បន្ថែមពីលើនេះ សកម្មភាពអប់រំនានានៅក្នុងភូមិមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ស្រ្តី ដោយសារវាហួសសម័យ ហើយខ្វះខាតសម្ភារៈ និងបុគ្គលិកមានជំនាញ។

២-៤-២. ការធ្វើការច្រើនពេកចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ

នៅតំបន់ជនបទ និងតំបន់ភ្នំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយព្រឹទ្ធាចារ្យដូចជាស្រុក ខ ការងាររបស់ស្រ្តី គឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់។ ស្រ្តីត្រូវធ្វើទាំងការងារផ្ទះ និងការងារកសិកម្ម រួមទាំងការមើលថែទាំសត្វចិញ្ចឹម។ ស្រ្តីនៅក្នុងស្រុក ខ ត្រូវធ្វើការងារកសិកម្មធ្ងន់ៗ ពីព្រោះដីនៅទីនោះគ្មានដីជាតិ ហើយបច្ចេកទេសកសិកម្មគឺហួសសម័យ។ ការផ្លាស់ប្តូរការដាំដំណាំធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរព្រោះដីកាន់តែឥតដីជាតិ ហើយចំណេះដឹង និងបច្ចេកទេសធ្វើដីនៅមានកម្រិត។ បន្ថែមពីលើនេះ ការងាររបស់ស្រ្តីមិនមានការកាត់បន្ថយទេក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ដោយសារខ្វះការយល់ដឹងចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងដោយសារការចាំបាច់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។ ការធ្វើការច្រើនពេកចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះដោយសារមូលហេតុទាំងនេះ ជាញឹកញាប់បណ្តាលឱ្យមានការឈឺចាប់ក្នុងរាងកាយ និងការរលូតកូន។

ផ្នែកទី ៤

លំហាត់៖

ការបំពេញតារាង ក្នុងជំហានទី ១

ផ្នែកតាមការវិភាគបញ្ហា/ ការវិភាគ

ដំណោះស្រាយ

គ.ជ.ប
NCDD



ផ្នែកទី ៤

លំហាត់

ការបំពេញតារាង ក្នុងជំហានទី ១

ផ្អែកតាមការវិភាគបញ្ហា/ការវិភាគដំណោះស្រាយ

គម្រោងសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការ
នៅថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត (PILAC2)

គោលបំណង និងមាតិកា

គោលបំណងនៃផ្នែកទី ៤ ៖

សិក្ខាកាមនឹងមានសមត្ថភាពបំពេញតារាង១.១ ដល់
តារាង១.៤ ផ្អែកតាមការវិភាគបញ្ហា/ ការវិភាគរក
ដំណោះស្រាយ

- មាតិកា៖
- ១.បទបង្ហាញ៖ វិធីបំពេញតារាង
 - ២.លំហាត់

តារាង១.១ នៃ CPDP

វិស័យ និង សកម្មភាព	បញ្ហា	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការយេនឌ័រ	អាទិភាព
--------------------	-------	---------	------------	-----------------	---------

១.ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

២.ផ្នែកសង្គមកិច្ច

៣.ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ

៤.ផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

តារាង១.២ នៃ CPDP

វិស័យ និងសេវា	បញ្ហា	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការយេនឌ័រ
---------------	-------	---------	------------	-----------------

១.ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

២.ផ្នែកសង្គមកិច្ច

៣.ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ

៤.ផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

តារាង១.៣ នៃ CPDP

វិស័យ និងសេវា	បញ្ហា	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការយេនឌ័រ
---------------	-------	---------	------------	-----------------

១.ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

២.ផ្នែកសង្គមកិច្ច

៣.ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ

៤.ផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

4

តារាង១.៤ នៃ CPDP

វិស័យ	សក្តានុពល (ភាពខ្លាំង)	ឧបសគ្គ (ភាពខ្សោយ)	ការវិនិយោគ (ដំណោះស្រាយ)	តម្រូវការយេនឌ័រ
-------	-----------------------	-------------------	-------------------------	-----------------

១.ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

២.ផ្នែកសង្គមកិច្ច

៣.ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ

៤.ផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

5

វិន័យនៃការបំពេញតារាង

ការវិភាគបញ្ហា និងការវិភាគកង្វះខាតស្រាយ	តារាង ១.១ ដល់តារាង ១.៤
បញ្ហាស្នូល	បញ្ហា
មូលហេតុផ្ទាល់	មូលហេតុ
មូលហេតុរង	-----
គោលដៅ	សកម្មភាព ឬសេវា
គោលបំណង	-----
គោលបំណងរង	ដំណោះស្រាយ
<ul style="list-style-type: none"> ▶ មូលហេតុរងក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមូលហេតុនៃតារាង ១.១ ដល់តារាង ១.៤ នៃ CPDP ។ ▶ ត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើទំហំនៃសកម្មភាព។ នៅពេលមូលហេតុផ្ទាល់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាធំធេងសម្រាប់រាជធានី ខេត្តពាក់ព័ន្ធ មូលហេតុរងអាចចាត់ទុកថាជាមូលហេតុនៃតារាងរបស់ CPDP ។ 	

6

ឧទាហរណ៍នៃការបំពេញតារាង

វិស័យ និងសកម្មភាព	បញ្ហា	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	កម្រិតការយេនឌ័រ	អាទិភាព
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច					
(វិស័យកសិកម្ម) សកម្មភាព	សត្វពាហនៈនៅក្នុងភូមិស្លាប់	១. ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះចំណេះដឹងអំពីជំងឺអុតក្លាម	១.១ ផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺសត្វដល់ប្រជាពលរដ្ឋ	១. ស្ត្រីហាក់មានឱកាសតិចក្នុងការទទួល ព័ត៌មានអំពីជំងឺសត្វ	
	សត្វពាហនៈនៅក្នុងភូមិមានសុខភាពល្អ	ដោយសារជំងឺអុតក្លាម	២. ការឆ្លើយតបរបស់មេឃុំមិនទាន់ពេលវេលា ៣. មន្ត្រីបសុពេទ្យផ្តល់សេវាមិនបានល្អ ៤. ប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចអញ្ជើញពេទ្យសត្វបាន	២.១ បណ្តុះបណ្តាលឃុំអំពីអភិបាលកិច្ចល្អ ៣.១ ពង្រឹងរបៀបរបបការងាររបស់មន្ត្រី ៤. បង្កើតពេទ្យសត្វសហគមន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ	១. ១

ប្រកាសប្រតិបត្តិការ ១.១ ដល់តារាង១.៤ នៅតារាង១.៥ ដល់តារាង១.៨

តារាង១.១ ដោយស្រក ក

កិច្ចការស្រុក	កិច្ចការស្រុក	កិច្ចការស្រុក	កិច្ចការស្រុក	កិច្ចការស្រុក
១. កិច្ចការស្រុក	សុខភាព	១. ប្រតិបត្តិការ	១. កិច្ចការស្រុក	១. កិច្ចការស្រុក
សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព
សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព

តារាង១.៥

កិច្ចការស្រុក	កិច្ចការស្រុក	កិច្ចការស្រុក	កិច្ចការស្រុក
១. កិច្ចការស្រុក	សុខភាព	១. ប្រតិបត្តិការ	១. កិច្ចការស្រុក
សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព
សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព

តារាង១.១ ដោយស្រក ខ

កិច្ចការស្រុក	កិច្ចការស្រុក	កិច្ចការស្រុក	កិច្ចការស្រុក	កិច្ចការស្រុក
១. កិច្ចការស្រុក	សុខភាព	១. ប្រតិបត្តិការ	១. កិច្ចការស្រុក	១. កិច្ចការស្រុក
សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព
សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព	សុខភាព

តារាង ១.១ -> តារាង ១.៥
 តារាង ១.២ -> តារាង ១.៦
 តារាង ១.៣ -> តារាង ១.៧
 តារាង ១.៤ -> តារាង ១.៨

តារាង១.៥ នៃ CPDP

វិធីសាស្ត្រ និងសកម្មភាព	ដំណោះស្រាយ	អាទិភាពក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ			អាទិភាពជា បច្ច័យ
		ស្រុក	ស្រុក	ស្រុក	

- ១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
- ២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច
- ៣. ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ
- ៤. ផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

តារាង១.៦ នៃ CPDP

វិស័យ និងសេវា	ដំណោះស្រាយ	ឈ្មោះបន្ទីរ អង្គការ			ចំនួនបន្ទីរ ដែលបានស្នើ
		បន្ទីរ...	បន្ទីរ...	បន្ទីរ...	

១.ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

២.ផ្នែកសង្គមកិច្ច

៣.ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ

៤.ផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

តារាង១.៧ នៃ CPDP

វិស័យ និងសេវា	ដំណោះស្រាយ	ឈ្មោះអង្គការ			ចំនួនអង្គការ ដែលបានស្នើ
		អង្គការ...	អង្គការ...	អង្គការ...	

១.ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

២.ផ្នែកសង្គមកិច្ច

៣.ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ

៤.ផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

តារាង១.៨ នៃ CPDP

វិស័យ និងសេវា	ដំណោះស្រាយ	ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន			ចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលបានស្នើ
		ក្រុមហ៊ុន...	ក្រុមហ៊ុន...	ក្រុមហ៊ុន...	

១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច

៣. ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ

៤. ផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

12

លំហាត់

- ១) សមាជិកក្នុងក្រុមដដែលនៅក្នុងផ្នែកទី ៣ បន្តធ្វើការជាមួយគ្នា។
(ក្រុម ក និងក្រុម ខ)
- ២) ស្នើសុំឲ្យក្រុមនីមួយៗ បំពេញតារាង១.១ ផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃលំហាត់ (ដើមឈើបញ្ហា/ដើមឈើដំណោះស្រាយ) ក្នុងផ្នែកទី៣ និងដើមឈើបញ្ហា/ដើមឈើដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀត។
- ៣) តារាងនានាដែលបានរៀបចំរួចរាល់កាលពីដំហានមុនៗ ត្រូវបូកសរុបទៅក្នុងតារាង១.៥។

(៨០នាទី)

13

សូមអរគុណ!

14


ផ្នែកទី៤- ឯកសារបែកជូន

ក្រុង ក


ការិភាគបញ្ចូល/ការិភាគដំណោះស្រាយ ១ ៖ បញ្ជីការផ្គត់ផ្គង់ទឹក (សូមបញ្ជូនពីផ្នែកទី៣)

ការវិភាគបញ្ហា/ការវិភាគដំណោះស្រាយ ២ ៖ បញ្ហាស្តុកស្តុក

ការវិភាគបញ្ហា

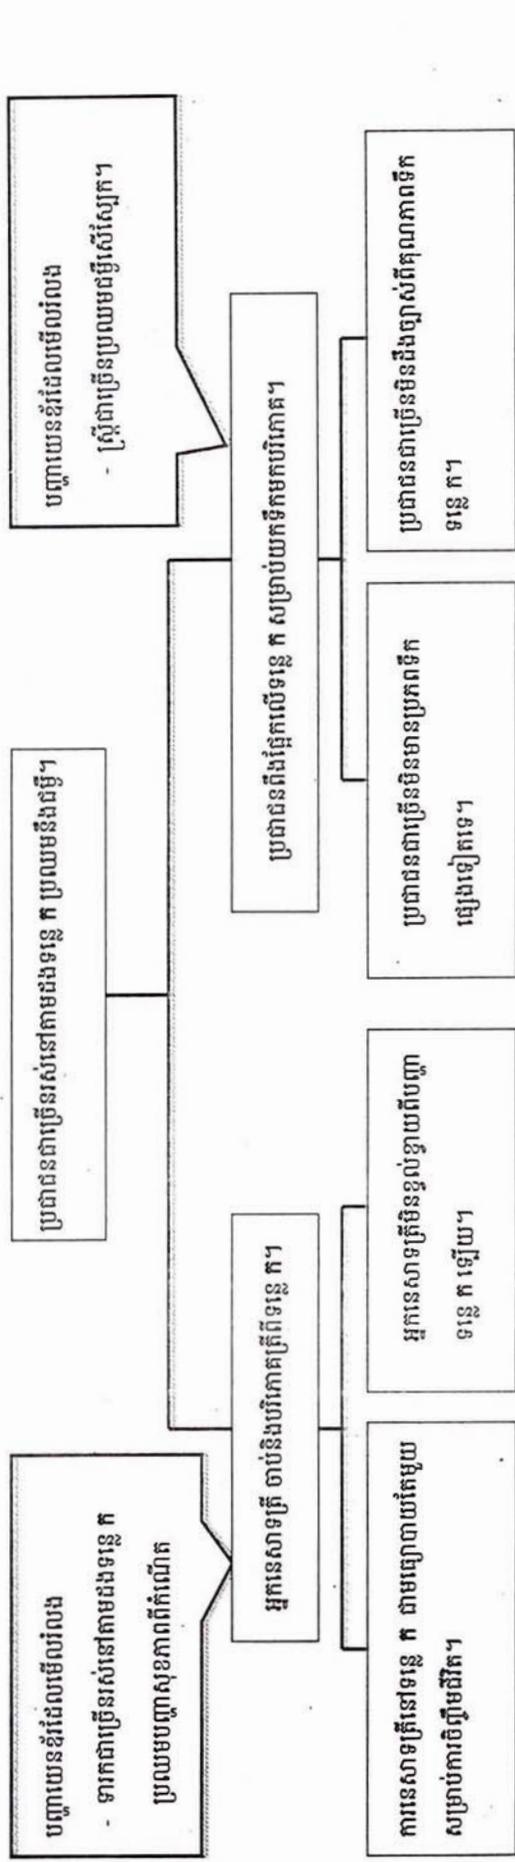


ការវិភាគដំណោះស្រាយ

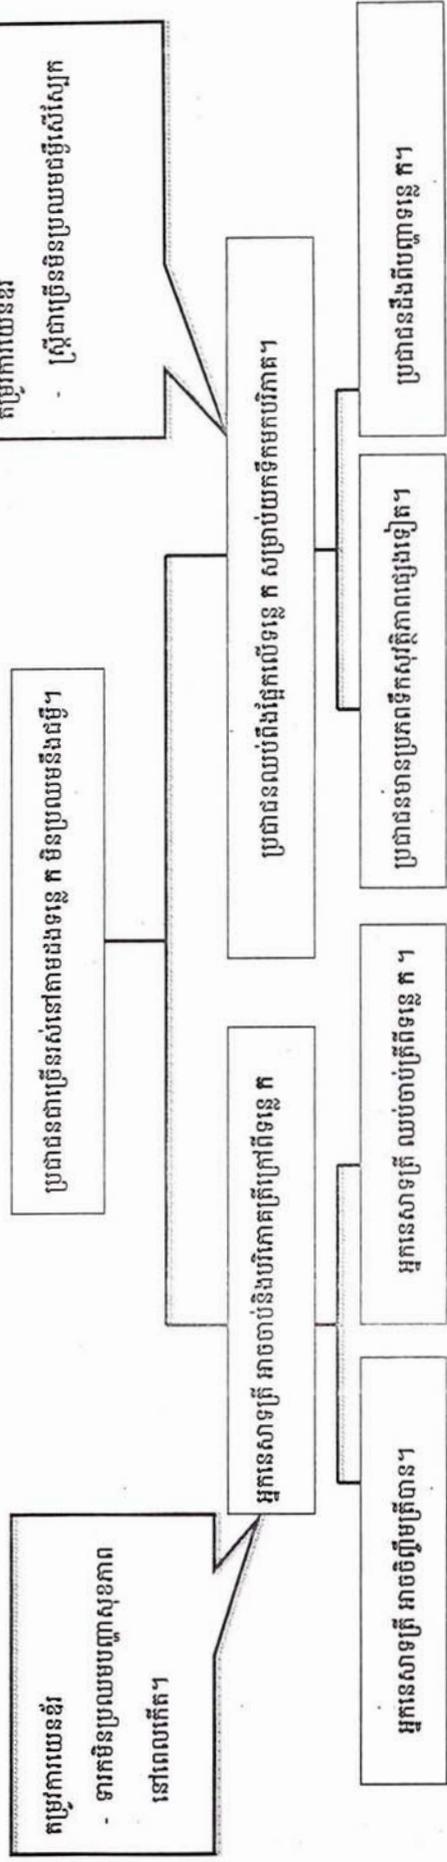


ការវិភាគបញ្ហា/ការវិភាគដំណោះស្រាយ ៣ ៖ បញ្ហាសន្តិសុខ

ការវិភាគបញ្ហា

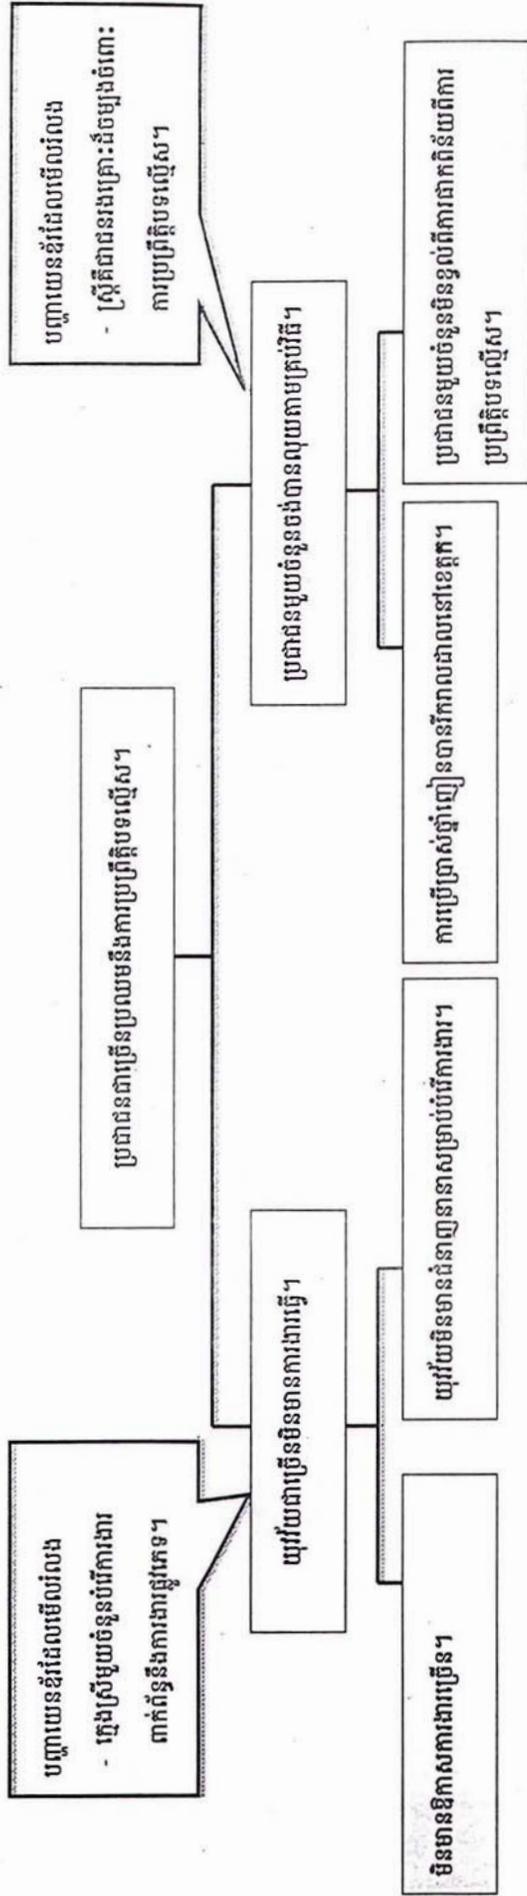

ការវិភាគកំណោះស្រាយ

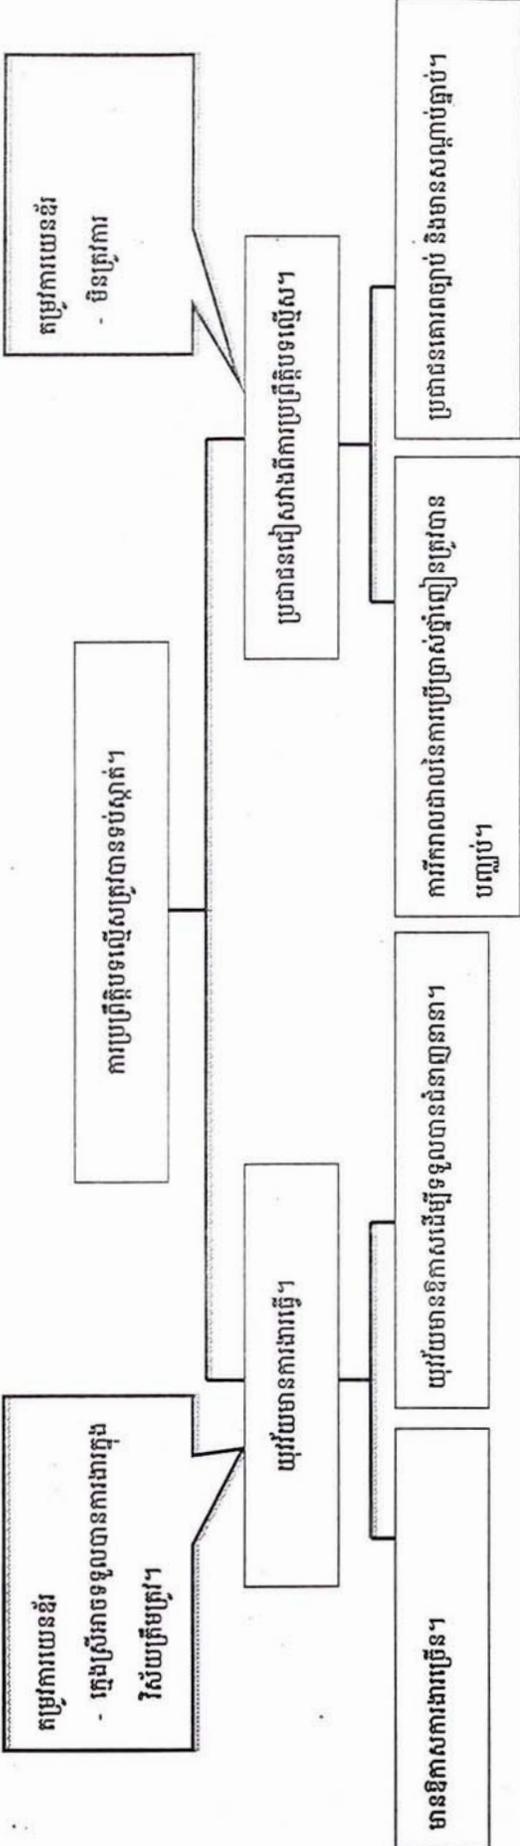

របស់សម្ព័ន្ធនៃវិស័យការពារអភិបាលកិច្ចស្តីពី (CPDP)

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាត្រូវ ចុះហត្ថលេខាលើអារម្ភកថា

ជំហានទី៣/៣-៤ ការសរសេរសេចក្តីប្រាប់ CPDP
ឯកសារស្តីពី CPDP ដែលទូលំទូលាយ ត្រូវបានធ្វើសេចក្តីប្រាប់នៅជំហានទី ៣ / ៣-៤

ជំហានទី១/១-៥ រៀបចំបញ្ជីឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា
ផ្អែកនេះ រៀបចំដោយផ្អែកលើតារាងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច

ជំហានទី៣/៣-១ ការវិភាគស្ថានភាពរាជធានីខេត្ត
ផ្អែកនេះ រៀបចំដោយផ្អែកលើតារាង២.១ ដល់ តារាង២.១១

ជំហានទី៣/៣-២ ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានីខេត្ត
ផ្អែកនេះរៀបចំ ដោយផ្អែកតាម តារាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

- ▶ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ CPDP អារម្ភកថា
- ▶ សេចក្តីផ្តើម ផែនទីរាជធានី ខេត្ត
- ▶ ជំពូកទី១៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
- ▶ ១.១ សេចក្តីសង្ខេបទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
- ▶ ១.២ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាប្រឈម
 - ▶ ១.២.១ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
 - ▶ ១.២.២ ស្ថានភាពសង្គមកិច្ច
 - ▶ ១.២.៣ ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន
 - ▶ ១.២.៤ ស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
 - ▶ ១.២.៥ ស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
- ▶ ជំពូកទី២៖ ក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានីខេត្ត
- ▶ ២.១ ចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍
 - ▶ ២.២ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍
 - ▶ ២.៣ គោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍
 - ▶ ២.៤ យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍
 - ▶ ២.៤.១ យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច
 - ▶ ២.៤.២ យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សង្គម
 - ▶ ២.៤.៣ យុទ្ធសាស្ត្រប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន
 - ▶ ២.៤.៤ យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
 - ▶ ២.៤.៥ យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
 - ▶ ២.៥ ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម
- ▶ ជំពូកទី៣៖ ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ▶ ឧបសម្ព័ន្ធ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងរៀបចំ សេចក្តីណែនាំលម្អិត នៅពេលប្រកាស។

ជំហានទី៣/៣-៣ ការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍
ដោយសារសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេស មិនបានកំណត់វិធសាស្ត្រ និងទម្រង់បែបបទ ដាក់លាក់ណាមួយ វិធសាស្ត្រ និងទម្រង់បែបបទ ជាបណ្តោះអាសន្នមួយ ត្រូវបានបង្ហាញក្នុង វគ្គបណ្តុះបណ្តាល (ផ្នែកទី ៧ នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត

ថ្ងៃកម្ចី ៥

គោលការណ៍ណែនាំ

ថ្ងៃកគោលនយោបាយ

គ.ជ.អ.ប
NCDD



ផ្នែកទី ៥

គោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ

គម្រោងសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការ
នៅភ្នាក់ងារជំនាញ ខេត្ត (PILAC 2)

គោលបំណង និងមាតិកា

គោលបំណងនៃផ្នែកទី ៥៖

សិក្ខាកាមនឹងយល់ពីទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ដើម្បី
រៀបចំគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ

មាតិកា៖

១. គោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ
នៃ CPDP
២. នីតិវិធីដើម្បីកំណត់សកម្មភាព និងតំបន់អាទិភាព

ជំហានទី១: ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានីខេត្ត

១-២. ការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ
រាជធានី ខេត្ត

គោលបំណង

រៀបចំគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ

សមាសភាព

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត (PWG)
- គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត (BOG)
- ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- គណៈកម្មាធិការពាក់ព័ន្ធនានា

លទ្ធផល

- គោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ និងតារាង ១.៥ តារាង ១.៦ តារាង១.៧ និងតារាង១.៨

គោលបំណងនៃគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ

- គោលបំណងនៃគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ គឺដើម្បីតម្រង់ទិស វិស័យនិងសកម្មភាពជាអាទិភាព និងតំបន់អាទិភាពនានា ក្នុងដំណើរការកសាង CPDP។
- PWG ត្រូវប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ និងព័ត៌មានជាឯកសារយោងសម្រាប់រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ

**អនុសាសន៍ក្នុងការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំផ្នែក
គោលនយោបាយ**

សកម្មភាពសំខាន់ៗ រួមមាន៖

- ១. ពិនិត្យតារាង១.៥ ដល់តារាង១.៨
- ២. ពិនិត្យលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ
បច្ចុប្បន្នកម្ម (NSDP) ២០០៩-២០១៣
- ៣. ពិនិត្យគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហវត្សរ៍កម្ពុជា
(CMDGs) និងតារាងពិន្ទុ CMDG

4

១. ពិនិត្យតារាង១.៥ ដល់តារាង១.៨

វិស័យ និងសកម្មភាព ឬសេវា ដែលមានចំណាត់
អាទិភាពមធ្យម ខ្ពស់ ឬចំនួនស្ថាប័នស្នើគម្រោងច្រើន
ត្រូវបានអ្នកពាក់ព័ន្ធចាត់ទុកថាមានអាទិភាពខ្ពស់។

5

**២. ពិនិត្យលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ
បច្ចុប្បន្នកម្ម (NSDP)**

- ពិនិត្យតារាងសង្ខេប៖ សូចនាករសំខាន់ៗ នៃ NSDP ២០០៦-២០១០ (គោលដៅ)
- ពិនិត្យសូចនាករមធ្យមភាគរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសូចនាករសំខាន់ៗ នៃ NSDP ២០០៦-២០១០ (គោលដៅ)
- សូចនាករមធ្យមភាគរាជធានី ខេត្ត ដែលមានកម្រិតទាបជាង គោលដៅជាតិ អាចចាត់ទុកថាជាតំបន់/វិស័យអាទិភាព។

៦

**៣. ពិនិត្យគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហវត្សរ៍កម្ពុជា
(CMDGs) និងតារាងពិន្ទុ CMDG**

១. ប្រៀបធៀបពិន្ទុ CMDG នៃរាជធានី ខេត្តពាក់ព័ន្ធ ជាមួយនឹងរាជធានី ខេត្តផ្សេងៗទៀត
 ២. តំបន់ដែលមានពិន្ទុទាបអាចចាត់ទុកថាមានអាទិភាព។
- មន្ទីរផែនការទទួលខុសត្រូវលើតារាងពិន្ទុ CMDGs។ ដូចនេះ មន្ទីរផែនការ ត្រូវបានស្នើសុំឲ្យធ្វើតារាងពិន្ទុ CMDG ទៅឲ្យក្រុមការងារកសាងផែនការ។

៧

សូមអរគុណ!

3

ឯកសារទំនាក់ទំនង

១. ព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ / គ្រូបង្វឹក
 * តារាងខាងក្រោម ត្រូវបានរៀបចំដោយផ្អែកលើឯកសារចែកចំនួនផ្នែកទី ៤ រដ្ឋបាលបណ្តា
 / រដ្ឋបាលបណ្តាស្រុកស្រែសម្រែក។

ក្រុម ក	
វិស័យសុខាភិបាល	គុណភាព និងបរិមាណទឹក មិនទទួលបានការពេញចិត្ត។
វិស័យបរិស្ថាន	ប្រជាជនជាច្រើនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេ មានជម្ងឺ។
វិស័យសន្តិសុខ	ប្រជាជនជាច្រើន ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារ ឧក្រិដ្ឋកម្ម។

ក្រុម ខ	
វិស័យសុខាភិបាល	អត្រាមរណៈភាពរបស់មាតា មានកម្រិតខ្ពស់។
វិស័យកសិកម្ម	ចំណូលពីការធ្វើស្រែ ទាប។
វិស័យអប់រំ	កូនសិស្សជាច្រើន ឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី៦។

ក្រុម គ	
វិស័យកសិកម្ម	ការចិញ្ចឹមសត្វស្រែក មិនមានផលចំណេញ។
វិស័យសុខាភិបាល	ទារកជាច្រើន ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។
វិស័យអប់រំ	កូនសិស្សជាច្រើន ឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី៦។

ក្រុម ឃ	
វិស័យកសិកម្ម	ចំណូលពីការធ្វើស្រែ ទាប។
វិស័យកសិកម្ម	ការចិញ្ចឹមសត្វស្រែក មិនមានផលចំណេញ។
វិស័យអប់រំ	កូនសិស្សជាច្រើន ឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី៦។

តារាងសំយោង

ទិសដៅ	បញ្ហាដែលកើតឡើង	កំណត់សម្គាល់
វិស័យសុខាភិបាល	គុណភាព និងបរិមាណទឹក មិនទទួលបានការពេញចិត្ត។	១
	អត្រាមរណៈភាពរបស់មាតា មានកម្រិតខ្ពស់។	១
	ទារកជាច្រើន ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។	១
វិស័យកសិកម្ម	ចំណូលពីការធ្វើស្រែ ទាប។	២
	ការចិញ្ចឹមសត្វស្រែក មិនមានផលចំណេញ។	២
វិស័យបរិស្ថាន	ប្រជាជនជាច្រើនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេ មានជម្ងឺ។	១
វិស័យសន្តិសុខ	ប្រជាជនជាច្រើន ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្ម។	១
វិស័យអប់រំ	កូនសិស្សជាច្រើន ឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី៦។	៣

អាទិភាព ផ្អែកលើតារាងសំយោង

- ១) វិស័យអប់រំ ជាពិសេសបណ្តាឈប់រៀនរបស់កូនសិស្សបឋមសិក្សា ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហា ព្រួយបារម្ភខ្ពស់។ (៣)
 - ២) វិស័យកសិកម្ម ដែលទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមសត្វស្រែក និងការធ្វើស្រែ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហា ព្រួយបារម្ភខ្ពស់។ (២+២=៤)
 - ៣) វិស័យសុខាភិបាល ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភខ្ពស់ផងដែរ។ (១+១+១=៣)
- * អនុសាសន៍៖ បញ្ហាព្រួយបារម្ភចំនួនប្រាំ ត្រូវតែសាងសង់ស្ថានភាពជាតំបន់។

២. ប្រៀបធៀប រវាងគោលដៅថ្នាក់ជាតិ និងមធ្យមនាគរនៃបញ្ហាប្រឈម

* សន្មតថា ព័ត៌មានខាងលើ ត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគីរី ដូចនេះ ការប្រៀបធៀប ត្រូវបានរៀបចំឡើងដូចខាងក្រោម៖

ទិសដៅ	បញ្ហាដែលបានកើតឡើង	គោលដៅ CMDG-2015 *	មធ្យមនាគរ **
វិស័យសុខាភិបាល	គុណភាព និងបរិមាណទឹក មិនទទួលបានការពេញចិត្ត។	50.09% សម្គាល់ ១	82% សម្គាល់ ៦
	អត្រាមរណភាពរបស់មាតា មានកម្រិតខ្ពស់។	250 សម្គាល់ ២ 22% សម្គាល់ ៣	7.138 សម្គាល់ ៧ អត់មាន
វិស័យកសិកម្ម	ចំណូលពីការធ្វើវិស ទាប។	3.0 សម្គាល់ ៤	1.0 សម្គាល់ ៨
	ការចិញ្ចឹមសត្វស្រូវ មិនមានលទ្ធផលពេញ។	100% សម្គាល់ ៥	72% សម្គាល់ ៩
វិស័យអប់រំ	កូនសិស្សជាច្រើន ឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី៦។		

- សម្គាល់ ១ ៖ ច្រើនជាង 50.09% នៃប្រជាជនរស់នៅជនបទ មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់។
- សម្គាល់ ២ ៖ អត្រាមរណភាពនៃស្ត្រីសម្រាលកូនដែលចង់សម្រេចបាន គឺតិចជាង 250 នាក់ ក្នុង 100.000 កំណើត។
- សម្គាល់ ៣ ៖ តិចជាង 22% នៃក្មេងអាយុពី 0-59 ខែ មិនមានការពេញលេញយ៉ាងឆ្លងក្រុង ឬជាមធ្យម។
- សម្គាល់ ៤ ៖ សម្រេចអោយបានច្រើនជាង 3.0 តោន នៅមួយហិកតា។
- សម្គាល់ ៥ ៖ អត្រាបញ្ចប់ថ្នាក់ទី៦ ឈានដល់ 100%។
- សម្គាល់ ៦ ៖ អត្រាកាតយនៈ រួមបញ្ចូលត្រូវសាងសង់ប្រើប្រាស់ខ្សែសង្វាក់ស្រូវច្រើន និងទឹកដាំពុះ សម្រាប់បរិភោគ នៅឆ្នាំ២០០៨។
- សម្គាល់ ៧ ៖ អត្រាមរណភាពមាតាសម្រាល (០-១ខែ) ក្នុង 100.000 កំណើត នៅឆ្នាំ២០០៨។
- សម្គាល់ ៨ ៖ ទិន្នផលស្រូវវិស្សជាមធ្យម នៅឆ្នាំ២០០៨។
- សម្គាល់ ៩ ៖ ភាគរយនៃកុមារអាយុពី ៦-១១ ឆ្នាំ កំពុងរៀន នៅឆ្នាំ២០០៨។

* គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥ (CMDG-2015) ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង ២៧៖ ស្ថានភាពសំខាន់ៗនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្នាំ២០០៦-២០១០ (គោលដៅ) ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច្ចុប្បន្នកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩-២០១៣ ហើយត្រូវបានទាំងនោះ ត្រូវបានចាត់ទុកថាគោលដៅថ្នាក់ជាតិ រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៥។

** ទិន្នន័យទាំងនេះ បានស្រង់មកពីសៀវភៅទិន្នន័យខេត្តមណ្ឌលគីរីឆ្នាំ២០០៩ ដែលរៀបចំដោយ គ.ជ.អ.ប។

អាទិភាពផ្អែកលើការប្រៀបធៀប

- ១) ស្ថានភាពដែលទាក់ទងនឹង -ចំណូលពីការធ្វើវិស- មានកម្រិតទាបជាងគោលដៅថ្នាក់ជាតិ។ ដូច្នេះបញ្ហាទិន្នផលស្រូវ ត្រូវចាត់ទុកថាជាអាទិភាព។
- ២) ស្ថានភាពដែលទាក់ទងនឹង -សិស្សជាច្រើនឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី៦- មានកម្រិតទាបជាងគោលដៅថ្នាក់ជាតិ។ បញ្ហានេះ ត្រូវចាត់ទុកថាជាអាទិភាព។

ថ្ងៃកទី ៦

ប្រតិទិនការងារសម្រាប់ចំណេញការ

កសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍

គ.ជ.អ.ប
NCDD



ផ្នែកទី ៦

ប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការ កសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍

គម្រោងសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការ
នៅភ្នាក់ងារជំនាញ ខេត្ត (PILAC 2)

គោលបំណង និងមាតិកា

គោលបំណងនៃផ្នែកទី ៦៖

សិក្ខាកាមនឹងយល់ពីប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរ
ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍។

- មាតិកា៖**
- ១- ប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការកសាង
ផែនការអភិវឌ្ឍន៍
 - ២- អនុសាសន៍ពីដំណើរការកសាងផែនការ

ជំហានទី១: ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

**១-៣ ការរៀបចំប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
គោលបំណង**

**រៀបចំប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
សមាសភាព**

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត (PWG)
- គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត (BOG)
- ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

លទ្ធផល

- ប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍



ជំហានទី១: ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

**១-៣. ការរៀបចំប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការកសាងផែនការ
អភិវឌ្ឍន៍ (បន្ត)**

ល.រ	សកម្មភាព	ពេលវេលា	ទីកន្លែង	អ្នកទទួលខុសត្រូវ	ថវិកា	ផ្សេងៗ
-----	----------	---------	----------	------------------	-------	--------

ប្រតិទិនការងារកសាងផែនការខាងលើនេះ ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សារាជធានី
ខេត្ត _____ អនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំ _____ លើកទី _____ នាថ្ងៃទី _____
ខែ _____ ឆ្នាំ _____ ។

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

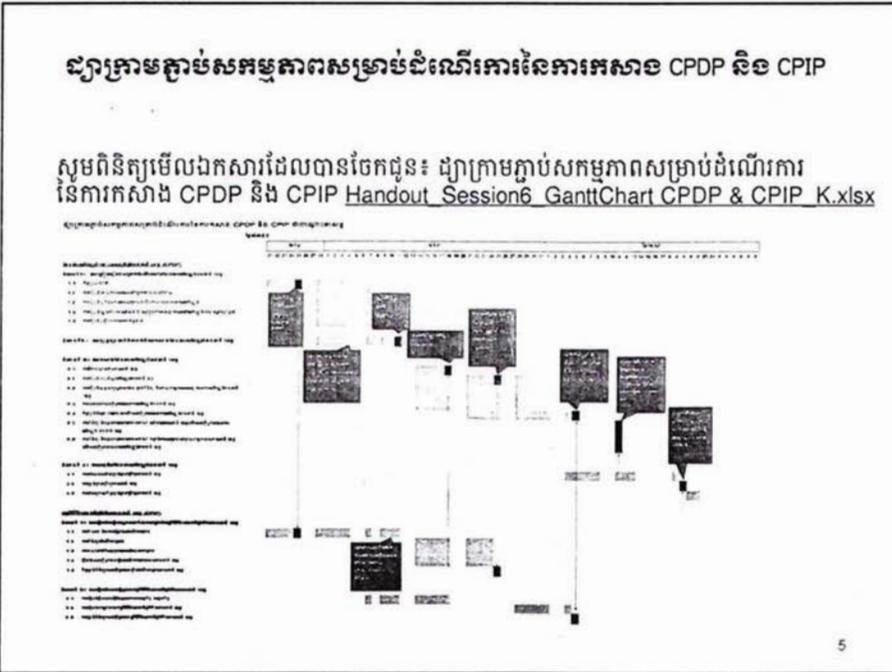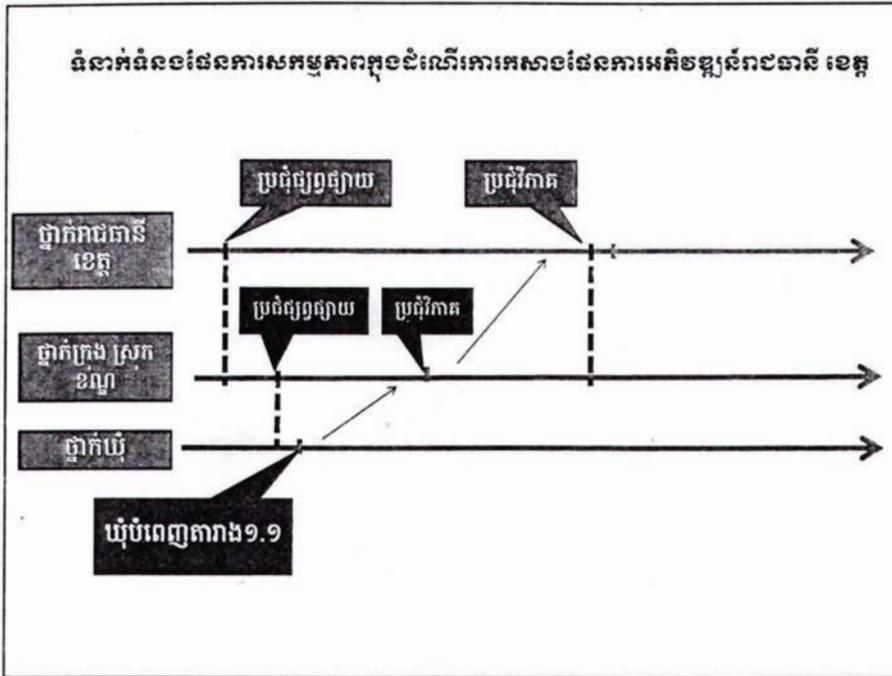

អនុសាសន៍ស្តីពីដំណើរការ

- នីតិវិធីខាងក្រោមនេះ គឺជាអនុសាសន៍សម្រាប់ការរៀបចំប្រតិទិនការងារកសាងផែនការ
- ១. រៀបចំទម្រង់គំរូកសាងចែកជូនដូចគ្នា៖ ដ្យាក្រាមភ្ជាប់សកម្មភាពសម្រាប់ដំណើរការនៃការកសាង CPDP និង CPIP
- ២. ពិនិត្យសកម្មភាព (ជួរឈរខាងឆ្វេង) និងសកម្មភាពបន្ថែមផ្សេងៗទៀត ប្រសិនបើចាំបាច់។
- ៣. កំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចប្រជុំផ្លូវការដែលបង្ហាញពីដ្យាក្រាមភ្ជាប់សកម្មភាពសម្រាប់ដំណើរការនៃការកសាង CPDP និង CPIP (ឧទា៖ ១-១ កិច្ចប្រជុំណែនាំ ២-៤ ការរៀបចំសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្ម)
- ៤. គូបន្ទាត់សម្រាប់ថ្ងៃសំខាន់ៗនៅក្នុងសកម្មភាពនីមួយៗ
- ៥. បង្វែរព័ត៌មានទៅក្នុងតារាងនៃការរៀបចំប្រតិទិនការងារកសាងផែនការ

6

សូមអរគុណ!

7

Վերաբերյալ արտադրանքի մասնադրույթի համակարգի ԿՐՁԲ

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ԿՐՁԲ										ԿՐՁԲ																													

Նախնական արտադրանքի ԿՐՁԲ

- 2.1 ԿՐՁԲ, որը վերաբերում է նախնական արտադրանքի ԿՐՁԲ
- 2.2 ԿՐՁԲ
- 2.3 ԿՐՁԲ
- 2.4 ԿՐՁԲ
- 2.5 ԿՐՁԲ

Նախնական արտադրանքի ԿՐՁԲ

- 2.6 ԿՐՁԲ
- 2.7 ԿՐՁԲ
- 2.8 ԿՐՁԲ
- 2.9 ԿՐՁԲ
- 2.10 ԿՐՁԲ
- 2.11 ԿՐՁԲ
- 2.12 ԿՐՁԲ
- 2.13 ԿՐՁԲ
- 2.14 ԿՐՁԲ
- 2.15 ԿՐՁԲ
- 2.16 ԿՐՁԲ
- 2.17 ԿՐՁԲ
- 2.18 ԿՐՁԲ
- 2.19 ԿՐՁԲ
- 2.20 ԿՐՁԲ
- 2.21 ԿՐՁԲ
- 2.22 ԿՐՁԲ
- 2.23 ԿՐՁԲ
- 2.24 ԿՐՁԲ
- 2.25 ԿՐՁԲ
- 2.26 ԿՐՁԲ
- 2.27 ԿՐՁԲ
- 2.28 ԿՐՁԲ
- 2.29 ԿՐՁԲ
- 2.30 ԿՐՁԲ

Նախնական արտադրանքի ԿՐՁԲ

- 2.31 ԿՐՁԲ
- 2.32 ԿՐՁԲ
- 2.33 ԿՐՁԲ
- 2.34 ԿՐՁԲ
- 2.35 ԿՐՁԲ
- 2.36 ԿՐՁԲ
- 2.37 ԿՐՁԲ
- 2.38 ԿՐՁԲ
- 2.39 ԿՐՁԲ
- 2.40 ԿՐՁԲ
- 2.41 ԿՐՁԲ
- 2.42 ԿՐՁԲ
- 2.43 ԿՐՁԲ
- 2.44 ԿՐՁԲ
- 2.45 ԿՐՁԲ
- 2.46 ԿՐՁԲ
- 2.47 ԿՐՁԲ
- 2.48 ԿՐՁԲ
- 2.49 ԿՐՁԲ
- 2.50 ԿՐՁԲ

Նախնական արտադրանքի ԿՐՁԲ

- 2.51 ԿՐՁԲ
- 2.52 ԿՐՁԲ
- 2.53 ԿՐՁԲ
- 2.54 ԿՐՁԲ
- 2.55 ԿՐՁԲ
- 2.56 ԿՐՁԲ
- 2.57 ԿՐՁԲ
- 2.58 ԿՐՁԲ
- 2.59 ԿՐՁԲ
- 2.60 ԿՐՁԲ
- 2.61 ԿՐՁԲ
- 2.62 ԿՐՁԲ
- 2.63 ԿՐՁԲ
- 2.64 ԿՐՁԲ
- 2.65 ԿՐՁԲ
- 2.66 ԿՐՁԲ
- 2.67 ԿՐՁԲ
- 2.68 ԿՐՁԲ
- 2.69 ԿՐՁԲ
- 2.70 ԿՐՁԲ

Նախնական արտադրանքի ԿՐՁԲ


- 2.71 ԿՐՁԲ
- 2.72 ԿՐՁԲ
- 2.73 ԿՐՁԲ
- 2.74 ԿՐՁԲ
- 2.75 ԿՐՁԲ
- 2.76 ԿՐՁԲ
- 2.77 ԿՐՁԲ
- 2.78 ԿՐՁԲ
- 2.79 ԿՐՁԲ
- 2.80 ԿՐՁԲ
- 2.81 ԿՐՁԲ
- 2.82 ԿՐՁԲ
- 2.83 ԿՐՁԲ
- 2.84 ԿՐՁԲ
- 2.85 ԿՐՁԲ
- 2.86 ԿՐՁԲ
- 2.87 ԿՐՁԲ
- 2.88 ԿՐՁԲ
- 2.89 ԿՐՁԲ
- 2.90 ԿՐՁԲ

Նախնական արտադրանքի ԿՐՁԲ

- 2.91 ԿՐՁԲ
- 2.92 ԿՐՁԲ
- 2.93 ԿՐՁԲ
- 2.94 ԿՐՁԲ
- 2.95 ԿՐՁԲ
- 2.96 ԿՐՁԲ
- 2.97 ԿՐՁԲ
- 2.98 ԿՐՁԲ
- 2.99 ԿՐՁԲ
- 2.100 ԿՐՁԲ

Նախնական արտադրանքի ԿՐՁԲ

- 2.101 ԿՐՁԲ
- 2.102 ԿՐՁԲ
- 2.103 ԿՐՁԲ
- 2.104 ԿՐՁԲ
- 2.105 ԿՐՁԲ
- 2.106 ԿՐՁԲ
- 2.107 ԿՐՁԲ
- 2.108 ԿՐՁԲ
- 2.109 ԿՐՁԲ
- 2.110 ԿՐՁԲ

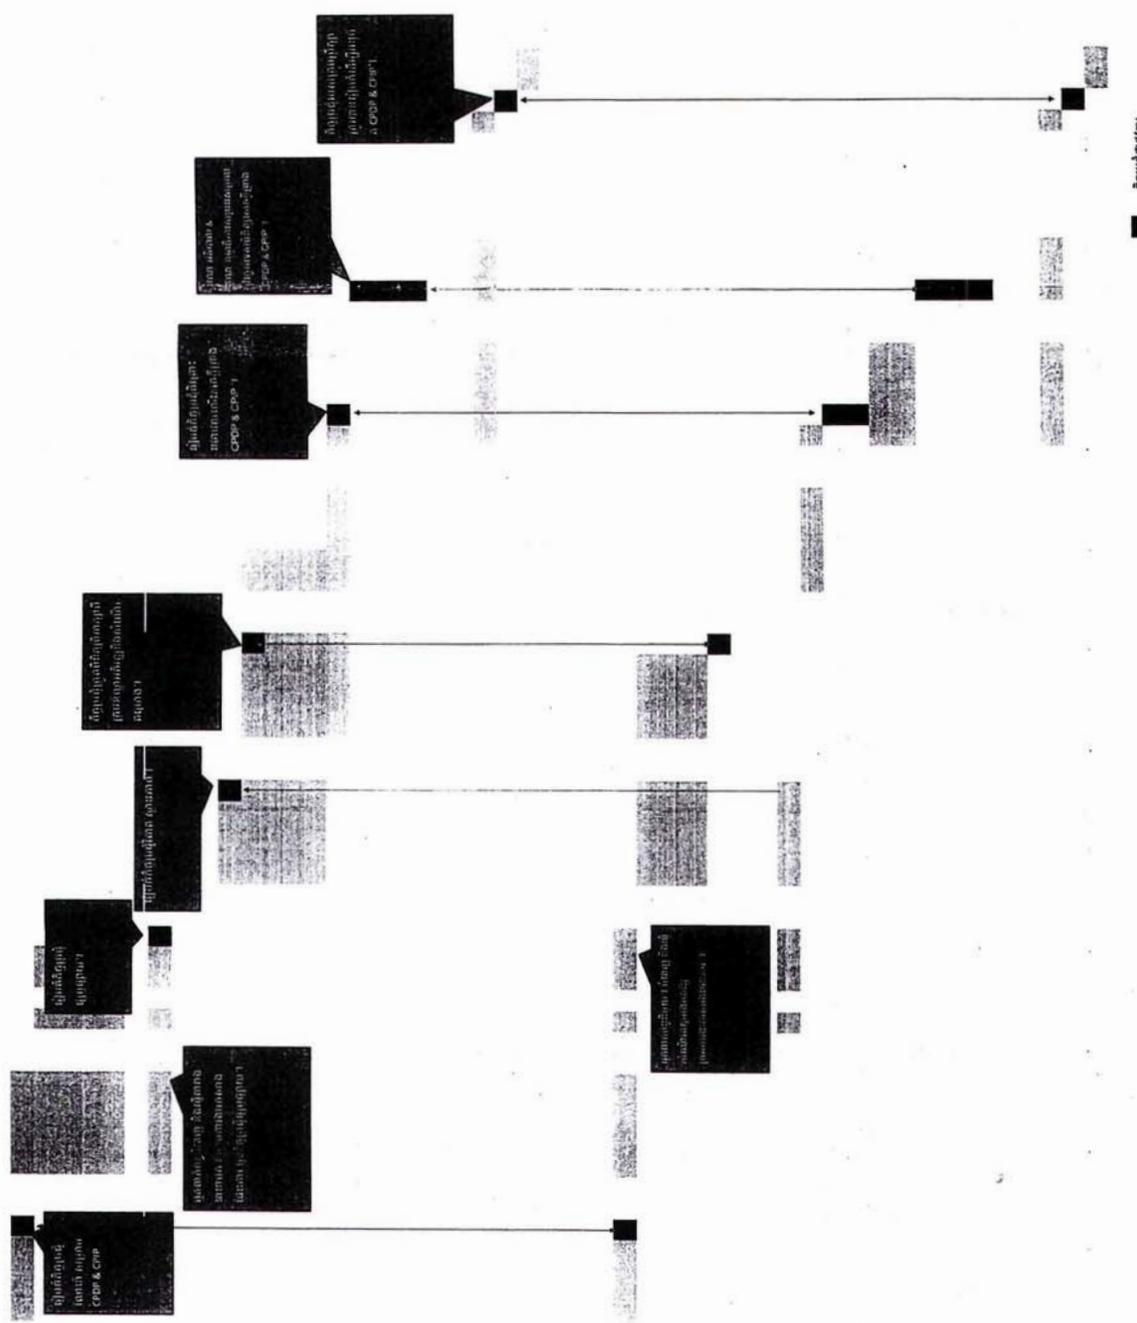

Համակարգի արտադրանքի մասնադրույթի համակարգի ԿՐՁԲ

ថ្ងៃកទី ៧

ចំណេញ ការ កសាង ផែន ការ អភិវឌ្ឍន៍

របៀប ពេល ប្រាំ ឆ្នាំ ជំហាន ទី ២

ជំហាន ទី ៣ និង ជំហាន ទី ៤

ជ.ជ.អ.ប
NCDD



ផ្នែកទី ៧

**ដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ
ជំហានទី ២ ជំហានទី ៣ និងជំហានទី ៤**

គម្រោងសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការ
នៅថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត (PILAC 2)



គោលបំណង និងមាតិកា

គោលបំណងនៃផ្នែកទី ៧៖

សិក្ខាកាមនឹងយល់ពីដំណើរការកសាងផែនការ
អភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ (CPDP)
ជំហានទី ២ ជំហានទី ៣ និងជំហានទី ៤

មាតិកា៖

- ១. ដំណើរការកសាង CPDP
ជំហានទី ២ ជំហានទី ៣ និងជំហានទី ៤
- ២. លទ្ធផលនៃដំណើរការកសាងនីមួយៗ

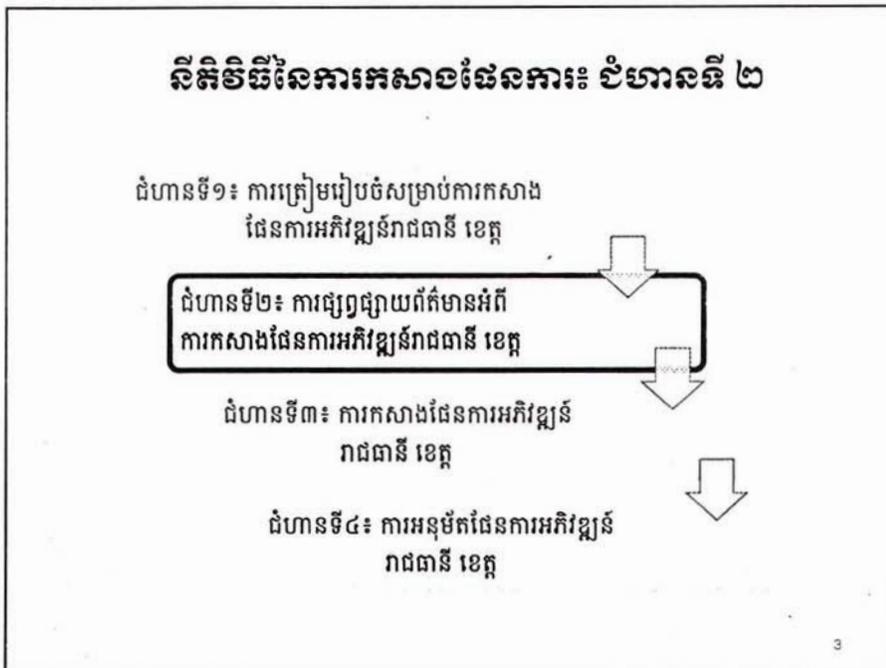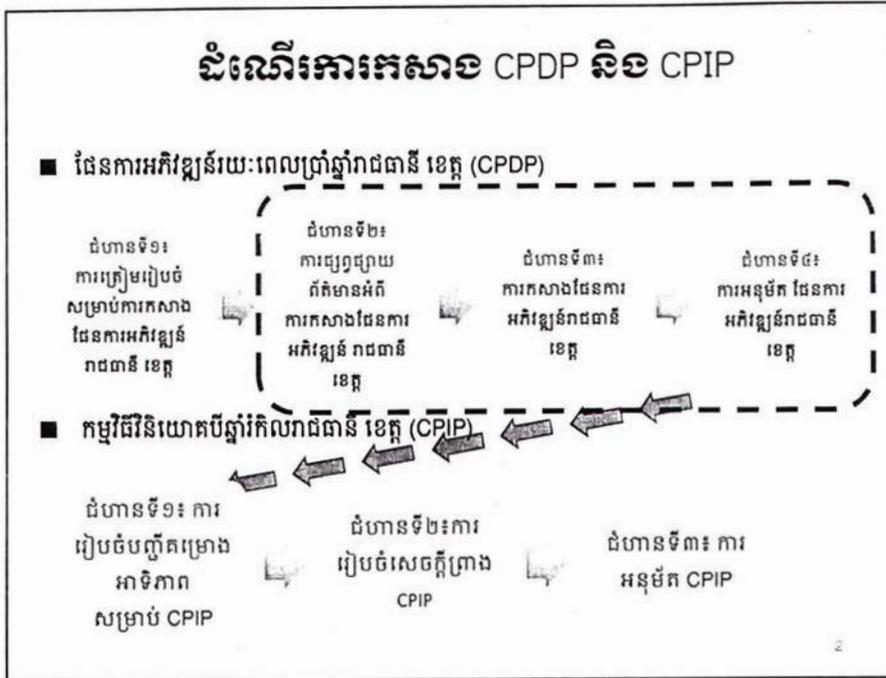

**ជំហានទី២: ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការកសាង
ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត**

គោលបំណង

ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពី៖

- គោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ
- តម្រូវការ និងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត
- ប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការកសាងផែនការ
- ឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា

4

**ជំហានទី២: ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការកសាង
ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត**

លទ្ធផលរំពឹងទុក

- អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ
- បញ្ជីបូកសរុបបញ្ហា និងតម្រូវការ (តារាង ១.៥ ដល់ ១.៨)
- អ្នកពាក់ព័ន្ធយល់ដឹងពីដំណើរការ និងនីតិវិធីក្នុងការកសាងផែនការ
- អ្នកពាក់ព័ន្ធយល់ដឹងពីតម្រូវការឯកសារនានាដែលចាំបាច់
- ប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍

5

**ជំហានទី២៖ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការកសាង
ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត**

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍

- ប្រធានអង្គប្រជុំ៖ អភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- សមាសភាព៖ តំណាងក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាល
ក្រុមការងារកសាងផែនការ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត
(សូមមើល សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ទំព័រ ២៧)
- របៀបវារៈ ៖ (សូមមើល សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសផែនការអភិវឌ្ឍន៍
ទំព័រ ២៨)
- ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវចាត់ចែងកិច្ចការចាំបាច់
នានាសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះ

6

នីតិវិធីនៃការកសាងផែនការ៖ ជំហានទី ៣

ជំហានទី១៖ ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការកសាង
ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត



ជំហានទី២៖ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពី
ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

**ជំហានទី៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
រាជធានី ខេត្ត**



ជំហានទី៤៖ ការអនុម័តផែនការអភិវឌ្ឍន៍
រាជធានី ខេត្ត



7

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

គោលបំណង

ដើម្បីរៀបចំ និងចងក្រងសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត សម្រាប់ដាក់ជូនគណៈអភិបាលពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ មុននឹងដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យ និងអនុម័ត។

លទ្ធផលរំពឹងទុក

សេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្តរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

ដំណើរការ

- ៣-១. ការវិភាគស្ថានភាពរាជធានី ខេត្ត
- ↓
- ៣-២. ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត
- ↓
- ៣-៣. ការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
- ↓
- ៣-៤. ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ↓
- ៣-៥. កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ↓
- ៣-៦. ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់ BOG លើសេចក្តីព្រាង
- ↓
- ៣-៧. ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់ TFC លើសេចក្តីព្រាង

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-១. ការវិភាគស្ថានភាពរាជធានី ខេត្ត

គោលបំណង

ដើម្បីពិភាក្សា និងរកទស្សនៈឯកភាពអំពីបណ្តាបញ្ហា មូលហេតុ និងដំណោះស្រាយនានាក្នុងអាណត្តិរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា

លទ្ធផលរំពឹងទុក

តារាង ២.១ ដល់ ២.១៤

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-១. ការវិភាគស្ថានភាពរាជធានី ខេត្ត (បន្ត)

ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីដំណើរការវិភាគស្ថានភាព

- ប្រធានអង្គប្រជុំ៖ អភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- សមាសភាព៖ មន្ត្រីមន្ទីរជំនាញ មន្ត្រីសាលារាជធានី ខេត្ត និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត
- គោលបំណង៖ ពិភាក្សាបំពេញតារាង ២.១ ដល់ ២.១១
- ឯកសារសំខាន់ៗបម្រើឲ្យការប្រជុំវិភាគ៖ តារាង១.២ ដល់តារាង១.៨ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ

(សូមមើលសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ទំព័រ ៣០)

➢ ក្រុមការងារPWG មន្ទីរផែនការរាជធានី ខេត្ត និងទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ ត្រូវចាត់ចែង ដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលការពិភាក្សាតាមផ្នែកនីមួយៗ

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-១. ការវិភាគស្ថានភាពរាជធានី ខេត្ត (បន្ត)

នៅក្នុងដំណើរការកិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីដំណើរការវិភាគស្ថានភាព៖

- ក្រុមការងារ PWG សំយោគលទ្ធផលទៅក្នុងតារាង ២.១២
- បន្ទាប់មកត្រូវឆ្លង តារាង ២.១២ និងសំយោគទៅជាតារាង ២.១៣ (តារាង ១.៥ + តារាង ២.១២)
(សូមមើលសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ទំព័រ៣៩)
- បន្ទាប់មក ក្រុមការងារ PWG ត្រូវគណនាអាទិភាពមធ្យម ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត រួចកែសម្រួលជាតារាង ២.១៤

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-២. ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

គោលបំណង

ដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

នីតិវិធី

ក្រុមការងារ PWG ត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយ ដើម្បីពិភាក្សារៀបចំ សេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ បន្ទាប់មក ត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សា ពិនិត្យ និងអនុម័ត

(សូមមើល សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ទំព័រ ៤១ និង ឯកសារបទបង្ហាញ ផ្នែកទី៨ ៩ ១០ ១១)

តារាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

- បន្ទាប់ពីការវិភាគស្ថានភាព ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីពិភាក្សា និងរៀបចំចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ គោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍ សុចនាករ និងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍។ ក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវអញ្ជើញតំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត និងគណៈកម្មាធិការពាក់ព័ន្ធនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សា និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដែលមានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ក្នុងការងារនេះ មកចូលរួមផ្តល់យោបល់។
- គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវធ្វើក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានរៀបចំជូនក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ពិនិត្យ និងអនុម័ត ដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់គណៈអភិបាលរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ជាពិសេស ការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលលើកទី ១។

14

តារាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត (បន្ត)

ចក្ខុវិស័យ ៖				
គោលដៅ និងគោលបំណង	សុចនាករ			យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍
	ឯកតា	២០០៩	២០១៤	
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច				
១.១. គោលដៅ ៖				
១.១.១. គោលបំណង ៖				
១.១.២. គោលបំណង ៖				
១.២. គោលដៅ ៖				
១.២.១. គោលបំណង ៖				
១.២.២. គោលបំណង ៖				
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច				
២.១. គោលដៅ ៖				
២.១.១. គោលបំណង ៖				
២.១.២. គោលបំណង ៖				
៣. ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ				
៣.១. គោលដៅ ៖				
៣.១.១. គោលបំណង ៖				
៣.១.២. គោលបំណង ៖				
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ				
៤.១. គោលដៅ ៖				
៤.១.១. គោលបំណង ៖				
៤.១.២. គោលបំណង ៖				

Table Development Framework_K.docx

15

តារាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត (បន្ត)

ពាក្យបច្ចេកទេស	និយមន័យ
ចតុរិស័យ	ស្ថានភាពអនាគតដែលចង់សម្រេចបានរបស់ស្ថាប័នមួយ ឬសហគ្រាសមួយ នូវអ្វីដែលស្ថាប័នទាំងនោះអនុវត្ត។ ឧទា. ការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ជនក្រីក្រ អាចមានប្រយោគចតុរិស័យដែលអានថា "ពិភពលោកមួយដែលគ្មានភាពក្រីក្រ"។
គោលដៅ និងគោលបំណង	ប្រយោគដែលមានពេលវេលាកំណត់ជាក់លាក់ លើលទ្ធផលចង់សម្រេចបាននាពេលអនាគត និងទូទៅនៃលទ្ធផលចង់សម្រេច បាននាពេលអនាគត។ សម្គាល់៖ និយមន័យភាគច្រើនសំដៅទៅលើគោលដៅ ឬគោលបំណង (ជូនកាលអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបាន)។ ក្នុងករណីណែនាំ គោលដៅ និងគោលបំណងត្រូវបានសន្មតថា មានទំនាក់ទំនងបែបឋានានុក្រម (គោលដៅជាលទ្ធផល និង គោលបំណងជាមធ្យោបាយ)។

16

តារាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត (បន្ត)

សូចនាករ	សូចនាករគួរតែបង្ហាញពីកម្រិតនៃសមិទ្ធផលសម្រាប់គោលដៅ និងគោលបំណង។ សូចនាករគួរតែបញ្ចូលនូវព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖ ១) វត្ត (អ្វី?) ២) អ្នកទទួលបាន (ដើម្បីអ្នកណា?) ៣) បរិមាណ (ចំនួនប៉ុន្មាន ?) ៤) គុណភាព (ល្អប៉ុណ្ណា) ៥) កាលបរិច្ឆេទ (ត្រឹមពេលណា?) ៦) ទីកន្លែង (នៅកន្លែងណា?)
យុទ្ធសាស្ត្រ	ការប្តូរសរុបនៃលទ្ធផល(គោលដៅ) ដែលស្ថាប័នកំពុងប្រឹងប្រែង និងមធ្យោបាយ (គោលនយោបាយ) ដែលចង់សម្រេចបាន។

17

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-៣. ការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍

គោលបំណង

ដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការអនុវត្ត CPDP

លទ្ធផល

- សេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-៣. ការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍(បន្ត)

ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវពិភាក្សា និងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្ត ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ដោយផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗ មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

- យន្តការសម្រាប់តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការ
- សូចនាករសំខាន់ៗ សម្រាប់តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការ
- វិធីសាស្ត្រតាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការ
- ពេលវេលាសម្រាប់តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការ
- ប្រព័ន្ធរៀបចំរបាយការណ៍។

ក្របខ័ណ្ឌតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ (១)

- PWG ត្រូវណែនាំ ឲ្យបំពេញតារាងដូចខាងក្រោម ដើម្បីតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ការអនុវត្ត ផែនការ។

ក្របខ័ណ្ឌតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ (២)

គោលដៅ និងគោលបំណង	សុចនាករ						ប្រភព មុននិយម	មន្ទីរ អង្គភាព ទទួលខុសត្រូវ
	ឯកតា	២០០៩	២០១០	២០១១	២០១២	២០១៣		
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច								
គោលដៅ ១								
សុចនាករ ១.១								
សុចនាករ ១.២								
គោលដៅ ២								
សុចនាករ ២.១								
សុចនាករ ២.២								
សុចនាករ ២.៣								
សុចនាករ ២.៤								
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច								
គោលដៅ ៣								
សុចនាករ ៣.១								
សុចនាករ ៣.២								

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-៤. ការសេរសេរសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍

គោលបំណង

រៀបចំសេចក្តីព្រាង CPDP

សមាសភាព

ក្រុមការងារកសាងផែនការ (PWG)

លទ្ធផល

សេចក្តីព្រាង CPDP

ទម្រង់សៀវភៅ CPDP

- សេចក្តីសម្រេចស្តីពីដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ CPDP
- អារម្ភកថា
- សេចក្តីផ្តើម
- ផែនទីរាជធានី ខេត្ត
- ជំពូកទី១៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
- ១.១ សេចក្តីសង្ខេបទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
- ១.២ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាប្រឈម
 - > ១.២.១ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
 - > ១.២.២ ស្ថានភាពសង្គមកិច្ច
 - > ១.២.៣ ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន
 - > ១.២.៤ ស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
 - > ១.២.៥ ស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
- ជំពូកទី២៖ ក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានីខេត្ត
- ២.១ ចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍
 - > ២.២ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍
 - > ២.៣ គោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍
 - > ២.៤ យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍
 - > ២.៤.១ យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច
 - > ២.៤.២ យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សង្គម
 - > ២.៤.៣ យុទ្ធសាស្ត្រប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន
 - > ២.៤.៤ យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
 - > ២.៤.៥ យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
 - > ២.៥ ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម
- ជំពូកទី៣៖ ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ឧបសម្ព័ន្ធ

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-៥. កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងបឋមស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

គោលបំណង

-ដើម្បីបង្ហាញខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃសេចក្តីព្រាងបឋមស្តីពី CPDP

-ដើម្បីប្រមូលមតិយោបល់ និងអនុសាសន៍ ដើម្បីកែលម្អសេចក្តីព្រាងបឋមស្តីពី CPD

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-៥. កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងបឋមស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត (បន្ត)

សមាសភាព

- ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត (BOG)
- ក្រុមការងារកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត (PWG)
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់សង្កាត់ ក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- សមាជិក TFC និងគណៈកម្មាធិការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
- តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- អ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតទៅតាមការចាំបាច់។

លទ្ធផលរំពឹងទុក

- កែលម្អសេចក្តីព្រាងបឋមស្តីពី CPDP

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-៥. កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងបឋមស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍
រាជធានី ខេត្ត (បន្ត)

**ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងបឋមស្តីពីផែនការ
អភិវឌ្ឍន៍**

- ប្រធានអង្គប្រជុំ៖ អភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ដំណើរការ៖
 - បទបង្ហាញអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងបឋម
 - ចែកក្រុមពិភាក្សា
 - បង្ហាញលទ្ធផលពិភាក្សាក្នុងអង្គប្រជុំ
- អ្នករៀបចំ៖ ក្រុមការងារកសាងផែនការ
(សូមមើល សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ទំព័រ ៤២)

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-៦. ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈអភិបាលលើសេចក្តី
ព្រាង CPDP

គោលបំណង
កែសម្រួលសេចក្តីព្រាង CPDP

សមាសភាព

- ក្រុមការងារកសាងផែនការ (PWG)
- គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត

លទ្ធផល
កែសម្រួលសេចក្តីព្រាង CPDP

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-៦. ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈអភិបាលលើសេចក្តីព្រាង CPDP (បន្ត)

នីតិវិធី

- គណៈអភិបាល ត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយ ដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាង CPDP

→ ក្រុមការងារកសាងផែនការ កែសម្រួលសេចក្តីព្រាងCPDP ស្របតាមមតិយោបល់របស់ គណៈអភិបាល

→ គណៈអភិបាល ត្រូវបញ្ជូនសេចក្តីព្រាង CPDP នេះទៅគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស ដើម្បីពិនិត្យ និង ផ្តល់យោបល់

29

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-៧ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ដោយគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស លើសេចក្តីព្រាងCPDP

គោលបំណង

កែសម្រួលសេចក្តីព្រាង CPDP

សមាសភាព

- ក្រុមការងារកសាងផែនការ (PWG)
- គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស (TFC)
- គណៈអភិបាល

លទ្ធផល

កែសម្រួលសេចក្តីព្រាង CPDP

29

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-៧ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ដោយ គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស លើសេចក្តីព្រាង CPDP

នីតិវិធី

-TFC រៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយ ដើម្បី ពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់

→BOG ត្រូវណែនាំឲ្យក្រុមការងារកសាងផែនការ កែសម្រួលបញ្ចប់ តាមមតិយោបល់របស់ TFC

→BOG ដាក់ជូន សេចក្តីព្រាង CPDP នេះទៅក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័ត

នីតិវិធីនៃការកសាងផែនការ៖ ជំហានទី ៤

ជំហានទី១៖ ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត



ជំហានទី២៖ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត



ជំហានទី៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត



ជំហានទី៤៖ ការអនុម័តផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

ជំហានទី ៤ ៖ ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៤-១. ការងារមុនសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត



៤-២. ការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត



៤-៣. ការងារក្រោយកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

32

ជំហានទី ៤ ៖ ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៤-១. ការងារមុនសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

ក្រុមការងារកសាងផែនការ សហការជាមួយទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ និងទីចាត់ការរដ្ឋបាល ត្រូវ៖

- រៀបចំរបៀបវារៈ
- រៀបចំសេចក្តីថ្លែងហេតុ
- រៀបចំឯកសារបទបង្ហាញ
- រៀបចំលិខិតអញ្ជើញ
- កិច្ចការចាំបាច់ផ្សេងៗទៀត តាមការណែនាំរបស់អភិបាលរាជធានី ខេត្ត

33

ជំហានទី ៤ ៖ ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៤-៣. ការងារក្រោយកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត (បន្ត)

▪ ការចេញសេចក្តីសម្រេច

-BOG ត្រូវរៀបចំ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ CPDP ដើម្បីដាក់ជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាចុះហត្ថលេខា

▪ ការបោះពុម្ពសៀវភៅ CPDP

-BOG ត្រូវរៀបចំបោះពុម្ពសៀវភៅ CPDP ដើម្បីបែងចែកផ្សព្វផ្សាយ

១៦

ជំហានទី ៤ ៖ ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៤-៣. ការងារក្រោយកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត (បន្ត)

▪ ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

-ក្រុមប្រឹក្សាត្រូវណែនាំឱ្យ BOG ចាត់ចែងការអនុវត្ត CPDP ដោយមានតម្លាភាព មានគណនេយ្យភាព មានការចូលរួម និងមានប្រសិទ្ធភាព។

-ក្រុមប្រឹក្សា ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

១៧

ជំហានទី ៤ ៖ ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៤-៣. ការងារក្រោយកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត (បន្ត)


- នៅចុងឆ្នាំនីមួយៗ គណៈអភិបាលត្រូវរៀបចំ និងដាក់ជូនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ស្តីពីការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យ និងអនុម័ត។
- ក្រៅពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀត ដើម្បីរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាជាប្រចាំ។
- ក្នុងករណីចាំបាច់ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត អាចធ្វើការកែតម្រូវផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តផែនការនេះ ។

សូមអរគុណ!

ឯកសារយោងសម្រាប់ផ្នែកទី៤៖ ប្រកាសសម្រាប់ការងារ៖ តារាង ១.១ និងតារាង ១.២

ជំហានទី១៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការងារ
 ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ រាជធានី ខេត្ត
 ១-១ កិច្ចប្រជុំណែនាំ


ការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ (ផែនការយោង)

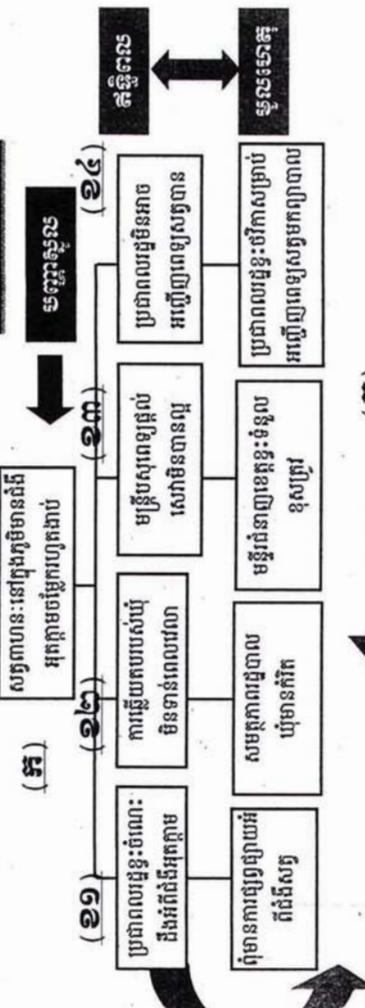

បញ្ហាយោងដែលមើលរំលង៖ តម្រូវការយោង

១) ប្រធានការងារមានខ្លះចំណេះដឹងខ្ពស់ ត្រូវការការងារ ទទួលបានការងារ ទទួលបានការងារ ទទួលបានការងារ

ការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ (ផែនការយោង)

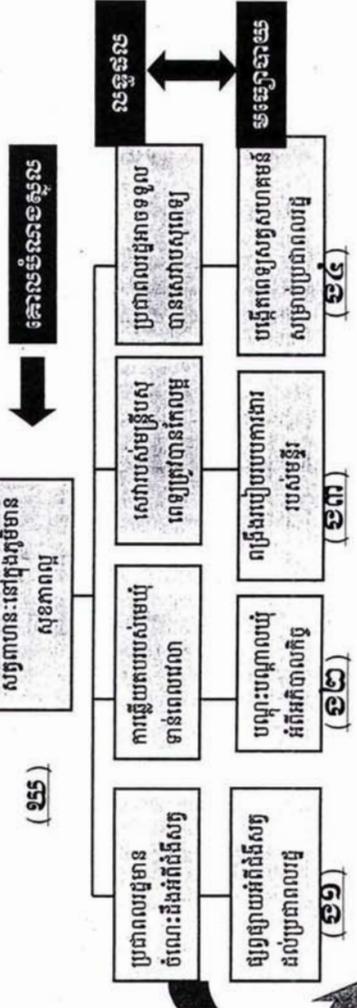

គោលបំណងយោង៖

១) ប្រធានការងារមានខ្លះចំណេះដឹងខ្ពស់ ត្រូវការការងារ ទទួលបានការងារ ទទួលបានការងារ ទទួលបានការងារ

តារាង ១.១ ជំហានការងារ ១.៣

វិស័យ និងសកម្មភាព ប្រសាស	បញ្ហា	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការ យោង	អាទិភាព
--------------------------	-------	---------	------------	---------------	---------

១. ផែនការយោង

វិស័យ	(ក)	(ខ)	(គ)
សុខាភិបាល	សកម្មភាព៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការងារ	សកម្មភាព៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការងារ	សកម្មភាព៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការងារ
សកម្មភាព៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការងារ	សកម្មភាព៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការងារ	សកម្មភាព៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការងារ	សកម្មភាព៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការងារ
(ឃ)	សកម្មភាព៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការងារ	សកម្មភាព៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការងារ	សកម្មភាព៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការងារ
សកម្មភាព៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការងារ	សកម្មភាព៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការងារ	សកម្មភាព៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការងារ	សកម្មភាព៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការងារ

ឯកសារបែកខ្ញែកនៃផ្នែកទី៤៖ មូលដ្ឋានសម្រាប់ការសាងសង់ តារាង ១.១ ទៅ តារាង ១.៧ និង តារាង ១.៨ និង តារាង ១.៧

ជំហានទី១៖ ការរៀបចំសម្រាប់ការសាងសង់
ផែនការការងារវិនិយោគ រាជធានី ខេត្ត
១-២ ការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ
របស់ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត

តារាង ១.១ / ផ្នែក ក

វិស័យ និងសកម្មភាព	បញ្ហា	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការយេនឌ័រ	អាទិភាព
-------------------	-------	---------	------------	-----------------	---------

១. ផ្នែកសង្គមកិច្ច វិស័យកសិកម្ម	សកម្មភាព៖	ចំណេះដឹងអំពីជំងឺ	១.១ ផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺសត្វ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាម រយៈកាលបណ្តុះបណ្តាល	១. ប្រៀបធៀបការ កាសតិចក្នុងការ ទទួលបានមាន អំពីជំងឺសត្វ	ខ្ពស់
	សត្វពាហនៈ	អុកក្រាម។	២.១ បណ្តុះបណ្តាលប្រជាពលរដ្ឋ អំពីរបៀបប្រើប្រាស់	១.១ បណ្តុះបណ្តាលប្រជាពលរដ្ឋ អំពីរបៀបប្រើប្រាស់	ទាប
	នៅក្នុងភូមិ	មេឃុំមិនទាន់ ពេលវេលា។	៣.១ ពង្រឹងរបៀបប្រើប្រាស់ ការងាររបស់មន្ទីរ សុខាភិបាល	២.១ បណ្តុះបណ្តាលប្រជាពលរដ្ឋ អំពីរបៀបប្រើប្រាស់	មធ្យម
	សុខភាពរដ្ឋ	លើកលែងដល់ ដាច់។	៤.១ បណ្តុះបណ្តាលប្រជាពលរដ្ឋ អំពីរបៀបប្រើប្រាស់	៤.១ បណ្តុះបណ្តាលប្រជាពលរដ្ឋ អំពីរបៀបប្រើប្រាស់	ខ្ពស់

តារាង ១.១ / ផ្នែក ខ

វិស័យ និងសកម្មភាព	បញ្ហា	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការយេនឌ័រ	អាទិភាព
-------------------	-------	---------	------------	-----------------	---------

១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច វិស័យកសិកម្ម	សកម្មភាព៖	ចំណេះដឹងអំពីជំងឺ	១.១ ផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺសត្វ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ	១. ប្រៀបធៀបការ កាសតិចក្នុងការ ទទួលបានមាន អំពីជំងឺសត្វ	ខ្ពស់
	សត្វពាហនៈនៅ ក្នុងភូមិ	អុកក្រាម	២.១ បណ្តុះបណ្តាលប្រជាពលរដ្ឋ អំពីរបៀបប្រើប្រាស់	២.១ បណ្តុះបណ្តាលប្រជាពលរដ្ឋ អំពីរបៀបប្រើប្រាស់	ទាប
	នៅក្នុងភូមិ	មេឃុំមិនទាន់ ពេលវេលា	៣.១ ពង្រឹងរបៀបប្រើប្រាស់ ការងាររបស់មន្ទីរ សុខាភិបាល	៤.១ បណ្តុះបណ្តាលប្រជាពលរដ្ឋ អំពីរបៀបប្រើប្រាស់	មធ្យម
	សុខភាពរដ្ឋ	លើកលែងដល់ ដាច់។	៤.១ បណ្តុះបណ្តាលប្រជាពលរដ្ឋ អំពីរបៀបប្រើប្រាស់	៤.១ បណ្តុះបណ្តាលប្រជាពលរដ្ឋ អំពីរបៀបប្រើប្រាស់	មធ្យម



តារាង ១.៥

វិស័យ និងសកម្មភាព	ដំណោះស្រាយ	អាទិភាព គ្រប់ ប្រភេទ			អាទិភាព ជាមធ្យម
		ក	ខ	គ	
វិស័យកសិកម្ម	១. ផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺសត្វដល់ប្រជាពលរដ្ឋ	ខ្ពស់			មធ្យម
សកម្មភាព៖	តាមរយៈវីឌីយ៉ូ				
	២. បណ្តុះបណ្តាលប្រជាពលរដ្ឋអំពីរបៀបប្រើប្រាស់	ទាប	ទាប	ទាប	ទាប
សត្វពាហនៈនៅក្នុងភូមិ	៣. ពង្រឹងរបៀបប្រើប្រាស់ការងាររបស់មន្ទីរសុខាភិបាល	មធ្យម	មធ្យម	មធ្យម	ខ្ពស់
សុខភាពរដ្ឋ	៤. បណ្តុះបណ្តាលប្រជាពលរដ្ឋអំពីរបៀបប្រើប្រាស់	ខ្ពស់	ខ្ពស់	ខ្ពស់	ខ្ពស់
	៥. ផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺសត្វដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល		ខ្ពស់		មធ្យម

កំណត់សម្គាល់៖

១. បំណែងជាពិន្ទុអាទិភាព ដោយ ខ្ពស់=៣ មធ្យម=២ ទាប=១
២. ពិន្ទុអាទិភាពមធ្យមនៃដំណោះស្រាយ = ផលបូកពិន្ទុអាទិភាពសរុប ចំនួនអង្គភាពសរុប
៣. តំរូវប្រព័ន្ធអាទិភាពមធ្យមពីខ្ពស់មកទាប
៤. កំណត់អាទិភាពមធ្យមតាមរយៈ ដូចខាងក្រោម៖
ខ្ពស់=១/៣ មធ្យម=១/៣ ទាប=១/៣ មធ្យម=១/៣ មធ្យម=១/៣ មធ្យម=១/៣


របបកសិកម្ម

ស្រក ខ


ការវិភាគបញ្ហា/ការវិភាគដំណោះស្រាយ ១ ៖ បង្កើនសុខភាពស្រូវ (ស្រែបង្កើនពីផ្លូវកសិកម្ម)

ការវិភាគបញ្ហា/ការវិភាគដំណោះស្រាយ ២ ៖ បញ្ហាគន្លឹះ

ការវិភាគបញ្ហា

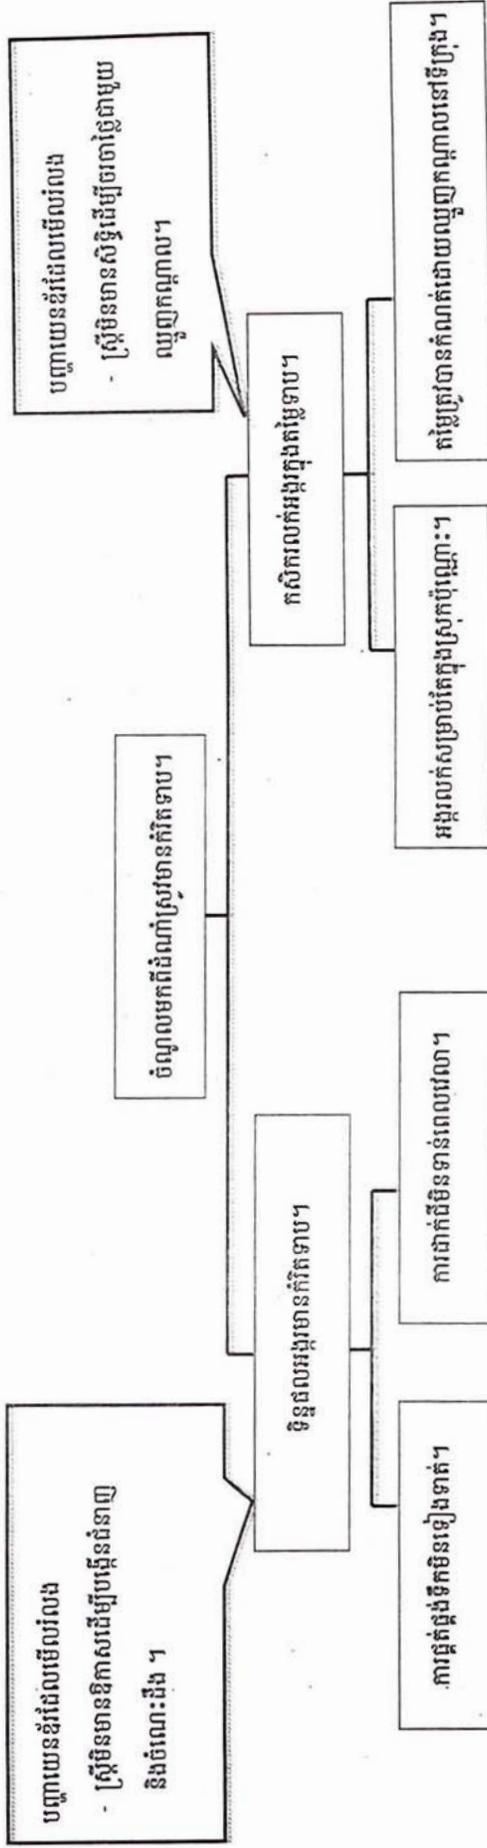


ការវិភាគដំណោះស្រាយ

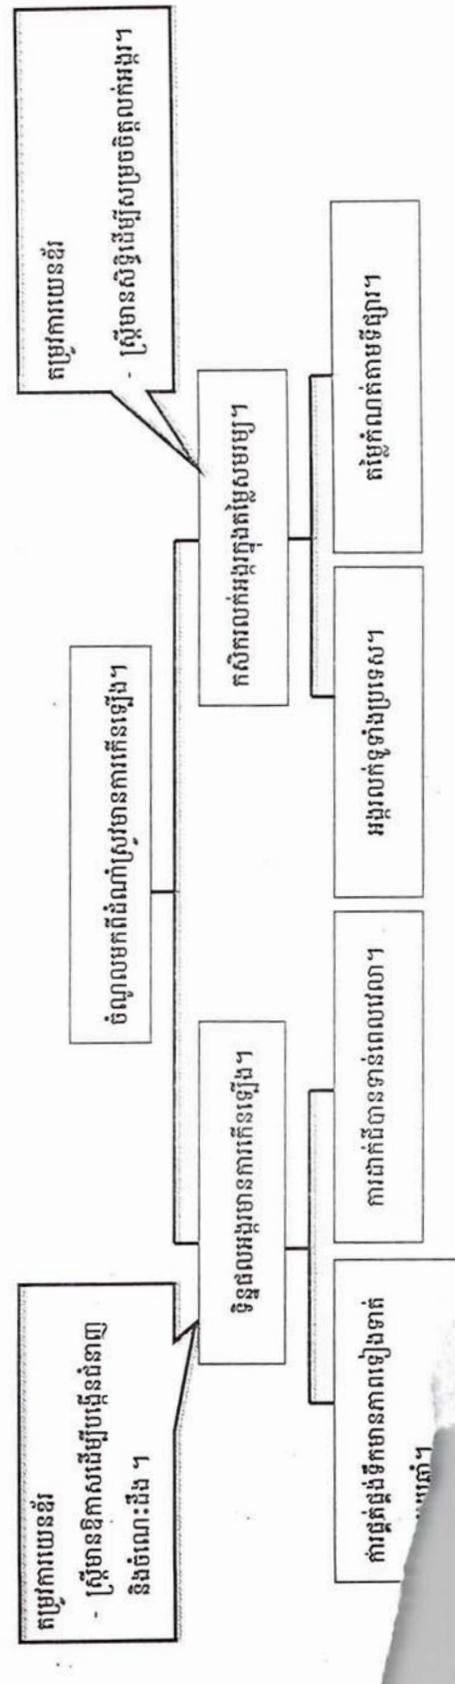


ការវិភាគបញ្ហា/ការវិភាគដំណោះស្រាយ ៣ ៖ បណ្តាញអន្តរ

ការវិភាគបញ្ហា

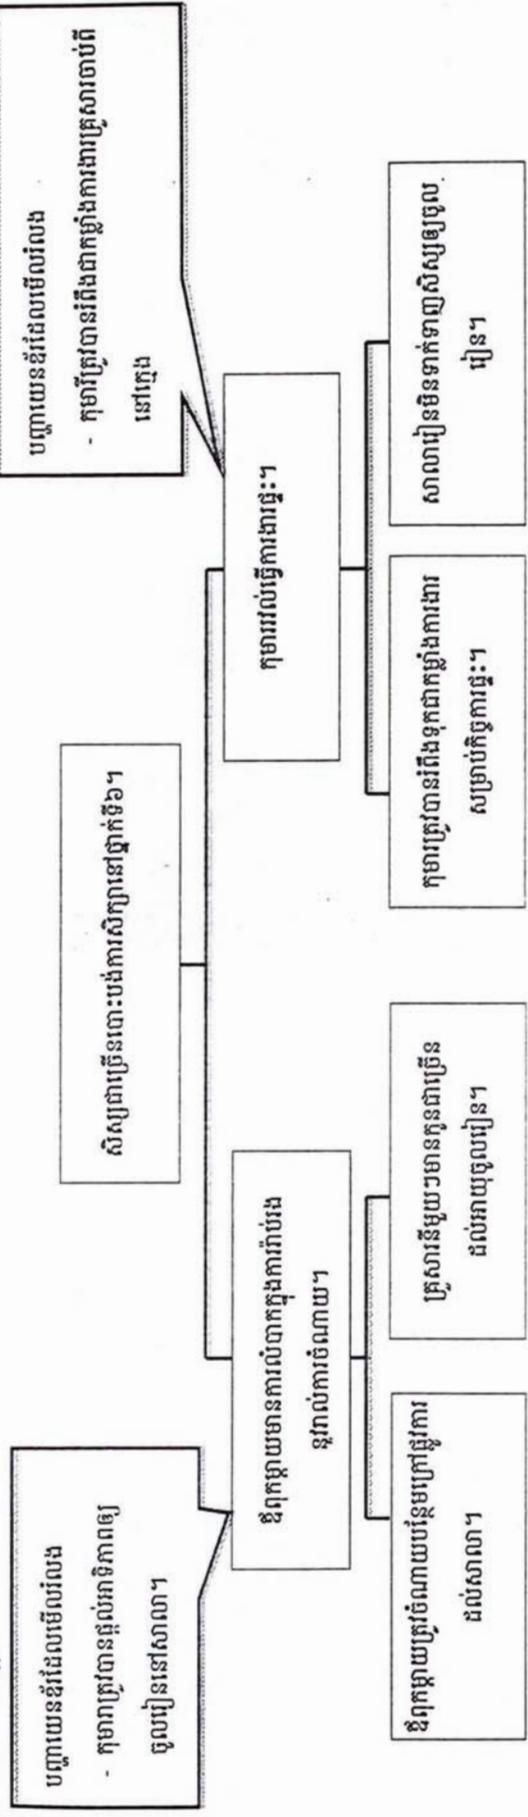

ការវិភាគកង់ណោះស្រាយ

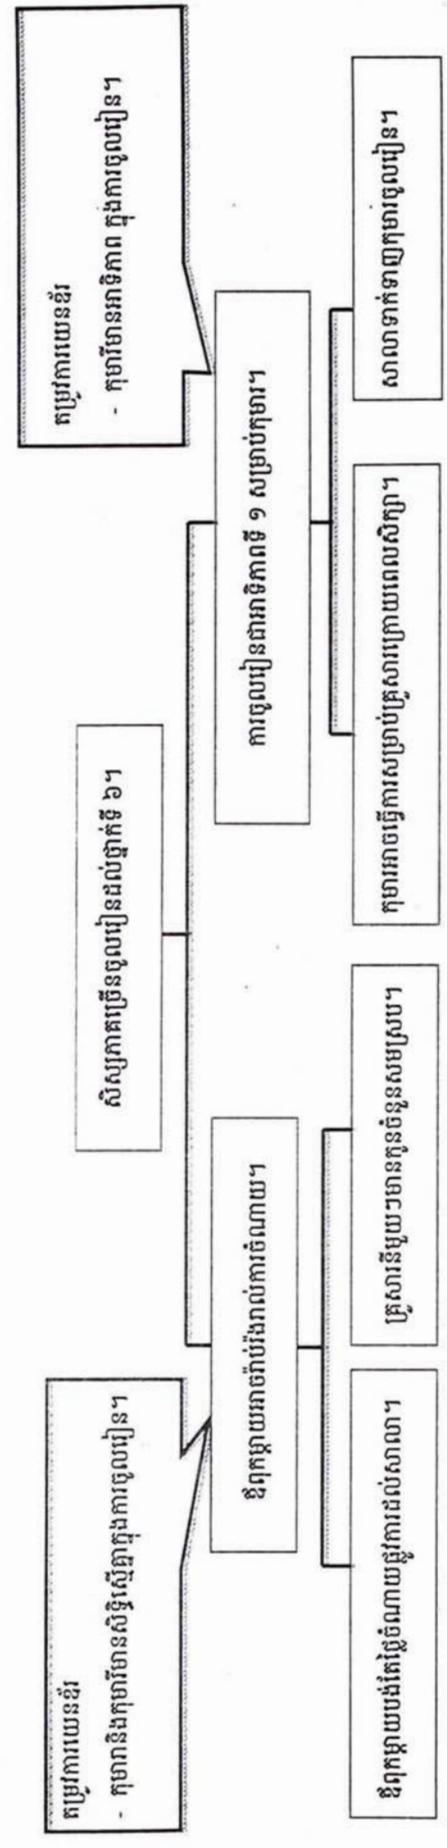


ផ្នែកទី៤- ឯកសារចែកជូន


ប្រសូត គ

ការវិភាគបញ្ហា/ការវិភាគដំណោះស្រាយ ១ ៖ បញ្ហាភស្តុភារ

ការវិភាគបញ្ហា

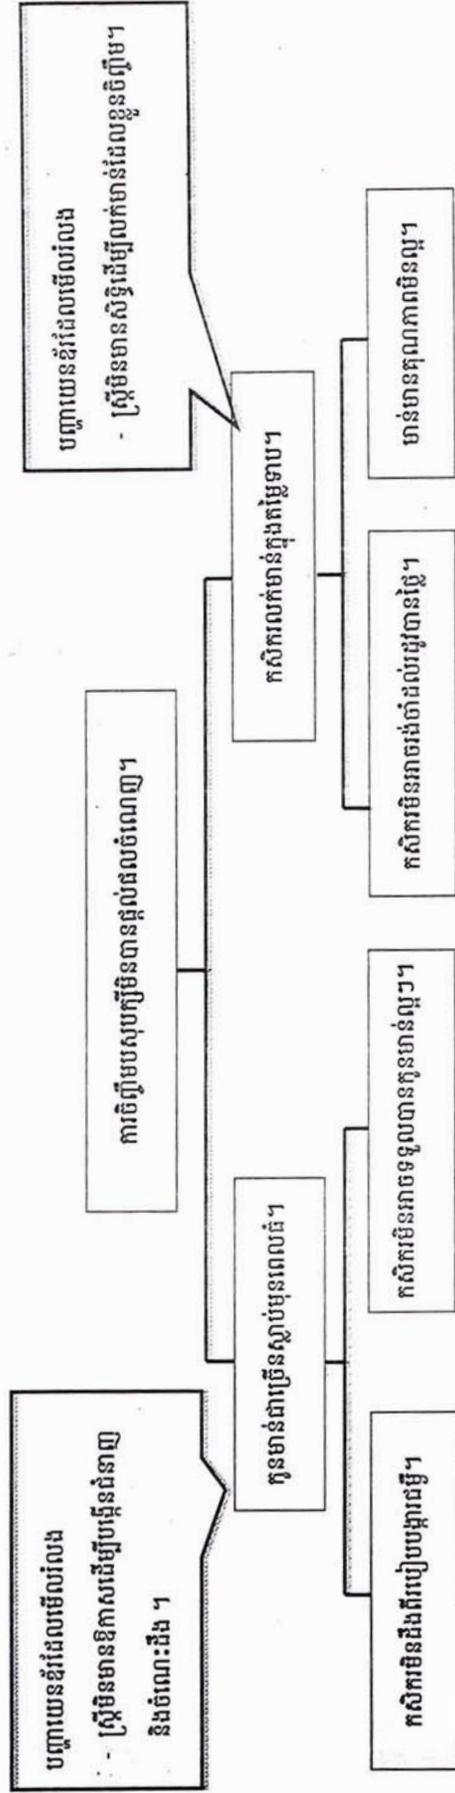


ការវិភាគដំណោះស្រាយ

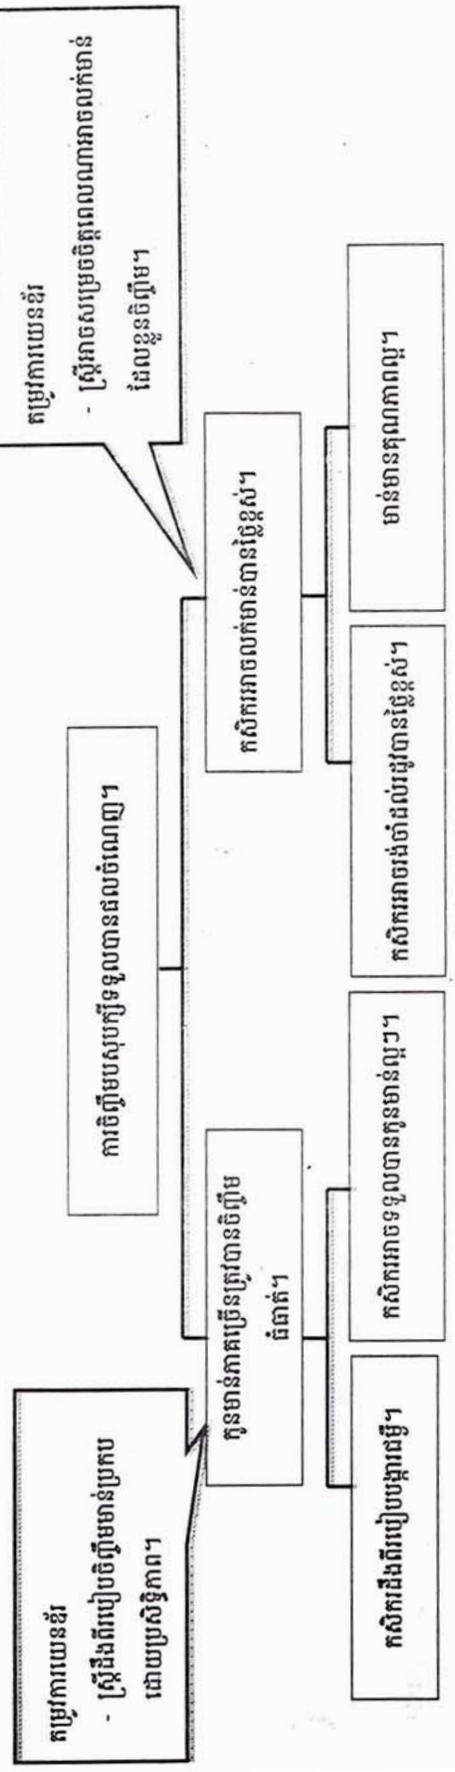


ការវិភាគបញ្ហា/ការវិភាគដំណោះស្រាយ ២ ៖ បញ្ហាសុខភាព

ការវិភាគបញ្ហា

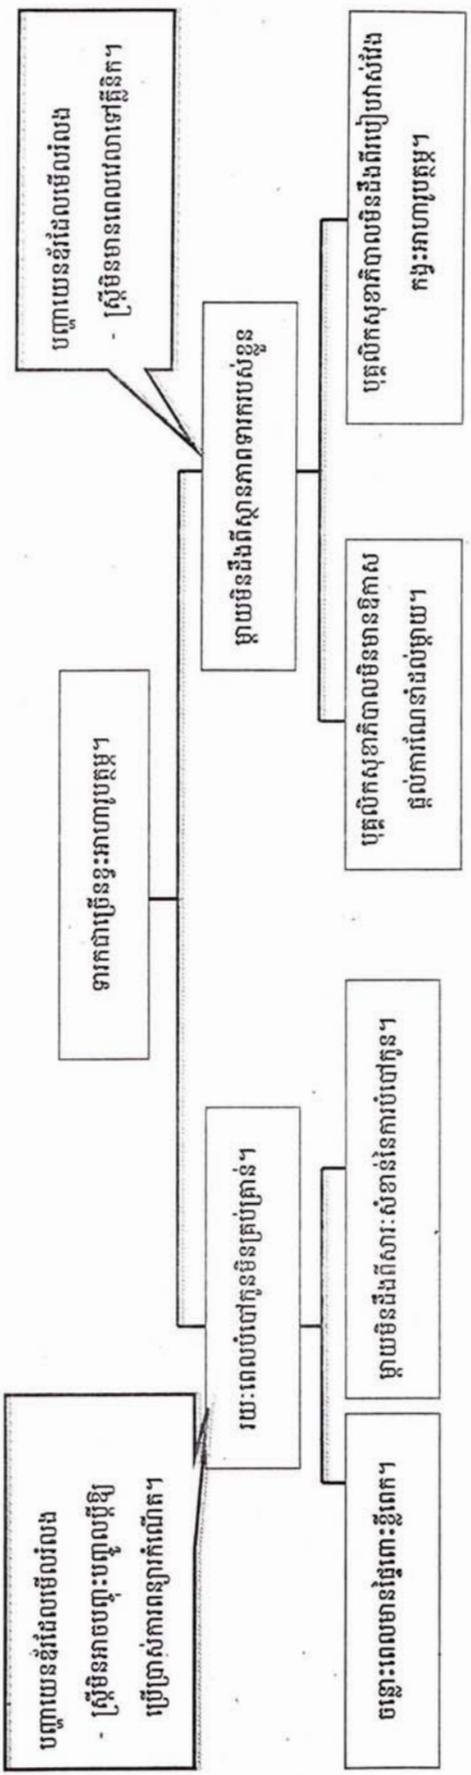


ការវិភាគដំណោះស្រាយ

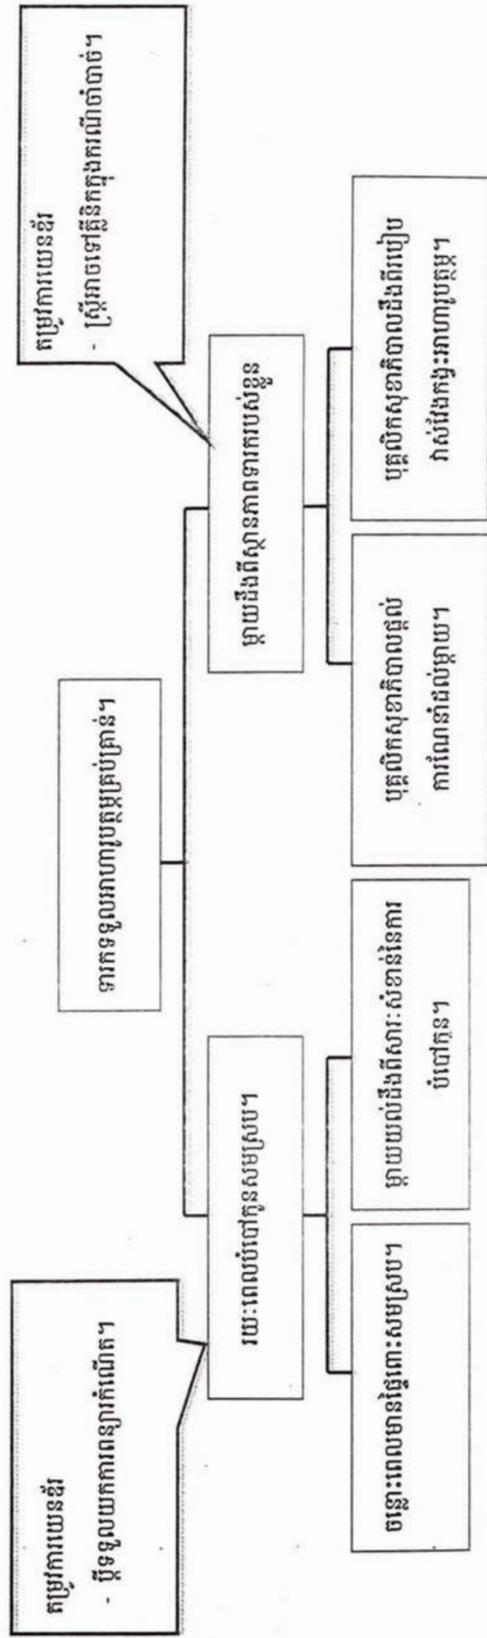


ការវិភាគបញ្ហា/ការវិភាគដំណោះស្រាយ ៣ ៖ ឧទ្ធរណ៍

ការវិភាគបញ្ហា

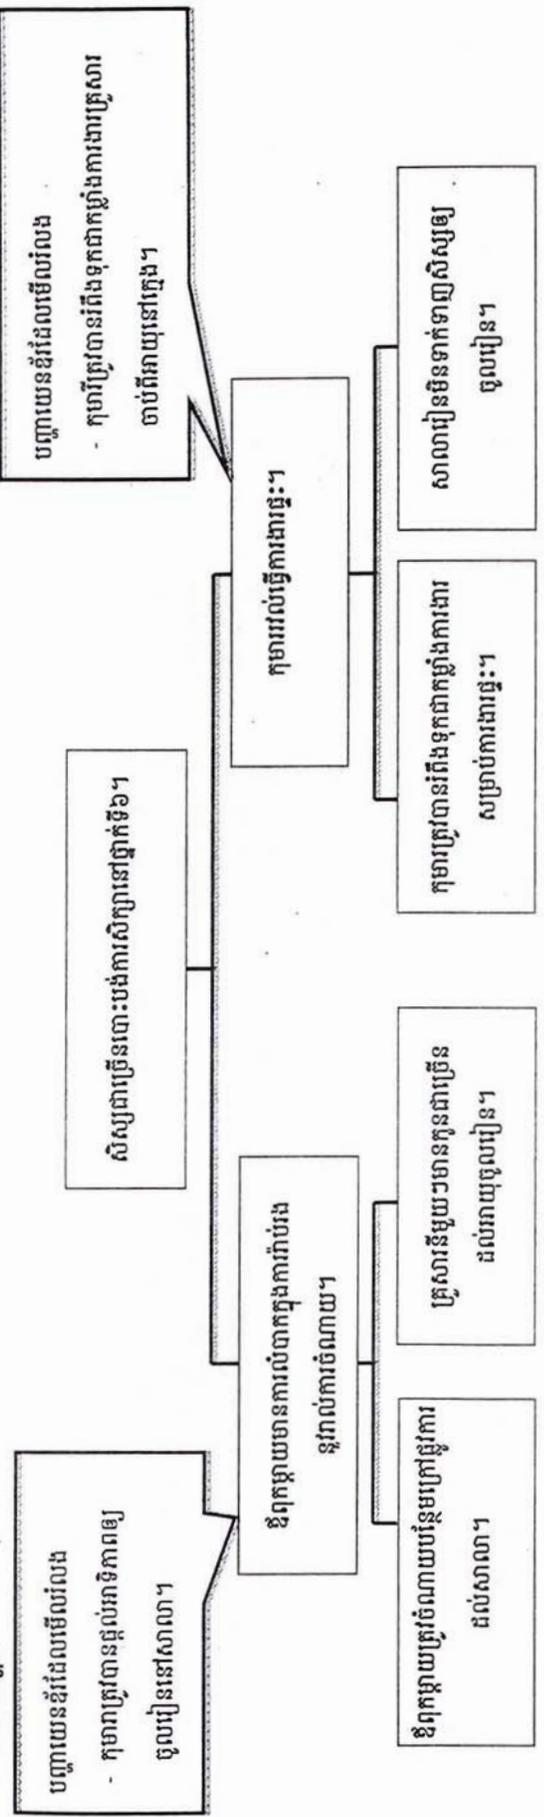

ការវិភាគដំណោះស្រាយ

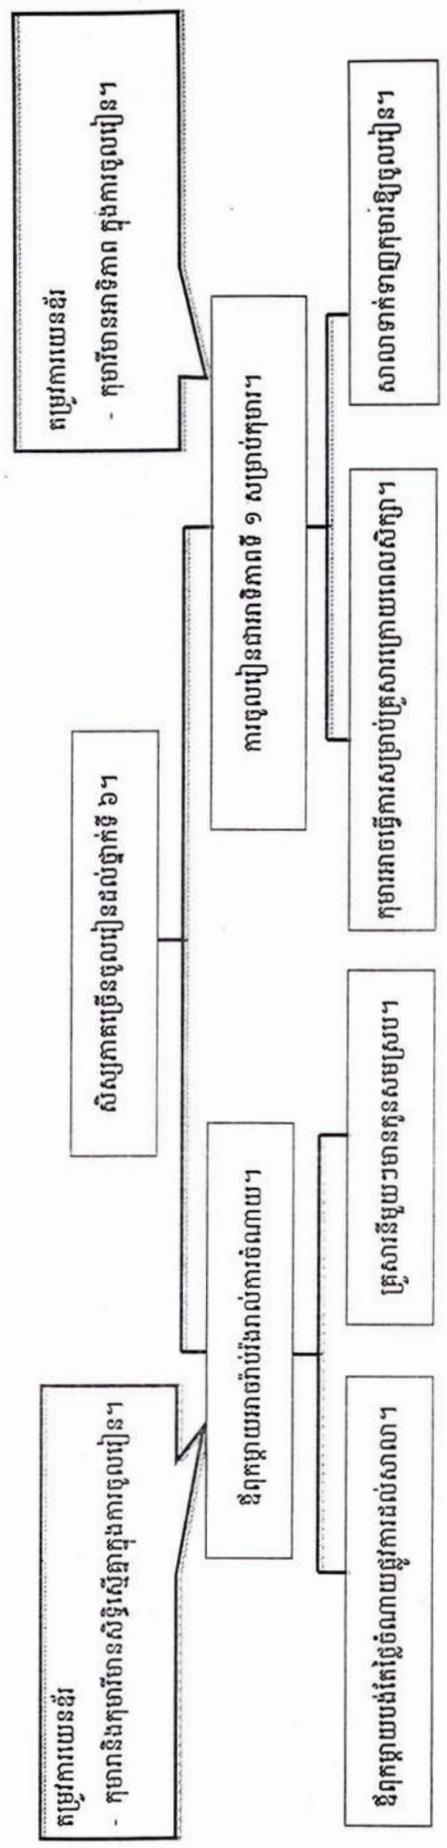

ផ្នែកទី៤- ឯកសារបែកខ្លួន

ប្រឡូក ២៥


ការវិភាគបញ្ហា/ការវិភាគដំណោះស្រាយ ១ ៖ បញ្ហាភាគីភិក្ខុ

ការវិភាគបញ្ហា

បញ្ហាយេនឌ័រដែលមើលរលង
- ស្ត្រីមិនមានឱកាសដើម្បីបង្កើនជំនាញ និងចំណេះដឹង ។

បញ្ហាយេនឌ័រដែលមើលរលង
- ស្ត្រីមិនមានសិទ្ធិដើម្បីចរចាផ្ទៃជាមួយ ល្អិតកណ្តាល។

ចំណូលមកពីដំណាំស្រូវមានកំរិតទាប។

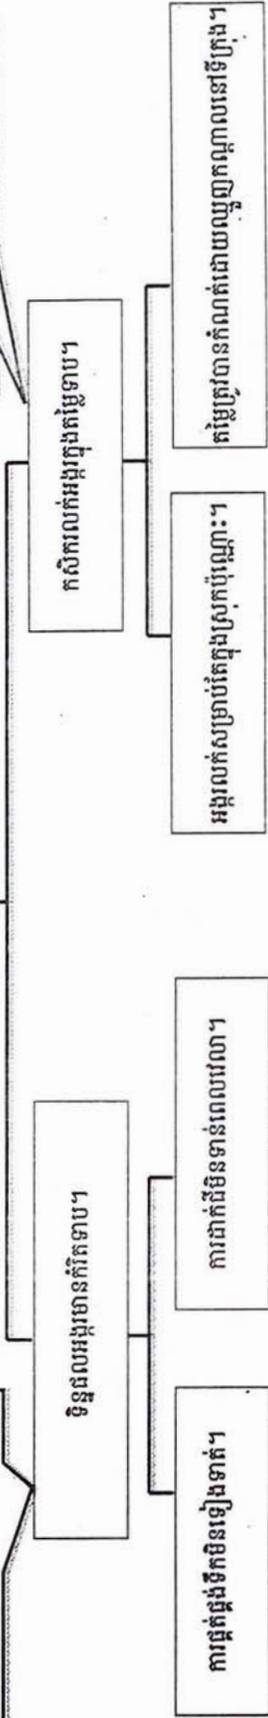


ការវិភាគដំណោះស្រាយ

តម្រូវការយេនឌ័រ
- ស្ត្រីមានឱកាសដើម្បីបង្កើនជំនាញ និងចំណេះដឹង ។


តម្រូវការយេនឌ័រ
- ស្ត្រីមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តលក់អង្ករ។

ចំណូលមកពីដំណាំស្រូវមានការកើនឡើង។

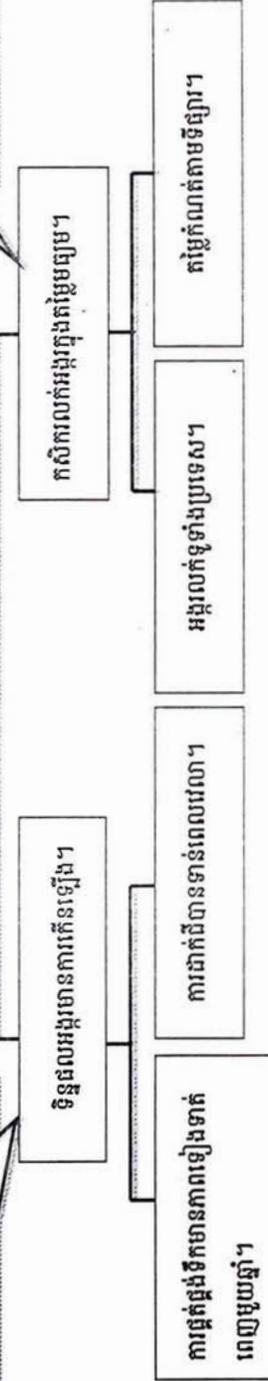


ការវិភាគបញ្ហា/ការវិភាគដំណោះស្រាយ ២ ៖ បញ្ហាគន្លឹះកម្ពុ

ការវិភាគបញ្ហា

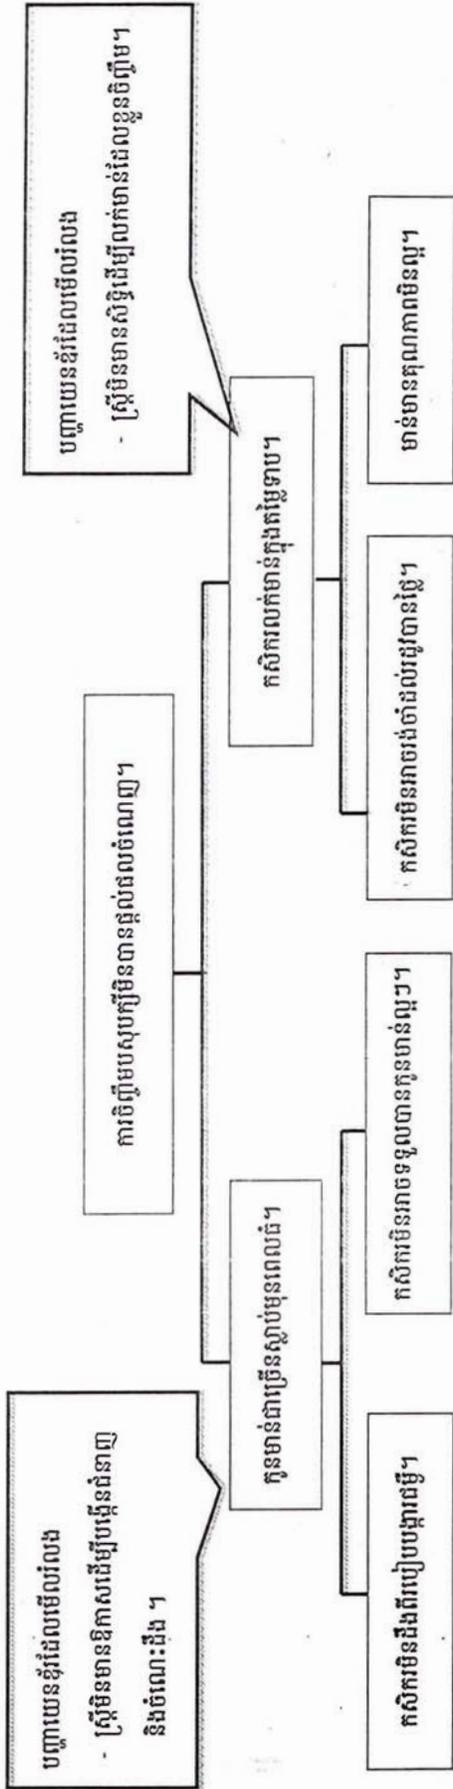


ការវិភាគដំណោះស្រាយ

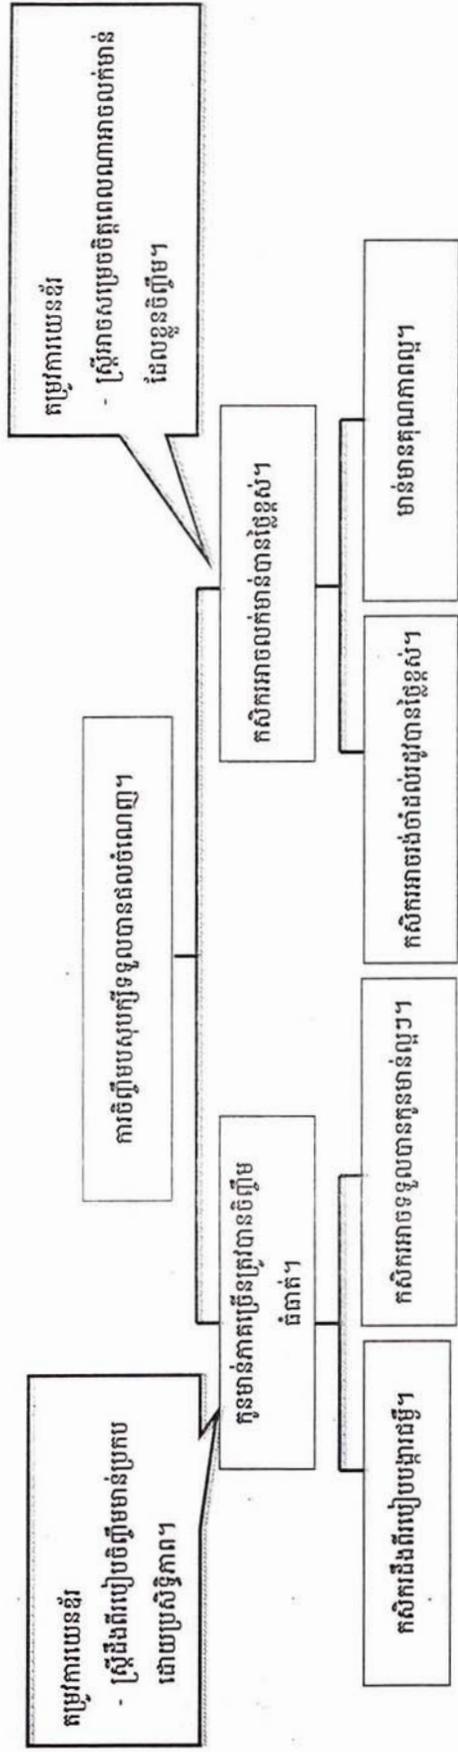


ការវិភាគបញ្ហា/ការវិភាគដំណោះស្រាយ ៣ ៖ ២៥១១១៩៩៦៩

ការវិភាគបញ្ហា

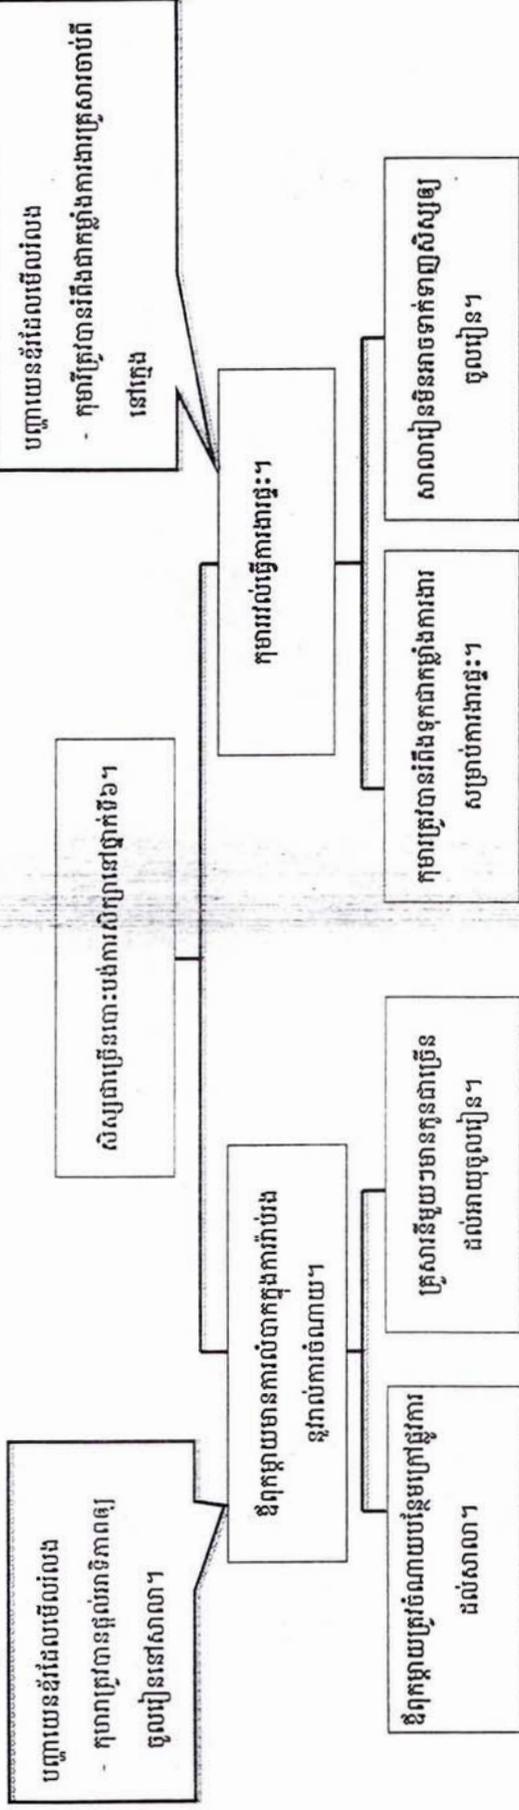

ការវិភាគកង់ណោះស្រាយ

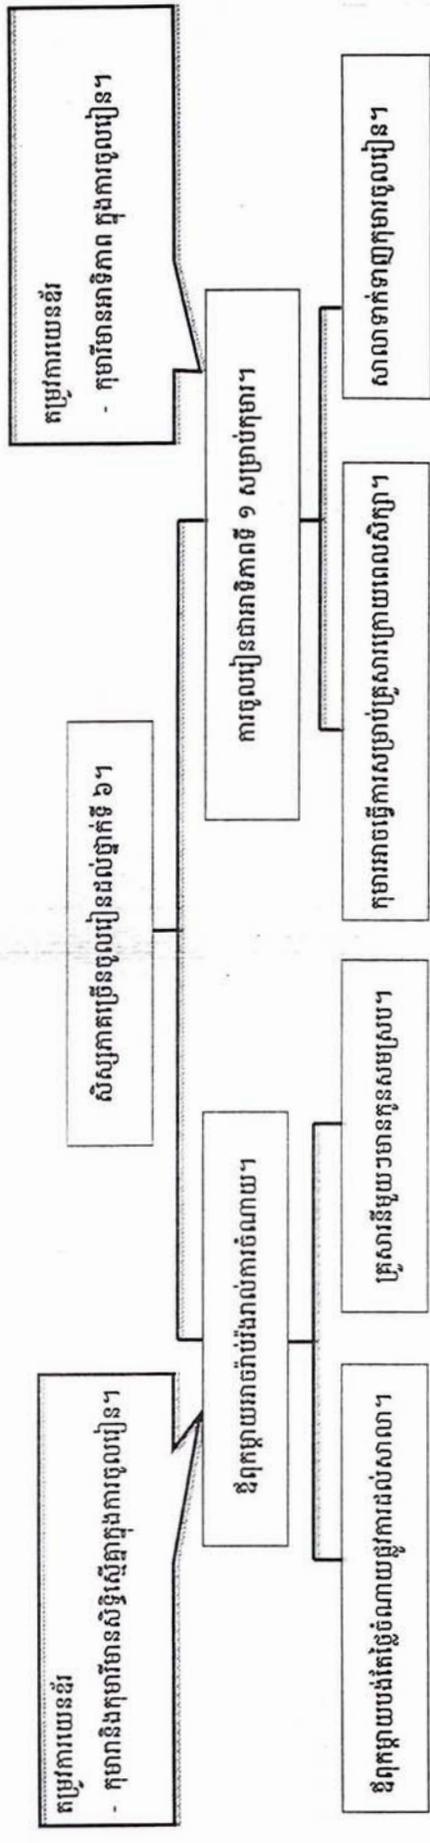

ផ្នែកទី ៤

លំហាត់៖ ការបំពេញតារាងធាតុ

សម្រាប់ CPDP

គ.ជ.អ.ប
NCDD



ផ្នែកទី ៨

លំហាត់៖ ការបំពេញតារាងនានា
សម្រាប់ CPDP

គម្រោងសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការ
នៅថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត (PILAC2)

គោលបំណង និងមាតិកា


គោលបំណងនៃផ្នែកទី ៨៖

សិក្ខាកាមមានសមត្ថភាពបំពេញតារាងសម្រាប់
CPDP

- មាតិកា៖
- ១. បទបង្ហាញស្តីពីវិធីបំពេញតារាង
 - ២. លំហាត់

ដំណើរការកសាង CPDP និង CPIP

■ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត (CPDP)



■ កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត (CPIP)



ជំហានទី ៣: ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-១. ការវិភាគស្ថានភាពរាជធានី ខេត្ត

គោលបំណង

ដើម្បីពិភាក្សា និងរកទស្សនៈឯកភាពលើបញ្ហានានា មូលហេតុនៃបញ្ហា និងដំណោះស្រាយក្នុងវិស័យនានានៃរាជធានី ខេត្ត

ជំហានទី ៣៖ ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

៣-១. ការវិភាគស្ថានភាពរាជធានី ខេត្ត (បន្ត)

សមាសភាព

- មន្ត្រីបច្ចេកទេសពីមន្ទីរ អង្គភាពនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកនីមួយៗ
- មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានានៃទីតាត់ការសាលារាជធានី ខេត្ត
- សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូចជា តំណាងក្រុមប្រឹក្សា នៃរដ្ឋបាលប្រភេទរួមគ្នា និងប្រភេទផ្សេងគ្នា។
- តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជន
- ក្រុមការងារកសាងផែនការ (PWG) (អ្នកសម្របសម្រួល)
- មន្ទីរផែនការរាជធានី ខេត្ត (អ្នកសម្របសម្រួល)
- ទីតាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ (អ្នកសម្របសម្រួល)

លទ្ធផល

- តារាង ២.១ ដល់តារាង ២.១៤

4

៣-១ ការវិភាគស្ថានភាព សម្រាប់តារាង២.១ ដល់តារាង២.១១

- ជាបឋម PWG ត្រូវណែនាំពីវិធីរៀបចំការវិភាគស្ថានភាពនៃផ្នែកនីមួយៗ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំណែនាំ
- បន្ទាប់មក អ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវបែងចែកទៅជាបួន (៤)ក្រុម ហើយក្រុមនីមួយៗ ត្រូវបំពេញនូវតារាងដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវ

▪ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច	→	តារាង២.១
▪ ផ្នែកសង្គមកិច្ច	→	តារាង២.២ តារាង២.៣ តារាង២.៤
▪ ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន មហានិរាម	→	តារាង២.៥ តារាង២.៦ តារាង២.៧ តារាង២.៨ និងតារាង២.៩
▪ ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ	→	តារាង២.១០ និងតារាង២.១១

5

ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ៖ តារាង២.១៖ ការវិនិយោគផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

១. ជ្រើសរើស វិស័យ និងសកម្មភាពសំខាន់ៗ ក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធយល់ថាមានសារៈសំខាន់ និងចង់លើកចំណុចទាំងនោះមកដោះស្រាយ ក្នុងអំឡុង ៥ឆ្នាំខាងមុខ។ វិស័យ និងសកម្មភាពសំខាន់ៗ ត្រូវជ្រើសរើស ដោយផ្អែកតាមលក្ខខណ្ឌ នៃកម្រិតចំណូល ផលិតផល ចំនួនប្រជាជនដែលធ្វើការ និងតំបន់ភូមិសាស្ត្រក្នុងវិស័យជាក់លាក់មួយ។
២. "សក្តានុពល" កត្តាសក្តានុពល ដែលត្រូវឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួន (មានលក្ខណៈវិជ្ជមាន) អាចត្រូវលើកយកមកពិចារណា។
៣. "ទំហំបញ្ហា" ត្រូវគិតជាចំនួន (ប្រសិនបើមានលទ្ធភាព) ដូចជាចំនួនប្រជាជន ដែលទទួលផលប៉ះពាល់ ដោយបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយ។

ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ៖ តារាង២.១៖ ការវិនិយោគផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច (បន្ត)

៤. បំពេញជួរឈរនៃ "មូលហេតុ" និង "ដំណោះស្រាយ" ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការវិភាគបញ្ហា និងការវិភាគរកដំណោះស្រាយ។

វិស័យ និងសកម្មភាពចម្បងៗ	សក្តានុពល (ភាពខ្លាំង)	បញ្ហា (ភាពខ្សោយ)	ទំហំបញ្ហា	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការយេនឌ័រ
-------------------------	-----------------------	------------------	-----------	---------	------------	-----------------

កសិកម្ម

ការធ្វើស្រែ	នាំស្រូវចេញទៅក្រៅប្រទេស	- ទិន្នផលទាប - ការកិនស្រូវមានគុណភាពទាប	៥០០០គ្រួសារធ្វើស្រែ	- ខ្វះធនធានផ្នែកកសិកម្ម - រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមិនគ្រប់គ្រាន់	- ណែនាំបច្ចេកទេសសមស្រប - លើកកម្ពស់ការវិនិយោគផ្នែកឯកជន ក្នុងការកិនស្រូវ	
-------------	-------------------------	---	---------------------	---	---	--

ផ្នែកសង្គមកិច្ច ៖ តារាង២.២៖ ការវិនិយោគផ្នែកសង្គមកិច្ច

១. ជ្រើសរើស វិស័យ និងសកម្មភាពសំខាន់ៗ ក្នុងផ្នែកសង្គមកិច្ច ដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធយល់ថាមានសារៈសំខាន់ និងចង់លើកចំណុចទាំងនោះមកដោះស្រាយ ក្នុងអំឡុង ៥ឆ្នាំខាងមុខ។ វិស័យ និងសកម្មភាពសំខាន់ៗ គួរតែជ្រើសរើស ដោយផ្អែកតាមលក្ខខណ្ឌ នៃកម្រិតចំណូលផលិតផល ចំនួនប្រជាជនដែលធ្វើការ និងតំបន់ ភូមិសាស្ត្រ ក្នុងវិស័យជាក់លាក់មួយ។
២. "សក្តានុពល" កត្តាសក្តានុពល ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួន (មានលក្ខណៈវិជ្ជមាន) អាចត្រូវលើកយកមកពណ៌នា។
៣. "ទំហំបញ្ហា" ត្រូវគិតជាចំនួន (ប្រសិនបើមានលទ្ធភាព) ដូចជាចំនួនប្រជាជន ដែលទទួលផលប៉ះពាល់ ដោយបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយ។

ផ្នែកសង្គមកិច្ច (១) ៖ តារាង២.២៖ ការវិនិយោគការងារសង្គមកិច្ច (មន្ត)

៤. បំពេញជួរឈរនៃ "មូលហេតុ" និង "ដំណោះស្រាយ" ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការវិភាគបញ្ហា និងការវិភាគរកដំណោះស្រាយ។

វិស័យ និងសកម្មភាព ឬសេវា ចម្បងៗ	សក្តានុពល (ភាពខ្លាំង)	បញ្ហា (ភាពខ្សោយ)	ទំហំបញ្ហា	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការឃេនឌ័រ
វិស័យសុខាភិបាល៖ សកម្មភាព៖		- អត្រាចាក់ថ្នាំបង្ការមានកម្រិតទាប	កុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ	- បុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពខ្វះខាត	- បណ្តុះបណ្តាលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកសុខភាពនៅសហគមន៍	
ការចាក់ថ្នាំបង្ការឱ្យកុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ	សុខភាពកុមារល្អប្រសើរឡើង	- អត្រាជម្ងឺមានកម្រិតខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍ ជម្ងឺកញ្ជ្រោល)	ចំនួន ១០០០ នាក់	- ខ្វះថវិកាទិញថ្នាំចាក់បង្ការ រោគ	- ណែនាំកម្មវិធីចែករំលែកការចំណាយ	

ផ្នែកសង្គមកិច្ច (២)៖ តារាង២.៣៖ការវិនិយោគភាពក្រីក្រ

ភាពក្រីក្របណ្តាលមកពីកត្តា និងមូលហេតុផ្សេងៗជាច្រើន ធ្វើឲ្យមានការ ពិបាកសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួម លើកយកមកពិភាក្សាដោយ ពេញលេញ និងកំណត់ពីទំនាក់ទំនងមូលហេតុទាំងនោះ។ លើសពីនេះ វិធានការដើម្បីដោះស្រាយភាពក្រីក្រ ត្រូវលើកយកពិភាក្សានៅក្នុងផ្នែក នីមួយៗ។ អ្នកពាក់ព័ន្ធ អាចមិនពិភាក្សាការវិនិយោគភាពក្រីក្រ លើក លែងតែបញ្ហាទាក់ទង និងភាពក្រីក្រណាមួយ មិនត្រូវបានលើកយកមក ពិភាក្សា ក្នុងផ្នែកផ្សេងៗទៀត។

អត្រាភាពក្រីក្រក្នុង ៣ឆ្នាំចុងក្រោយ	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការ យើងខ្ញុំ
២០០៨ ២០០៩ ២០១០			

ផ្នែកសង្គមកិច្ច (៣)៖ តារាង២.៤៖ការវិនិយោគអំពីការងារយេនឌ័រ

បញ្ហាយេនឌ័រត្រូវបានធ្វើការវិភាគក្នុងផ្នែកនីមួយៗ ដូច នេះ អ្នកពាក់ព័ន្ធអាចធ្វើការរំលងការវិភាគនេះ លើក លែងតែបញ្ហាសំខាន់ៗណាផ្សេងទៀត ដែលមិនត្រូវបាន លើកយកមកពិភាក្សាក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀត។

តារាង២.៤៖ ការវិភាគអំពីការងារយេនឌ័រ

បញ្ហាសំខាន់ៗ	កម្រិតប៉ះពាល់	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ
---------------------	----------------------	----------------	-------------------

ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ(១)៖ តារាង២.៥

តារាង ២.៥ ៖ ការវិភាគអំពីការប្រើប្រាស់ដីធ្លី

១. បំពេញជួរឈរនៃ "ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី" និង "ភាគរយនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី" ពីប្រភពព័ត៌មាន ដូចជាសៀវភៅស្ថិតិប្រចាំឆ្នាំ និង ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។
សម្គាល់៖ ទិន្នន័យត្រូវបានណែនាំឲ្យបំពេញទុកជាមុន។
២. ជ្រើសរើស "វិស័យ និងសកម្មភាពសំខាន់ៗ" ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធយល់ថាមានសារៈសំខាន់ និងចង់លើកចំនុចទាំងនោះមកដោះស្រាយក្នុងអំឡុងពេល ៥ឆ្នាំខាងមុខ។

ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ(១)៖ តារាង២.៥ (បន្ត)

៣. បំពេញជួរឈរនៃ "បញ្ហា" "មូលហេតុ" និង "ដំណោះស្រាយ" ដោយ ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការវិភាគបញ្ហា និងការវិភាគរកដំណោះស្រាយ។

ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី	ភាគរយនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី	បញ្ហា	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការយេនឌ័រ
-----------------------------	----------------------------	-------	---------	------------	-----------------

ដីសម្រាប់រស់នៅ និងធ្វើស្រែចំការ ៧០% នៃដីក្នុងខេត្ត ក

- កើនឡើង ជម្លោះពីការកាន់កាប់ដី

- ខ្វះខាត ការចុះបញ្ជីដីធ្លី

- ណែនាំ ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីដីធ្លី

ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ(២)៖ តារាង២.៦

តារាង២.៦៖ ការវិភាគអំពីធនធានធម្មជាតិ

- ១. ជ្រើសរើស និងសរសេរពីប្រភេទធនធានធម្មជាតិដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធបានចូលរួម ចង់លើកយកមកពិភាក្សា ដោយយោងទៅតាមក).សារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង
 - ខ).ទំហំនៃចំនួនប្រជាជនដែលប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ។*សម្គាល់៖ មានការបែងចែកធនធានធម្មជាតិជាច្រើនប្រភេទ។ ធនធានធម្មជាតិទូទៅរួមមាន៖ ទឹក ធនធានដី ព្រៃឈើ ផលជល សមុទ្រ និងធនធានក្រោមសមុទ្រ។*
- ២. ជ្រើសរើស "វិស័យ និងសកម្មភាពចម្បង" ដែលទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធចាត់ទុកជាអាទិភាព។

ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ(២)៖ តារាង២.៦ (បន្ត)

- ៣.បំពេញនូវជួរឈរនៃ "សារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម" ដោយពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃប្រភេទធនធានធម្មជាតិជាក់លាក់ណាមួយ។ ឧទាហរណ៍ "ព្រៃកោងកាង" អាចចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ ពីព្រោះការអភិរក្សធនធានព្រៃកោងកាងមានប្រយោជន៍ សម្រាប់ជីវៈចម្រុះ។
- ៤.បំពេញនូវជួរឈរ "អ្នកអាស្រ័យផលពីធនធានធម្មជាតិ" ដោយពន្យល់ពីរបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលទទួលបានផលពីធនធានធម្មជាតិ។ឧទាហរណ៍ ប្រជាជនអាចពឹងផ្អែកទៅការនេសាទ ដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួន។
- ៥. បំពេញជួរឈរនៃ "បញ្ហា" "មូលហេតុ" និង "ដំណោះស្រាយ" ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការវិភាគបញ្ហា និងការវិភាគរកដំណោះស្រាយ។

**ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ (២) ៖ តារាង២.៦ (បន្ត)**

៦. ប្រសិនបើការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ មានលក្ខណៈមិនស្មើភាពគ្នារវាងបុរស និងស្ត្រី ត្រូវធ្វើការបរិយាយពីតម្រូវការយេនឌ័រ ដើម្បីកែតម្រូវភាពមិនស្មើគ្នានោះ។

ប្រភេទ ធនធាន ធម្មជាតិ	សារៈសំខាន់ ក្នុងសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច	អ្នកអាស្រ័យ ផល (អ្នកមាន មុខរបរចម្បង)	បញ្ហា	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការ យេនឌ័រ
ព្រៃឈើ	-ប្រភពអុស -ជម្រកសត្វ -ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ ទេសចរណ៍	៣០%នៃប្រជា ជនដែលរស់ នៅជិតតំបន់ ព្រៃឈើ	គ្រោះធម្មជាតិ (ទឹកជំនន់, រាំងស្ងួត..)	ការកាប់ បំផ្លាញព្រៃ ឈើដែល ជាជម្រក សត្វព្រៃ	- អប់រំប្រជាពលរដ្ឋ យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ របស់ព្រៃឈើ - ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ការពារព្រៃឈើ - ទំលុំទុលាយដល់ប្រជា ពលរដ្ឋ - បង្កើតសហគមន៍ការ ពារព្រៃឈើបាន ច្រើន	ស្ត្រីចំណាក ស្រុកមាន បញ្ហាជីវភាព

**ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ (៣) ៖ តារាង២.៧**

តារាង២.៧ ការវិភាគអំពីបរិស្ថាន

១. ជ្រើសរើស និងកត់ត្រាប្រភេទនៃបរិស្ថានក្នុងជួរឈរនៃ "បញ្ហាចម្បង"
ដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធចាត់ទុកថាមានសារៈប្រយោជន៍ ដោយផ្អែកតាម ក).
សារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង ខ). ចំនួនប្រជាជន
ដែលទទួលរងឥទ្ធិពលពីបរិស្ថាន។

*សម្គាល់៖ មានការបែងចែកប្រភេទនៃបរិស្ថានមានច្រើនប្រភេទ ដូចជា
ការបំពុលក្នុងបរិយាកាស ទឹកមិនស្អាត ការបំពុលដី លូទឹកស្អុយ កាក
សំណល់រឹង និងរាវ សំលេង ក្លិនអាក្រក់ ការស្រុកដី ជាដើម។*

២. បំពេញជួរឈរនៃ "បញ្ហា" "មូលហេតុ" និង "ដំណោះស្រាយ" ដោយ
ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការវិភាគបញ្ហា និងការវិភាគរដំណោះស្រាយ។

ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ(៣)៖ តារាង២.៧ (បន្ត)

៣. ប្រសិនបើបញ្ហាបរិស្ថានដែលបានជ្រើសរើសមានបញ្ហា ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងទស្សនៈយេនឌ័រ គួរពិពណ៌នាពីតម្រូវការយេនឌ័រ។

បញ្ហាសំខាន់ៗ	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការយេនឌ័រ
ការបោះចោលកាកសំណល់រឹងមិនសមស្រប	<ul style="list-style-type: none"> - ចំនួនប្រជាជនកើនឡើង - ខ្វះកន្លែងចាក់សម្រាម - ខ្វះវិធានការសម្រាម 	<ul style="list-style-type: none"> - សាងសង់កន្លែងចាក់សម្រាម - ទិញវិធានការសម្រាម 	

ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ(៤)៖ តារាង២.៨

តារាង២.៨៖ ការវិភាគគ្រោះមហន្តរាយ

១. ប្រសិនបើទិន្នន័យមានស្រាប់ សូមបំពេញជួរឈរនៃ "ប្រភេទគ្រោះមហន្តរាយ" ដែលបានកើតឡើងជាក់ស្តែងក្នុង ០៥ ឆ្នាំកន្លងមក និងទំហំនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងរាជធានី ខេត្ត។

សម្គាល់៖ ប្រភេទគ្រោះមហន្តរាយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មាន ៖

- ក). គ្រោះមហន្តរាយដោយសារអាកាសធាតុ មានដូចជា ខ្យល់កម្រិតទឹកភ្លៀង លេកកំដៅ ការបំផ្លាញ ដោយរន្ធបាញ់
- ខ). គ្រោះមហន្តរាយដោយសារដី៖ ភ្លើងឆេះ ការបាក់ដី
- គ). គ្រោះមហន្តរាយដោយសារសត្វ មានដូចជា ជំងឺឆ្លង(ផ្តាសាយ បក្សី) ការខូចខាតដោយសារសត្វល្អិត បក្សី និងសត្វចតុប្បាតនានា។

ផ្នែកគ្រប់គ្រងជីវិត ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ(៤)៖ ភារាង២.៤ (បន្ត)

២. បំពេញជួរឈរនៃ "កម្រិតកើតមានក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក" "តំបន់រងគ្រោះ" និង "ទំហំនៃការខូចខាត" ប្រសិនបើមានទិន្នន័យ។

៣. វិភាគ និងបរិយាយពី "មូលហេតុ" នៃគ្រោះមហន្តរាយនៅពេលដែលគ្រោះមហន្តរាយ បានកើតឡើងដោយកត្តាមនុស្ស។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើមានទឹកជំនន់កើតឡើងបណ្តាលមកពីទឹកទន្លេ ដោយសារតែគ្មានទំនប់ទឹក នេះអាចចាត់ទុកថាជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងៗទៀត។ ប្រសិនបើ "មូលហេតុ" មិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាជាកត្តាមនុស្សទេ គ្រាន់តែសរសេរថាមកពី "គ្រោះធម្មជាតិ" គ្រប់គ្រាន់ហើយ។

៤. វិភាគ និងពណ៌នា "ដំណោះស្រាយ" សម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយ។ ដំណោះស្រាយមានន័យថា ជាវិធានការទប់ស្កាត់សម្រាប់ករណី នេះនាពេលអនាគត។

ផ្នែកគ្រប់គ្រងជីវិត ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ(៤)៖ ភារាង២.៤ (បន្ត)

៥. វិភាគ និងពណ៌នាពី "តម្រូវការយេនឌ័រ" ប្រសិនបើគ្រោះមហន្តរាយរួមបញ្ចូលបញ្ហាយេនឌ័រ។

សម្គាល់៖ ប្រសិនបើក្រុមស្ត្រី មួយចំនួនទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺឆ្លង ដែលមិនបណ្តាលមកពីពពួកសត្វ មិនស្មើភាពគ្នាប្រើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមបុរស នៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់មួយ វិធានការសម្រាប់ក្រុមស្ត្រីទាំងនោះ គួរតែលើកយកមកបង្ហាញក្នុងជួរឈរ។

ផ្នែកគ្រប់គ្រងជីវិត ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ(៤)៖ តារាង២.៤ (បន្ត)

ប្រភេទគ្រោះមហន្តរាយ	កម្រិតកើតមានក្នុង៥ឆ្នាំកន្លងមក	តំបន់រងគ្រោះ	ទំហំនៃការខូចខាត		មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការយេនឌ័រ
			ឆ្នាំ	លានរៀល			
ទឹកជំនន់	២ ដង	តំបន់ឆ្នេរ ទន្លេ ក	២០០២ និង ២០០៦	មិនមាន	- ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ប្រាំង ទន្លេមិនសមស្រប	- ប្រព័ន្ធប្រកាស អាសន្នជាមុន ការសាងសង់ប្រាំង ទន្លេ	មិនមាន

ផ្នែកគ្រប់គ្រងជីវិត ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ(៥)៖ តារាង២.៥

តារាង២.៥៖ ការវិភាគអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

- ដោយសារតែធម្មជាតិនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលរួមមានបញ្ចូលកត្តាមនុស្ស និងកត្តាធម្មជាតិជាច្រើនប្រភេទ ជាមូលហេតុដែលពិបាកក្នុងការវិភាគឲ្យបានសមរម្យ។ ហេតុនេះ ការវិភាគអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចធ្វើការរំលង ប្រសិនបើអ្នកពាក់ព័ន្ធយល់ព្រមគ្នាជា ឯកច្ឆន្ទ។

ប្រភេទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	ផលប៉ះពាល់	តំបន់រងគ្រោះ	ក្រុមរងគ្រោះ	វិធានការសម្របសម្រួល	តម្រូវការយេនឌ័រ
-------------------------------	-----------	--------------	--------------	---------------------	-----------------

**ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ (១)៖
តារាង២.១០**

តារាង២.១០៖ ការវិភាគអំពីសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

១. ជ្រើសរើស និងកត់ត្រាបញ្ហានៃផ្នែកសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងជួរឈរនៃ "បញ្ហាសំខាន់ៗ" ដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ (ឧទា៖ ឧក្រិដ្ឋកម្ម គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ការជួញដូរមនុស្ស)។
២. កំណត់កម្រិតនៃផលប៉ះពាល់ ប្រសិនបើផលប៉ះពាល់អាចគិតជាចំនួន (ឧទា.ចំនួននៃជនរងគ្រោះដោយ បទឧក្រិដ្ឋកម្មជាក់លាក់ណាមួយ)។
៣. បំពេញជួរឈរនៃ "មូលហេតុ" និង "ដំណោះស្រាយ" ដោយប្រើប្រាស់ការវិភាគបញ្ហា និងការវិភាគរកដំណោះស្រាយ។

**ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ (១)៖
តារាង២.១០ (បន្ត)**

៤. ពិពណ៌នាពីតម្រូវការយេនឌ័រ ប្រសិនបើបញ្ហា រួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ (ឧទា.ប្រសិនបើការជួញដូរមនុស្សភាគច្រើនកើតមានចំពោះស្ត្រី តម្រូវការដើម្បីដោះស្រាយ ពីបញ្ហានៃភាពមិនស្មើគ្នារវាងស្ត្រី និងបុរស អាចរៀបរាប់នៅក្នុងជួរឈរនេះ។

បញ្ហាសំខាន់ៗ	កម្រិតប៉ះពាល់	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការយេនឌ័រ
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ	ស្លាប់ ១០០នាក់/១ឆ្នាំ របួស១៥០០នាក់ /១ឆ្នាំ	- មិនគោរព ច្បាប់ចរាចរ - ខ្លះ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរ	- ការអប់រំអំពីច្បាប់ចរាចរ ដោយមិនយកប្រាក់ - ការលើកកម្ពស់តាមរយៈ ទូរទស្សន៍ វីឡេ - ការដាក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរ - ការបង្កើតឱ្យមានភ្លើង សញ្ញាចរាចរបន្ថែមទៀត	មិនមាន

**ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ (២)៖
តារាង២.១១**

តារាង២.១១៖ ការវិភាគការងាររដ្ឋបាល

១. កំណត់ និងកត់ត្រាពីបញ្ហានៃការងាររដ្ឋបាលក្នុងជួរឈរនៃ "បញ្ហាសំខាន់ៗ" ដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ (ឧទាហរណ៍៖ ការបង្ហាញ និងចែកចាយព័ត៌មានសាធារណៈ ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ)
២. បំពេញជួរឈរនៃ "មូលហេតុ" និង "ដំណោះស្រាយ" ដោយប្រើប្រាស់ការវិភាគបញ្ហា និងការវិភាគរកដំណោះស្រាយ។
៣. ពិពណ៌នាពីតម្រូវការយេនឌ័រ ប្រសិនបើបញ្ហារួម ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាយេនឌ័រ។

26

**ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ (២)៖
តារាង២.១១**

តារាង២.១១៖ ការវិភាគការងាររដ្ឋបាល (បន្ត)

បញ្ហាសំខាន់ៗ	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការយេនឌ័រ
--------------	---------	------------	-----------------

ពន្យារពេលដំណើរការដាក់ឯកសារ	- ដំណើរការអនុម័តមានរយពេលយូរ	- ពិនិត្យ និងកែលម្អអំពីនីតិវិធីដោយសហការជាមួយក្រសួងថ្នាក់កណ្តាល	មិនមាន
	- ការដាក់ពាក្យមានការកើនឡើង		

27

បូកសរុបលទ្ធផលនៃការវិភាគ

១. PWG ត្រូវប្រមូលលទ្ធផលនៃការពិភាក្សា (តារាង ២.១ ដល់តារាង ២.១១) និងធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលទាំងនោះទៅក្នុង តារាង២.១២។ វិធីបូកសរុបលទ្ធផលគឺ៖
 - ✓ លទ្ធផលវិភាគតារាង២.១ បញ្ចូលទៅក្នុងតារាង២.១២ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
 - ✓ លទ្ធផលវិភាគតារាង២.២ តារាង២.៣ តារាង២.៤បញ្ចូលទៅក្នុងតារាង២.១២ ផ្នែកសង្គមកិច្ច
 - ✓ លទ្ធផលវិភាគតារាង២.៥ តារាង២.៦ តារាង២.៧ តារាង២.៨ និងតារាង២.៩ បញ្ចូលទៅក្នុងតារាង២.១២ ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ។
 - ✓ តារាង២.១០ និងតារាង២.១១ បញ្ចូលទៅក្នុងតារាង២.១២ ផ្នែករដ្ឋបាលនិងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ។

សម្គាល់៖ ក្នុងការបូកសរុបលទ្ធផលនៃការវិភាគ ក្នុងតារាង២.១២ ជួរឈរ "អាទិភាព" ត្រូវទុកឱ្យនៅទំនេរសិន។
២. បន្ទាប់ពីធ្វើការបូកសរុបរួចមក PWG ត្រូវបង្ហាញលទ្ធផលនៃការវិភាគ និងធ្វើការពិភាក្សាកំណត់អាទិភាពដំណោះស្រាយតាមផ្នែកនីមួយៗ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ។

28

តារាង២.១២៖ តារាងសំយោគបញ្ហា និងតម្រូវការផ្នែកលើលទ្ធផលវិភាគស្ថានភាពថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត

	វិស័យ និងសកម្មភាព	បញ្ហា	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការយេនឌ័រ	អាទិភាព
	១. វេទនាសេដ្ឋកិច្ច					
លទ្ធផលវិភាគតារាង២.១						
	២. វេទនាសង្គមកិច្ច					
	៣. ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ					
លទ្ធផលវិភាគតារាង២.៥						
លទ្ធផលវិភាគតារាង២.៦						
លទ្ធផលវិភាគតារាង២.៧						
លទ្ធផលវិភាគតារាង២.៨						
លទ្ធផលវិភាគតារាង២.៩						
	៤. វេទនារដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ					
លទ្ធផលវិភាគតារាង២.១០						
លទ្ធផលវិភាគតារាង២.១១						

29

តារាង ២.១៣៖ តារាងបញ្ជី និងតម្រូវការរាជធានី ខេត្ត

វិស័យ និង សកម្មភាព	បច្ចា	មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការ យេនឌ័រ	ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ	អាទិភាព រាជធានី ខេត្ត	ជាមធ្យម
១.ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច							
២.ផ្នែកសង្គមកិច្ច							
៣.ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ							
៤.ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ							

30

ដំណើរការនៃការសម្រេច

- តារាង ២.១៣ គឺជាតារាងសម្រេចនៃតារាង ២.១២ និង ១.៥
- អាទិភាពមធ្យមត្រូវគណនាដោយគិតចំណុចកណ្តាល នៃអាទិភាពរបស់ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងរាជធានី ខេត្ត
- បន្ទាប់ពីបានរៀបចំតារាង២.១៣ PWG ត្រូវរៀបចំតារាង២.១៤ ដោយស្រង់ ដំណោះស្រាយនានានៃតារាង២.១៣ ស្របតាមលំដាប់លំដោយអាទិភាពពី ខ្ពស់មកទាប តាមវិស័យ និងផ្នែកនីមួយៗ។

31

តារាង ១៤៖ តម្រូវការអាទិភាពរាជធានី ខេត្ត

វិស័យ និង សកម្មភាព	ដំណោះស្រាយ	តម្រូវការយេនឌ័រ	អាទិភាព
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច			
	aaaaaaaa		ខ្ពស់
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច			
	bbbbbbbb		ខ្ពស់
	cccccccc		ទាប
៣. ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ			
	ddddddd		ខ្ពស់
	eeeeeeee		មធ្យម
	ffffff		ទាប
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ			
	ggggggg		ខ្ពស់
	hhhhhhh		មធ្យម

តារាងក្រុមខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

ចតុវិស័យ ៖	គោលដៅ និងគោលបំណង	សូចនាករ		យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍
		ឯកតា	២០០៩	
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច				
១.១. គោលដៅ ៖				
	១.១.១. គោលបំណង ៖			
	១.១.២. គោលបំណង ៖			
១.២. គោលដៅ ៖				
	១.២.១. គោលបំណង ៖			
	១.២.២. គោលបំណង ៖			
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច				
២.១. គោលដៅ ៖				
	២.១.១. គោលបំណង ៖			
	២.១.២. គោលបំណង ៖			
៣. ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ				
៣.១. គោលដៅ ៖				
	៣.១.១. គោលបំណង ៖			
	៣.១.២. គោលបំណង ៖			
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ				
៤.១. គោលដៅ ៖				
	៤.១.១. គោលបំណង ៖			
	៤.១.២. គោលបំណង ៖			

Table Development Framework K.docx

ចក្ខុវិស័យ :				
គោលបំណង/គោលបំណង	ស្ថិតភាព			ធនាគារ/អង្គការ
	ឯកតា	២០០៤	២០១៤	
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច				
បញ្ជីថវិកាប្រចាំឆ្នាំ				
ទិន្នផលស្រូវ/ផលិតផលកសិកម្ម	ភាគរយ	២.៤	២.៨	បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស
ថវិកាស្រាវជ្រាវ	ភាគរយ	១០០	១៩០	ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច				
២.១. សំរាប់ស្ថិតភាពជាទូទៅរបស់ប្រជាជន/សេវាសាធារណៈ				
អត្រាកម្មវិធីសេវាសាធារណៈ	%	៧០	១០០	អប់រំ/សុខភាព
ចំនួនបង្កើនសាលាបឋមសិក្សា	ចំនួន	៩៦	៧០	សាងសង់សាលាបឋមសិក្សា និង
ចំនួនបង្កើនសាលាអនុវិទ្យាល័យ	ចំនួន	១០	២០	អនុវិទ្យាល័យ
២.២. លើកកម្ពស់ស្ថិតភាពសេវាសាធារណៈ/សេវាសាធារណៈ				
អត្រាស្រ្តីសំរាប់សេវាសាធារណៈ	%	៣៩	៧០	អប់រំ/សុខភាព/សេវាសាធារណៈ
អត្រាមណ្ឌលសេវាសាធារណៈ/ក្រុមគ្រួសារសំរាប់សេវាសាធារណៈ	ចំនួន/១០០គ្រួសារ	១៩៤	១០០	ការសំរាប់សេវាសាធារណៈ
អត្រាមណ្ឌលសេវាសាធារណៈ/ក្រុមគ្រួសារសំរាប់សេវាសាធារណៈ	ចំនួន/១០០គ្រួសារ	១៩	៩	ជំរុញការចាត់តាំងបុគ្គលិក
២.៣. លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជន/សេវាសាធារណៈ/សេវាសាធារណៈ				
អត្រាស្រ្តីសំរាប់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ	%			
អត្រាស្រ្តីសំរាប់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ	%			
អត្រាស្រ្តីសំរាប់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ	%			
អត្រាស្រ្តីសំរាប់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា	%			

លំហាត់

- ១) សិក្ខាតាមចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រូវបែងចែកទៅជាបួន (៤) ក្រុម។
- ២) សូមចាត់ផ្នែកមួយសម្រាប់ក្រុមមួយ និងបំពេញតារាងតាមលំដាប់លំដោយ (តារាង២.១ ដល់តារាង២.១១)។ (៦០នាទី)
- ៣) បូកសរុបតារាង២.១ ដល់តារាង២.១១ ទៅតារាង២.១២ សម្រាប់ក្រុមមួយ ។
- ៤) បន្ទាប់ពីបញ្ចប់តារាង២.១២ ត្រូវបង្វែរតារាង២.១២ ទៅតារាង ២.១៣។ (៦០នាទី)

(២ម៉ោង)

សូមអរគុណ!

36

ផ្នែកទី ៩

លំហាត់៖

យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍

គ.ជ.អ.ប
NCDD



ផ្នែកទី ៩
លំហាត់
យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍

គម្រោងសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍មត៌ភាព
ក្នុងការអនុវត្តការរៀបចំគម្រោង
នៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំង (PLAC 2)

គោលបំណង និងមាតិកា


គោលបំណងនៃផ្នែកទី ៩៖

សិក្ខាកាមមានសមត៌ភាពរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍

- មាតិកា៖
- ១. បទបង្ហាញ៖ ការវិភាគ SWOT និងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍
 - ២. លំហាត់

គោលបំណងនៃយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ (១)

- ប្រយោគសំយោគមួយនៃលទ្ធផល (គោលដៅ) ដែលស្ថាប័នមួយកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែង ហើយមធ្យោបាយ (គោលនយោបាយ) ដែលស្ថាប័នកំពុងស្វែងរកដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅ។

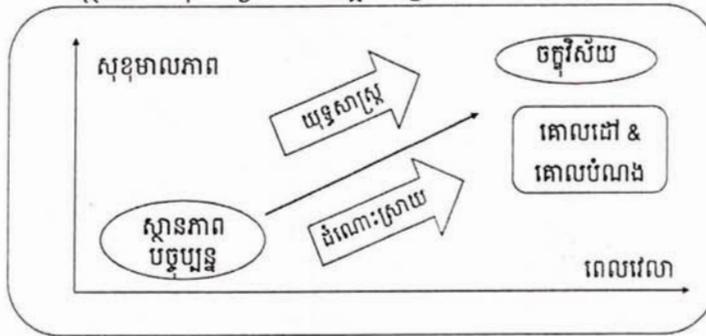

គោលបំណងនៃយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ (២)

- គោលបំណងចេញទៅប្រទេសជប៉ុន
- ចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិ
- ប្រៀបធៀបគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ

មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ	គុណសម្បត្តិ	គុណវិបត្តិ
យន្តហោះ	ពេលវេលាធ្វើដំណើរខ្លី និង ទៀងទាត់ពេលវេលា	តម្លៃខ្ពស់
កប៉ាល់	តម្លៃថោក	ពេលវេលាធ្វើដំណើរយូរ មិនមានគ្រប់ពេល
ឡានក្រុង និងកប៉ាល់	តម្លៃមធ្យម	កាលវិភាគមិនច្បាស់លាស់ និងហានិភ័យខ្ពស់
ឡានក្រុង រថភ្លើង កប៉ាល់	តម្លៃថោកបំផុត	កាលវិភាគមិនច្បាស់លាស់ ហានិភ័យមធ្យម

- មធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលបានជ្រើសរើស៖ យន្តហោះ

ជំហានវិភាគវិនិច្ឆ័យយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍

- ១. រៀបចំតារាងម៉ាទ្រិច SWOT
- ២. វិភាគតារាងម៉ាទ្រិច SWOT
- ៣. រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗ នៃផ្នែកទាំងបួន

រៀបចំតារាងម៉ាទ្រិច SWOT (១)

- ការវិភាគ SWOT គឺជាឧបករណ៍វិភាគមួយប្រើសម្រាប់ការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍
 - កត្តាខាងក្នុងស្ថិតក្នុងវិស័យ/អង្គការជាក់លាក់មួយ
 - កត្តាខាងក្រៅដែលកើតមានពីខាងក្រៅវិស័យ/អង្គការ
- ឧបករណ៍នេះជួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាឲ្យយល់ និងវិភាគទាំងកត្តាខាងក្នុង និងកត្តាខាងក្រៅក្នុងពេលតែមួយ និងរៀបចំកសាងយុទ្ធសាស្ត្រជាក់ស្តែងនានា។

រៀបចំតារាងម៉ាទ្រិច SWOT (២)

ឧទាហរណ៍៖ តារាងម៉ាទ្រិច SWOT

	ឱកាស	ភាពគំរាមកំហែង
	១. ២. ៣.	១. ២. ៣.
<u>ភាពខ្លាំង</u>	<u>ប្រើប្រាស់ឱកាសដោយ</u> <u>ប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំង</u>	<u>ព្រះពារលើភាពគំរាមកំហែង</u> <u>ដោយការប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំង</u>
១. ២. ៣.		
<u>ភាពខ្សោយ</u>	<u>ប្រើប្រាស់ឱកាសដើម្បី</u> <u>កាត់បន្ថយភាពខ្សោយ</u>	<u>ព្រះពារលើភាពគំរាមកំហែង</u> <u>ដើម្បី កាត់បន្ថយភាពខ្សោយ</u>
១. ២. ៣.		

រៀបចំតារាងម៉ាទ្រិច SWOT (៣)

និយមន័យនៃភាពខ្លាំង ភាពខ្សោយ ឱកាស និងភាពគំរាមកំហែង

ភាពខ្លាំង	បុគ្គលិកលក្ខណៈនៃរាជធានី ខេត្ត ដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ជាជាងរាជធានី ខេត្ត ផ្សេងៗទៀត
ភាពខ្សោយ	បុគ្គលិកលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យរាជធានី ខេត្ត មានផលវិបាកជាង រាជធានី ខេត្តផ្សេងៗទៀត
ឱកាស	ឱកាសខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ និង ផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងជាងគេ នៅក្នុងបរិស្ថានជុំវិញ
ភាព គំរាមកំហែង	ធាតុផ្សំខាងក្រៅនានានៃបរិយាកាសខាងក្រៅដែលបណ្តាលឲ្យ មានបញ្ហាដល់រាជធានី ខេត្ត

វិភាគតារាងម៉ាទ្រីស SWOT

វិធីប្រើប្រាស់តារាងម៉ាទ្រីស

ឱកាស និងភាពខ្លាំង៖ តើវាជធានី ខេត្ត អាចប្រើប្រាស់ឱកាសដែលមិនបានប្រើប្រាស់ពីមុនមក ដោយការប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំងរបស់វាជធានី ខេត្តរបៀបណា?

ឱកាស និងភាពខ្សោយ៖ តើវាជធានី ខេត្ត អាចប្រើប្រាស់ឱកាសដែលមិនធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ពីមុនមក ដោយកាត់បន្ថយភាពខ្សោយដែលជាឧបសគ្គនៃការប្រើប្រាស់ឱកាសយ៉ាងដូចម្តេច?

ភាពគំរាមកំហែង និងភាពខ្លាំង៖ តើវាជធានី ខេត្ត អាចពុះពារពីភាពគំរាមកំហែងដោយការប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំងយ៉ាងដូចម្តេច?

ភាពគំរាមកំហែង និងភាពខ្សោយ៖ តើវាជធានី ខេត្ត អាចពុះពារពីភាពគំរាមកំហែងដោយកាត់បន្ថយភាពខ្សោយរបៀបណា?

រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗ នៃផ្នែកទាំងមូល (៤)

• រៀបចំប្រយោគដូចខាងក្រោមនេះ៖


- ពិពណ៌នាពីបញ្ហាដែលនឹងដោះស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់
- កំណត់ "ភាពខ្លាំង" ឬ "ឱកាស" ដែលនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយ "ភាពខ្សោយ" ឬ "ភាពគំរាមកំហែង"
- ពិពណ៌នាពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហា ដោយមធ្យោបាយនៃភាពខ្លាំង/ឱកាស ឬជៀសវាងភាពខ្សោយ/ឱកាស

ប្រសិនបើយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយមិនត្រូវបានកំណត់ទេនោះ លទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅ និងគោលបំណងត្រូវបានចោទសួរ។

លំហាត់

- ១) សិក្ខាកាមដែលចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រូវបែងចែកទៅជាបួន (៤) ក្រុម។
- ២) ពិភាក្សា និងកំណត់កត្តាខាងក្នុង (កត្តាស្ថិតក្នុងរាជធានី/ខេត្ត/វិស័យ) នៃភាពខ្លាំង និងភាពខ្សោយទៅលើផ្នែកជាក់លាក់។
- ៣) ពិភាក្សា និងកំណត់កត្តាខាងក្រៅនៃឱកាស និងភាពគំរាមកំហែង ទៅលើផ្នែកជាក់លាក់។
- ៤) ប្រសិនបើមានកត្តាច្រើនជាងប្រាំ ក្នុងផ្នែកណាមួយ នៃផ្នែកទាំងបួន សូមព្យាយាមជ្រើសរើសកត្តាសំខាន់ៗបំផុត យ៉ាងច្រើនឲ្យបាន ៣ ដើម្បីសម្រួលការពិភាក្សាឲ្យកាន់តែងាយស្រួល។
- ៥) ព្យាយាមកសាងយុទ្ធសាស្ត្រដោយសំយោគកត្តាទាំង ២។

ការពិនិត្យបរិស្ថាន

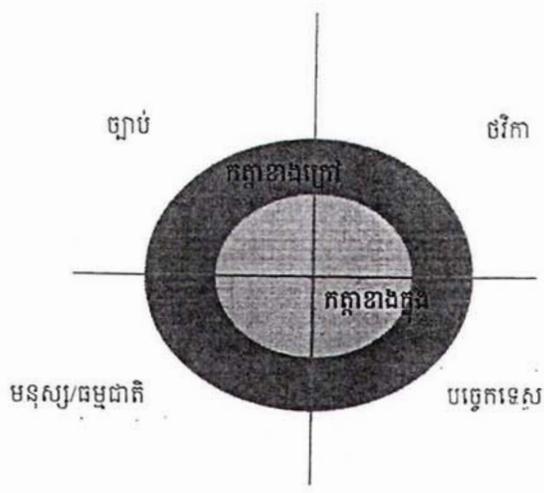

សូមអរគុណ!

ថ្ងៃកទី ១០

លំហាត់៖ សូចនាករ

គ.ជ.អ.ប
NCDD



ផ្នែកទី ១០

លំហាត់៖ សូចនាករ

គម្រោងសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការ
នៅថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត (PILAC 2)

គោលបំណង និងមាតិកា

គោលបំណងនៃផ្នែកទី ១០៖

សិក្ខាកាមនឹងមានសមត្ថភាពកំណត់សូចនាករនានា
សម្រាប់មួយគោលដៅ ដែលបានកំណត់

- មាតិកា៖
១. បទបង្ហាញ៖ សូចនាករ
 ២. លំហាត់

តារាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

ច្បាប់ស្រី ៖				
គោលដៅ និងគោលបំណង	ស្ថិតិសាស្ត្រ			យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍
	ឯកតា	២០០៩	២០១៤	
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច				
១.១. គោលដៅ ៖				
១.១.១. គោលបំណង ៖				
១.១.២. គោលបំណង ៖				
១.២. គោលដៅ ៖				
១.២.១. គោលបំណង ៖				
១.២.២. គោលបំណង ៖				
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច				
២.១. គោលដៅ ៖				
២.១.១. គោលបំណង ៖				
២.១.២. គោលបំណង ៖				
៣. ផ្នែកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងការងារសាធារណៈ				
៣.១. គោលដៅ ៖				
៣.១.១. គោលបំណង ៖				
៣.១.២. គោលបំណង ៖				
៤. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមស្ថិតិសាស្ត្រសាធារណៈ				
៤.១. គោលដៅ ៖				
៤.១.១. គោលបំណង ៖				
៤.១.២. គោលបំណង ៖				

ឧទាហរណ៍នៃសូចនាករដែលមានលក្ខណៈពេញលេញ

កត្តាចំណាត់ថ្នាក់សម្រាប់សូចនាករ	ឧទាហរណ៍
១) វត្ត (អ្វី?)	ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
២) អ្នកទទួលបានលទ្ធផល(ដើម្បីអ្នកណា?)	ប្រជាជន ២៥០០នាក់ ក្នុងស្រុក ក
៣) បរិមាណ (ចំនួនប៉ុន្មាន ?)	ទឹក៣០លីត្រ ក្នុងមួយនាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃនៃប្រជាជន ៩០%
៤) គុណភាព (ល្អប៉ុន្មាន?)	ឆ្លើយតបនឹងមាត្រដ្ឋានគុណភាពនៃក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹក
៥) កាលបរិច្ឆេទ (ត្រឹមពេលណា?)	ត្រឹមឆ្នាំ ២០១៤
៦) ទីកន្លែង (នៅកន្លែងណា?)	ស្រុក ក នៃខេត្ត ខ
→ ទឹក ដែលឆ្លើយតបនឹងមាត្រដ្ឋានគុណភាពនៃក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹក ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យ ៩០ % នៃប្រជាជន ២៥០០នាក់ ដែលម្នាក់ៗអាចប្រើប្រាស់ច្រើនបាន ៣០លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ ក្នុង ស្រុក ក នៃខេត្ត ខ ដោយត្រឹមឆ្នាំ ២០១៤។	

វិធីកំណត់សូចនាករ៖ ឧទាហរណ៍ ១ (វិធីវេលាគ្រឹមត្រូវបំផុត)

- ផ្អែកលើចំនួនអ្នកទទួលបានផលផ្ទាល់ពីសកម្មភាព គណនាសូចនាករដែលអាចសម្រេចបានច្រើនបំផុត

ឧទាហរណ៍៖ ការចាក់ថ្នាំបង្ការ

- ចំនួនទារកដែលនឹងទទួលបានការចាក់ថ្នាំបង្ការក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ - ៥.០០០ទារក
- ចំនួនទារកសរុបនាពេលបច្ចុប្បន្ន - ១៥.០០០ទារក
- ភាគរយនៃទារកដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការនាពេលបច្ចុប្បន្ន - ៩.០០០ទារក (៦០%)
- បន្ទាប់ពីគម្រោង - ទារកដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការ - ១៤.០០០ (៩៣%) <- គោលដៅ

4

វិធីកំណត់សូចនាករ៖ ឧទាហរណ៍ ២ (វិធីវេលាគ្រឹមត្រូវបន្ត)

- ផ្អែកលើសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ប៉ាន់ស្មានសូចនាករដែលអាចសម្រេចបានច្រើនបំផុត

ឧទាហរណ៍៖ កែលម្អអត្រាមរណៈភាពមាតាតាមរយៈយុទ្ធនាការបង្កើនចំណេះដឹង

- ពិនិត្យលទ្ធផលនៃសកម្មភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នា៖ សកម្មភាពទំហំ(តំបន់គ្របដណ្តប់) និងទំហំថវិកាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបំផុត
- ការកែលម្អស្ថានភាពកន្លងមកតាមរយៈយុទ្ធនាការតាមវិទ្យុរយៈពេល ៦ខែ -១%
- ការសកម្មភាពរំពឹងទុក៖ យុទ្ធនាការតាមវិទ្យុរយៈពេល ៦ខែ - ១% <- គោលដៅក្នុងការលម្អអត្រាមរណៈភាពមាតា

5

វិធីកំណត់ស្ថិតិសាស្ត្រ៖ ឧទាហរណ៍ ៣ (វិធីវិនិយោគក្នុងមក)

- ផ្អែកលើធាតុចូលកាលពីពេលកន្លងមក ប៉ាន់ស្មានស្ថិតិសាស្ត្រដែលអាចសម្រេចបានច្រើនបំផុត

ឧទាហរណ៍៖ អត្រាចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់សិស្ស
សាលាមធ្យមសិក្សា

- ចំនួនដែលបានវិនិយោគក្នុងមកសម្រាប់រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ – ១០ លានរៀល
- ការកើនឡើងអត្រាចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងមកសម្រាប់រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ – ១០%
- ការវិនិយោគសម្រាប់ប្រាំឆ្នាំខាងមុខ – ២០ លានរៀល
- ប៉ាន់ស្មានការកើនឡើង -២០% <- គោលដៅ

សូមអរគុណ!

ថ្ងៃកម្ចី ១១

លំហាត់៖ ស្រយោគចក្ខុវិស័យ

គ.ជ.អ.ប
NCDD



ផ្នែកទី ១១

លំហាត់៖ ប្រយោគចក្ខុវិស័យ

គម្រោងសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការ
នៅភ្នាក់ងារជំនាញ ខេត្ត (PILAC 2)

គោលបំណង និងមាតិកា

គោលបំណងនៃផ្នែកទី ១១៖

សិក្ខាកាមមានសមត្ថភាពរៀបចំប្រយោគចក្ខុវិស័យ
សម្រាប់ក្រុមខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍

- មាតិកា៖
- ១. បទបង្ហាញ៖ ប្រយោគចក្ខុវិស័យ
 - ២. លំហាត់

តារាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

ចំណុចសំខាន់ៗ :				
គោលដៅ និងគោលបំណង	ស្ថិតភាព			យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍
	ឯកតា	២០០៩	២០១៤	
១ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច				
១.១. គោលដៅ :				
១.១.១. គោលបំណង :				
១.១.២. គោលបំណង :				
១.២. គោលដៅ :				
១.២.១. គោលបំណង :				
១.២.២. គោលបំណង :				
២ ផ្នែកសង្គមកិច្ច				
២.១. គោលដៅ :				
២.១.១. គោលបំណង :				
២.១.២. គោលបំណង :				
៣ ផ្នែកគ្រួសារក្រីក្រ និងប្រជាជនក្រីក្រ បណ្តោះអាសន្ន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ				
៣.១. គោលដៅ :				
៣.១.១. គោលបំណង :				
៣.១.២. គោលបំណង :				
៤ ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម				
៤.១. គោលដៅ :				
៤.១.១. គោលបំណង :				
៤.១.២. គោលបំណង :				

ប្រយោគចក្ខុវិស័យ (១)

- ស្ថានភាពនាពេលអនាគត ដែលរាជធានី ខេត្តចង់សម្រេចបាន ក្នុងអំឡុងពេលអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត បន្ទាប់ពីរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ។

ឧទាហរណ៍៖

ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អាចមានប្រយោគចក្ខុវិស័យមួយដែលអានថា "ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានកែលម្អ"។

ប្រយោគចក្ខុវិស័យ (២)

▪ ជំហានណែនាំនានារួមមាន៖

- ១. រៀបចំសេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ដោយគ្មានចក្ខុវិស័យ
- ២. ពិភាក្សាពីប្រភេទនៃស្ថានភាពនឹងសម្រេចបាន បន្ទាប់ពីសម្រេចបាននូវគោលដៅ និងគោលបំណងទាំងអស់។
- ៣. រៀបចំប្រយោគ
 - ព្យាយាមរៀបរាប់ពីប្រភេទនៃស្ថានភាពដែលនឹងសម្រេចបានក្នុងរាជធានី ខេត្ត ដែលពាក់ព័ន្ធ ដោយប្រយោគមួយឃ្លា
 - ប្រសិនបើមានលទ្ធភាព សូមបន្ថែមមធ្យោបាយ ដើម្បីដឹងពីវិធីសម្រេចបាននូវប្រយោគចក្ខុវិស័យ

4

ប្រយោគចក្ខុវិស័យ (៣)

- ប្រជាជនក្នុងខេត្ត ក ពេញចិត្តនឹងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ដូចជាសេវាសាធារណៈ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។
 - មធ្យោបាយដើម្បីវាស់ពីការសម្រេចបាន នូវប្រយោគចក្ខុវិស័យ គឺកម្រិតពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនក្នុងខេត្ត ក។
 - កាន់តែលម្អិតជាងនេះ កម្រិតពេញចិត្តត្រូវវាស់វែងពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសាធារណៈ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

5

សូមអរគុណ !

ផ្នែកទី ១២

ចំណើន ការ នៃ ការ កសាង

កម្មវិធីវិនិយោគ បីឆ្នាំរំកិល

គ.ជ.អ.ប
NCDD



ផ្នែកទី ១២

ដំណើរការនៃការកសាង កម្មវិធីវិនិយោគ ប៊ីឡាំកិល

គម្រោងសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការ
នៅថ្នាក់កំណត់ ខេត្ត (PILAC 2)

គោលបំណង និងមាតិកា

គោលបំណងនៃផ្នែកទី ១២៖


សិក្ខាកាមនឹងយល់ពីដំណើរការកសាង
កម្មវិធីវិនិយោគ ប៊ីឡាំកិល (CPIP)

មាតិកា៖

- ១. ដំណើរការនៃការកសាង CPIP
- ២. លទ្ធផលក្នុងដំណើរការកសាងនីមួយៗ

ដំណើរការកសាង CPDP និង CPIP

■ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត (CPDP)



■ កម្មវិធីវិនិយោគប្តូរកិច្ចការ រាជធានី ខេត្ត (CPIP)



នីតិវិធីនៃការកសាង៖ ជំហានទី១

ជំហានទី ១៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគប្តូរកិច្ចការរាជធានី ខេត្ត

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគប្តូរកិច្ចការរាជធានី ខេត្ត

ជំហានទី ៣៖ ការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគប្តូរកិច្ចការរាជធានី ខេត្ត

ជំហានទី ១ ៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ CPIP

១-១ ការកំណត់ និងការរៀបចំសំណើគម្រោង



១-២ ការពិនិត្យសំណើគម្រោង



១-៣ ការគណនាអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោង



១-៤ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរបស់រាជធានី ខេត្ត



១-៥ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរាជធានី ខេត្ត

4

ជំហានទី ១៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ CPIP

១-១ ការកំណត់ និងការរៀបចំសំណើគម្រោង

គោលបំណង

ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីសំណើគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ CPIP ដែលមានសង្គតិភាពជាមួយនឹង ក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត

សមាសភាព

- ក្រុមការងារកសាងផែនការ(PWG)
- គណៈអភិបាល (BOG)
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត និងតំណាងគណៈកម្មាធិការពាក់ព័ន្ធនានា
- តំណាងមន្ទីរ អង្គភាពក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល ក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងវិស័យឯកជនប្រចាំនៅរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- អ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតតាមការចាំបាច់

លទ្ធផល

- តារាង១.១ តារាង១.២ក/ខ នៃផ្នែក "ក" /"ខ" គម្រោងគាំទ្រមូលនិធិដោយរាជធានី ខេត្ត ក្រសួង ស្ថាប័ន និងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

5

ជំហានទី ១៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ CPIP

១-២ ការពិនិត្យសំណើគម្រោង

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត (PWG) ត្រូវធ្វើការពិនិត្យសំណើគម្រោងមួយម្តងៗ ដោយពិនិត្យ មើលភាពគ្រប់គ្រាន់ និងច្បាស់លាស់នៃព័ត៌មានក្នុងតារាងសំណើគម្រោង។ បើមានចំណុចណាមួយ មិនច្បាស់លាស់ក្នុងតារាងសំណើគម្រោង PWG អាចសាកសួរទៅរាជធានី ខេត្ត មន្ទីរ អង្គភាពឬទីភ្នាក់ងារដែលស្នើសំណើនេះ ដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់។
- ក្នុងការពិនិត្យ PWG ត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់។ PWG ត្រូវដកចេញសំណើគម្រោងទាំងឡាយណា ដែលពុំសមស្របជាមួយ នឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះ។

ជំហានទី ១៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ CPIP

១-២ ការពិនិត្យសំណើគម្រោង (បន្ត)

- ករណីសំណើគម្រោង មួយចំនួនពុំមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់តួនាទីរបស់រាជធានី ខេត្ត តែមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់តួនាទីរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន។ ករណីនេះ រាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំបញ្ជីដាច់ដោយឡែក សម្រាប់គម្រោងទាំងនេះ ដើម្បីស្នើទៅក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។
- ចំពោះសំណើគម្រោង ដែលពុំមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់តួនាទីរបស់រាជធានី ខេត្ត តែមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់តួនាទីរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។ ករណីនេះ រាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំបញ្ជីដាច់ដោយឡែកសម្រាប់គម្រោងទាំងនេះ ដើម្បីបញ្ជូនទៅក្រុង ស្រុក ខណ្ឌពាក់ព័ន្ធ ពិចារណាបញ្ចូល ក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ខ្លួន។

លក្ខខណ្ឌនៃការពិនិត្យគម្រោង

ស្របតាមក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត	គម្រោង ឬសេវាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី/ខេត្ត តម្រូវការអាទិភាព និងផែនការតាមវិស័យរាជធានី/ខេត្ត
ស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត	គម្រោង ឬសេវាដែលស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត (គម្រោង ឬសេវាទាក់ទងនឹងមុខងារជាកាតព្វកិច្ច ឬមុខងារជាជម្រើសនៃរាជធានី/ខេត្ត)
ស្ថិតក្នុងអន្តររដ្ឋបាលដែនដី	គម្រោង ឬសេវាដែលមានលក្ខណៈអន្តរ ក្រុង ស្រុក និងខណ្ឌ

ជំហានទី ១៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ CPIP

១-៣ ការគណនាអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោង

គោលបំណង

- ដើម្បីធ្វើការវិភាគប្រសិទ្ធភាពតម្លៃសម្រាប់ប្រៀបធៀប និងជ្រើសរើសគម្រោងនានា។
- ដើម្បីគណនាអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោង ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ត្រូវ៖
 - គណនាពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត
 - កំណត់ពិន្ទុបច្ចេកទេស
 - គណនាពិន្ទុអត្ថប្រយោជន៍ និង
 - គណនាអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ

ជំហានទី ១ ៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ CPIP

១-៤ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរបស់រាជធានី ខេត្ត

គោលបំណង

ដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរបស់រាជធានី ខេត្ត

សមាសភាព

- ក្រុមការងារកសាងផែនការ (PWG)

លទ្ធផល

- តារាង ១.៣ សេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរបស់រាជធានី ខេត្ត

ជំហានទី ១ ៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ CPIP

១-៥ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងបញ្ជីគម្រោងអាទិភាព

គោលបំណង

ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់គ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិនិត្យ ពិភាក្សា ផ្តល់មតិយោបល់ និងឯកភាពលើសេចក្តីព្រាងសំណើគម្រោងរបស់រាជធានី ខេត្ត។

សមាសភាព

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត (PWG)
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រី និងកុមាររាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងមន្ទីរ អង្គភាពក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- អ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត តាមការសម្រេចរបស់អភិបាលរាជធានី ខេត្ត

លទ្ធផល

- តារាង ១.៤ បញ្ជីគម្រោងអាទិភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត

ជំហានទី ១ ៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ CPIP

១-៥ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងបញ្ជីគម្រោងអាទិភាព (បន្ត)

ដំណើរការ

• កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរបស់រាជធានី ខេត្ត ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់ អភិបាលរាជធានី ខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត។

• របៀបវារៈ សំខាន់ៗនៃកិច្ចប្រជុំរួមមាន៖

- ការបង្ហាញអំពីក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត និងតារាង១.៣
- ការពិនិត្យ ពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោង និងឯកភាពទៅលើគម្រោងអាទិភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត។ ការពិនិត្យពិភាក្សានេះ ត្រូវផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត និងគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ដោយត្រូវជកចេញនូវគម្រោងណាដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ និងមិនមានលក្ខណៈសមស្របជាមួយនឹង គោលការណ៍ណែនាំ ផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សា។

• បន្ទាប់ពីអង្គប្រជុំពិនិត្យ ពិភាក្សា និងឯកភាពគ្នាចម្បង ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំ បញ្ជីគម្រោងអាទិភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត ដោយប្រើប្រាស់តារាង ១.៤។

ជំហានទី ១ ៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ CPIP

តារាង១.៤ បញ្ជីគម្រោងអាទិភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត


ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចំណុចសម្រេចគោលចំណង	ទីកន្លែងគម្រោង	លទ្ធផលគ្រោង	ស្តីដោយ	រយៈពេលអនុវត្ត	មូលធនទូទៅ		កម្រៃគម្រោង	អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ
							សរុប	ស្រី		
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច										
១.១ កសិកម្ម										
សរុបរង										
១.២.....										
សរុបរង										
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច										
២.១.....										

នីតិវិធីនៃការកសាង៖ ជំហានទី ២

ជំហានទី ១៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់
កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធី
វិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

ជំហានទី ៣៖ ការអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិល
រាជធានី ខេត្ត



នីតិវិធីនៃការកសាង៖ ជំហានទី ២

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

គោលបំណង

រៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP ដើម្បីដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ពិនិត្យ និង
អនុម័ត។ ចំពោះ កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ត្រូវបញ្ចូលនូវគម្រោងនៃ
កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរបស់ខណ្ឌ និងសង្កាត់ទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងដែន
សមត្ថកិច្ចរបស់រាជធានី

លទ្ធផលរំពឹងទុក

- ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចរាជធានី ខេត្ត
- បញ្ជីគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
- មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព
- ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម (បីឆ្នាំ)
- ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីវិនិយោគឆ្នាំទី ១

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិច្ចសន្យា ខេត្ត

២-១ ការរៀបចំខ្លឹមសារស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច



២-២ ការរៀបចំគម្រោងនៃ CPIP



២-៣ ការប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាង CPIP



២-៤ ការរៀបចំសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃ CPIP



២-៥ ការជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត



២-៦ ការរៀបចំបញ្ជីសេចក្តីព្រាង CPIP



២-៧ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់ BOG លើសេចក្តីព្រាង CPIP



២-៨ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់ TFC លើសេចក្តីព្រាង CPIP

16

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-១ ការរៀបចំខ្លឹមសារស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច

PWG ត្រូវរៀបចំសេចក្តីសង្ខេបទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងស្ថានភាព បច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាប្រឈមរបស់រាជធានី ខេត្ត។ សម្រាប់ការរៀបចំកម្មវិធី វិនិយោគបីឆ្នាំកិច្ចសន្យា ១ ការរៀបចំខ្លឹមសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ត្រូវផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគស្ថានភាព សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចនាដំបូងទី ៣ នៃដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត។ សម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ការរៀបចំស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ និងធ្វើសុពលភាព លទ្ធផលនៃការវិភាគស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ដោយផ្អែកលើ ការ ប្រែប្រួលសំខាន់ៗ ដែលកើតមានឡើង បន្ទាប់ពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត ត្រូវបានរៀបចំ។

17

ជំហានទី ២: ការរៀបចំសេចក្តីប្រាង CPIP

២-២ ការរៀបចំគម្រោងនៃ CPIP

គោលបំណង

ការរៀបចំគម្រោងនៃ CPIP

សមាសភាព

- ក្រុមការងារកសាងផែនការ (PWG)

លទ្ធផល

- តារាង ២.១ គម្រោង CPIP
- តារាង ២.២ មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព
- តារាង ២.៣ ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម

ជំហានទី ២: ការរៀបចំសេចក្តីប្រាង CPIP

២-៣ ការប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីប្រាង CPIP

គោលបំណង

ដើម្បីពិនិត្យ ផ្តល់យោបល់ និងឯកភាពលើសេចក្តីប្រាង CPIP

សមាសភាព

- សមាជិកក្រុមការងារកសាងផែនការ(PWG)
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារនៃរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និង
- អ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតតាមការសម្រេចរបស់អភិបាលរាជធានី ខេត្ត

លទ្ធផល

- កែសម្រួលសេចក្តីប្រាង CPIP

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-៣ ការប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាង CPIP (បន្ត)

• ដំណើរការត្រៀមរៀបចំ

PWG ត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការសំខាន់ៗ មួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

- រៀបចំរបៀបវារៈ និងលិខិតអញ្ជើញ
- ការរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងខ្លឹមសារបទបង្ហាញដែលរួមមាន ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច តារាង២.១ តារាង២.២ និងតារាង២.៣
- កិច្ចការផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ។

• ដំណើរការកិច្ចប្រជុំ

កិច្ចប្រជុំ ពិនិត្យសេចក្តីព្រាង CPIP ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអភិបាលរាជធានី ខេត្ត។

របៀបវារៈសំខាន់ៗ សម្រាប់ដំណើរការកិច្ចប្រជុំនេះ រួមមាន៖

- ការបង្ហាញសង្ខេបអំពីខ្លឹមសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
- ការបង្ហាញតារាង២.១ តារាង២.២ និងតារាង២.៣
- ពិនិត្យ ពិភាក្សា ផ្តល់យោបល់ និងឯកភាព

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-៣ ការប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាង CPIP (បន្ត)

• ក្រោយកិច្ចប្រជុំ

បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាង CPIP ក្រុមការងារកសាង ផែនការរាជធានី ខេត្ត ត្រូវ៖

- កែសម្រួលសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគ ដោយផ្អែកតាមការ ឯកភាពរបស់អង្គប្រជុំ
- ត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ចូលរួមសិក្ខាសាលាសមាហរកម្មនៃ កម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

ឧប្រមាណសៀវភៅ CPIP

- សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ CPIP
- អាណាចក្រ
- សេចក្តីផ្តើម
- ផែនទី
- ជំពូកទី១៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
 - ១.១ សេចក្តីសង្ខេបទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
 - ១.២ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាប្រឈម
 - ១.២.១ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
 - ១.២.២ ស្ថានភាពសង្គមកិច្ច
 - ១.២.៣ ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន
 - ១.២.៤ ស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
 - ១.២.៥ ស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
- ជំពូកទី២៖ គម្រោងនៃ CPIP
 - ២.១ គម្រោងវិនិយោគ
 - ២.២ ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម
 - ២.៣ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោង
- ឧបសម្ព័ន្ធនានា

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-៤ ការរៀបចំសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មស្តីពី CPIP

គោលបំណង

- សម្របសម្រួល និងបន្ស៊ីគ្នារវាងគម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ជាមួយនឹងគម្រោង នៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- ពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ជាមួយរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា
- កៀរគរធនធានសម្រាប់គាំទ្រគម្រោងវិនិយោគនានា ដែលលើកឡើងដោយរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- បញ្ចូលនូវគម្រោងនានាដែលលើកដោយក្រុង ខណ្ឌ ស្រុក អង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទៅក្នុង CPIP។

ជំហានទី ២: ការរៀបចំសេចក្តីប្រាម CPIP

២-៤ ការរៀបចំសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មស្តីពី CPIP (បន្ត)

សមាសភាព

- តំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ក្រុមការងារកសាងផែនការ (PWG)
- ប្រធានដឹកនាំមន្ទីរ អង្គភាព និងទីបាត់ការនានាក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងគណៈអភិបាល ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងសមាគមរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និង
- អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

លទ្ធផល

- កែសម្រួលតារាង ២.១ ខ/គ)

ជំហានទី ២: ការរៀបចំសេចក្តីប្រាម CPIP

២-៤ ការរៀបចំសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មស្តីពី CPIP (បន្ត)

• ការត្រៀមរៀបចំ

មុនសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃ CPIP ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាព និង ឯកសារសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

- រៀបចំលិខិតអញ្ជើញ និងរបៀបវារៈ
- តារាងបូកសរុបគម្រោងវិនិយោគពីបណ្តាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- រៀបចំតារាង ២.១ ផ្នែក "គ" នៃសេចក្តីប្រាមកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត
- ឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា។

ជំហានទី ២: ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-៤ ការរៀបចំសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មស្តីពី CPIP (បន្ត)

• ដំណើរការ

របៀបវារៈ: សំខាន់ៗ សម្រាប់ដំណើរការកិច្ចប្រជុំរួមមាន៖

- ការបង្ហាញតារាង ២.១ ផ្នែក "គ" របស់រាជធានី ខេត្ត ដោយតំណាងរាជធានី ខេត្ត
- បង្ហាញតារាងបូកសរុបគម្រោងវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយរាជធានី ខេត្ត
- ការបង្ហាញតារាង ២.១ ផ្នែក "គ" របស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នីមួយៗ
- ពិភាក្សា ផ្តល់ការគាំទ្រ និងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តោះអាសន្ន។

កំណត់សម្គាល់ ៖ ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវខិតខំរៀបចំធនធានពីប្រភពនានា ដើម្បីគាំទ្រដល់ គម្រោងអាទិភាពខ្ពស់ទាំងឡាយដែលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌបានស្នើឡើង និងគម្រោងនានាដែលត្រូវការថវិកា លើសពីថវិកាដែលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌមាន។

ជំហានទី ២: ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-៤ ការរៀបចំសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មស្តីពី CPIP (បន្ត)

• ក្រោយកិច្ចប្រជុំ

សកម្មភាពសំខាន់ៗ ត្រូវអនុវត្តបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៃ CPIP

- ពិនិត្យ និងកែសម្រួលតារាង២.១ ផ្នែក "ខ" និង "គ"
- សម្រេចជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត
- ធ្វើការបូកសរុបគម្រោងកំពុងដំណើរការ និងគម្រោងមានការសន្យាគាំទ្រដោយក្រសួង ស្ថាប័ន និងទីភ្នាក់ងារ ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត (តារាង១.២ខ) ដែលធ្វើមកពីមន្ទីរ អង្គភាព និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនានា។ បញ្ជីគម្រោង នេះ ត្រូវបញ្ចូលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត សម្រាប់ជាព័ត៌មានរួមអំពីគម្រោងវិនិយោគ ទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានី ខេត្ត។
- រៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត។

ជំហានទី ២: ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-៥ ការជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគ រាជធានី ខេត្ត

គោលបំណង

ជ្រើសរើសគម្រោងដែលគាំទ្រមូលនិធិ ដោយថវិកា វិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

សមាសភាព

- ក្រុមការងារកសាងផែនការ (PWG)

លទ្ធផល

- កែសម្រួលតារាង ២.១ គ

ជំហានទី ២: ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-៥ ការជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគរាជ ធានី ខេត្ត (បន្ត)

ដំណើរការ

PWG ត្រូវពិនិត្យ និងសម្រេចជ្រើសរើសគម្រោងវិនិយោគសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ថវិកាជន្លាត ខេត្ត ដោយផ្អែកតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម៖

- ជាដំបូង ត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ មូលនិធិមានភ្ជាប់ លក្ខខណ្ឌមុន ដោយផ្អែកលើអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃខ្ពស់ តាមវិស័យនីមួយៗ (គម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងារកាតព្វកិច្ច)

ជំហានទី ២: ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-៥ ការជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគ រាជធានី ខេត្ត (បន្ត)

• ដំណើរការ

- បន្ទាប់មក ត្រូវជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់មូលនិធិគ្មានភ្ជាប់ លក្ខខណ្ឌ និងមូលនិធិដែលបានមកពីចំណូលមូលដ្ឋាន និងចំណូលផ្សេងទៀត ដោយផ្អែកលើអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃខ្ពស់ និងចំណាត់ថ្នាក់វិស័យអាទិភាពខ្ពស់ (គម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងារជាជម្រើស)
- បន្តជ្រើសរើសគម្រោងតាមលំដាប់ដោយ រហូតដល់អស់មូលនិធិវិនិយោគ ដែលរាជធានី ខេត្តមាន។

ជំហានទី ២: ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-៦ ការរៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាង CPIP គោលបំណង

ដើម្បីបញ្ចប់សេចក្តីព្រាង CPIP

សមាសភាព

ក្រុមការងារកសាងផែនការ (PWG)

លទ្ធផល

- កែសម្រួលតារាង ២.១ ខ/គ
- កែសម្រួលតារាង ២.២
- តារាង ២.៤ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោង វិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-៧ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត លើសេចក្តីព្រាង CPIP

- បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីព្រាង CPIP ពីក្រុមការងារកសាងផែនការគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រាង CPIP មុននឹងដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរាជធានី ខេត្ត និងផ្តល់យោបល់។
- នៅពេលទទួលបានយោបល់ពីគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវធ្វើការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាង CPIP ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមយោបល់របស់គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ។

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-៨ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់ TFC លើសេចក្តីព្រាង CPIP

- បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីព្រាង CPIP ពី គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរាជធានី ខេត្តត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំ របស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រាង CPIP។
- នៅពេលទទួលបានយោបល់ពីគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរាជធានី ខេត្ត គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវណែនាំក្រុមការងារកសាងផែនការ ដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលបញ្ចប់សេចក្តីព្រាង CPIP ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ទៅតាមយោបល់របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរាជធានី ខេត្ត រួចហើយត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ពិនិត្យ និងអនុម័ត។

នីតិវិធីនៃការកសាង៖ ជំហានទី ៣

ជំហានទី ១៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់
កម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត



ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគ
រាជធានី ខេត្ត



ជំហានទី ៣៖ ការអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគ
រាជធានី ខេត្ត

34

នីតិវិធីនៃការកសាង៖ ជំហានទី ៣

ជំហានទី ៣៖ ការអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

គោលបំណង

ដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័តCPIP ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការចូលរួមមតិជា
សាធារណៈ មានតម្លាភាព និងមានទទួលខុសត្រូវរួមគ្នា ក្នុងបរិបទវិមជ្ឈការ និង
វិសហមជ្ឈការ។

សមាសភាព

- សមាជិកក្រុមការងារកសាងផែនការ (PWG)
- គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកសង្កេតការណ៍នានា ចូលរួមតាមការអនុញ្ញាតិពីប្រធាន
ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត។

លទ្ធផល

- កម្មវិធីវិនិយោគប្តីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវបានអនុម័តដោយ
ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

35

ជំហានទី ៣៖ ការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល

៣-១ ការងារត្រៀមសម្រាប់ការប្រជុំអនុម័តសេចក្តីព្រាង CPIP



៣-២ ការងារក្នុងពេលប្រជុំអនុម័ត CPIP



៣-៣ ការងារក្រោយពេលអនុម័ត CPIP

ជំហានទី ៣៖ ការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល

៣-១ ការងារត្រៀមសម្រាប់ការប្រជុំអនុម័តសេចក្តីព្រាង CPIP

គណៈអភិបាលដោយមាននាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានី ខេត្ត និងក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ជាសេនាធិការ ត្រូវចាត់ចែងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងកម្មវិធី ទៅក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត និងរៀបចំសេចក្តីថ្លែងហេតុ ព្រមទាំងត្រៀមរៀបចំឯកសារយោង ឬឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាសម្រាប់បំភ្លឺ ក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត។ សេចក្តីថ្លែងហេតុនេះ ត្រូវបង្ហាញអំពីមូលដ្ឋានគតិយុត្ត ដែលតម្រូវឲ្យមានសម្រាប់ការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគ ទម្រង់របស់កម្មវិធីវិនិយោគ ចំនួនគម្រោង និងថវិកានៃកម្មវិធីវិនិយោគតាមវិស័យ និងតាមឆ្នាំនីមួយៗ ព្រមទាំងក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម។

ជំហានទី ៣៖ ការអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល

៣-២ ការងារក្នុងពេលប្រជុំអនុម័ត CPIP

• ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួន ដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត។ កិច្ចដំណើរការប្រជុំនេះ ត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត។

• របៀបវារៈសំខាន់ៗ នៃកិច្ចប្រជុំនេះ រួមមាន៖

- សេចក្តីថ្លែងហេតុ និងបទបង្ហាញអំពីសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគដោយអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ការពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគ

38

ជំហានទី ៣៖ ការអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល

៣.៣ ការងារក្រោយពេលពេលប្រជុំអនុម័ត CPIP

ក). ការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាង CPIP

គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ធ្វើការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាង CPIP ដោយផ្អែកតាម ការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ហើយដាក់ជូនអភិបាលរាជធានី ខេត្ត នូវសេចក្តីព្រាង CPIP ដែលបានកែសម្រួលនេះ ដើម្បីពិនិត្យ។

ខ). សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ CPIP

បន្ទាប់ពីការអនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលត្រូវរៀបចំសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ CPIP និងដាក់ជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាចុះហត្ថលេខា។

39

ជំហានទី ៣៖ ការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល

៣.៣ ការងារក្រោយពេលពេលប្រជុំអនុម័ត CPIP

គ). ការបោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ CPIP

គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំបោះពុម្ពសៀវភៅ CPIP ធ្វើការបែងចែកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ តម្កល់ទុកនៅសាលារាជធានី ខេត្ត មន្ទីរផែនការរាជធានី ខេត្ត និងធ្វើរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងផែនការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។

ឃ). ការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

បន្ទាប់ពី CPIP ត្រូវបានអនុម័ត ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ត្រូវធ្វើការណែនាំឲ្យគណៈអភិបាល រាជធានី ខេត្ត ចាត់ចែងអនុវត្តកម្មវិធីនេះ ប្រកបដោយតម្លាភាព គណនេយ្យភាព ការចូលរួម និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

នីតិវិធីនៃការជំហានទី ៣៖ ការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគ

៣.៣ ការងារក្រោយពេលពេលប្រជុំអនុម័ត CPIP (បន្ត)

ង)ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្ត CPIP

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃជារៀងរាល់ឆ្នាំ លើការអនុវត្ត CPIP ដោយរាប់ទាំងផ្នែកនៃ CPIP ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យរបស់៖

- ក្រុមប្រឹក្សាប្រភេទរួមគ្នា
- ប្រភេទក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងទៀត
- ក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គការនានារបស់រដ្ឋាភិបាល
- អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា។

ជំហានទី ៣៖ ការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល

៣.៣ ការងារក្រោយពេលពេលប្រជុំអនុម័ត CIIP (បន្ត)

ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តត្រូវចាត់ចែង រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ដោយផ្ដោតលើ ចំណុចសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖

- ការរៀបចំផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
- ការកំណត់ស្ថិតភាពសម្រាប់តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
- ការកំណត់អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
- ការកំណត់វិធីសាស្ត្រតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។
- ការកំណត់អ្នកចូលរួមក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។

42

ជំហានទី ៣៖ ការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល

៣.៣ ការងារក្រោយពេលពេលប្រជុំអនុម័ត CIIP (បន្ត)

• នៅចុងឆ្នាំនីមួយៗ គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំ និងដាក់ជូនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការអនុវត្ត CIIP ទៅក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ពិនិត្យ និងអនុម័ត។ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពី CIIP នេះ ទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

- ខ្លឹមសាររបាយការណ៍នេះរួមមាន៖
 - វឌ្ឍនភាពការងារអនុវត្តក្នុងឆ្នាំកន្លងមក
 - ទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំខាងមុខ
 - សេចក្តីសន្និដ្ឋានរួម

ក្នុងករណីចាំបាច់នៃការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគតាមឆ្នាំនីមួយៗ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត អាចធ្វើការកែតម្រូវគម្រោងថវិកា និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគនេះ ផ្អែកតាមការស្នើសុំកែតម្រូវរបស់គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត។

43

សូមអរគុណ!

44

មេធាវីសម្ព័ន្ធ នៃកម្មវិធីវិនិយោគវិនិយោគ (CPIP)

ជំហានទី២/ ២-១. ការរៀបចំខ្លឹមសារស្តីពី ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
 ផ្អែកនេះ ត្រូវរៀបចំ ដោយផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃ ការវិភាគស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ឬ តារាងទិន្នន័យ សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច។ ក្នុងឆ្នាំទី ១ នៃអាណត្តិ របស់ក្រុមប្រឹក្សា តារាងដូចគ្នា ក្នុង CPDP ត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែ តារាងនេះ ត្រូវធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព នៅឆ្នាំបន្ទាប់។

ផ្នែកពាក់ព័ន្ធនឹង CPDP ត្រូវប្រើប្រាស់ សម្រាប់ឆ្នាំទីមួយ នៃអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សា។ ការវិភាគបន្ថែម ចាំបាច់ត្រូវ ផ្អែកលើ -ទិន្នន័យ សង្គមសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច- ដែលធ្វើបច្ចុប្បន្ន ភាព នៅឆ្នាំបន្ទាប់។

ជំហានទី ២/ ២-៣ ការប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាង CPIP ឯកសារស្តីពី CPIP ដែលទូលំទូលាយ ត្រូវបានធ្វើ សេចក្តីព្រាង មុនជំហានទី ២/ ២-៣

ជំហានទី២៖ គម្រោងនៃ CPIP

- ▶ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ កម្មវិធីវិនិយោគវិនិយោគ
- ▶ អាវុកថា
- ▶ សេចក្តីផ្តើម
- ▶ ផែនទី
- ▶ ជំពូកទី១៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច

១.១ សេចក្តីសង្ខេបទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
 ១.២ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាបឋម
 ១.២.១ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
 ១.២.២ ស្ថានភាពសង្គមកិច្ច
 ១.២.៣ ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងការគ្រប់គ្រង ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន
 ១.២.៤ ស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
 ១.២.៥ ស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល សន្តិសុខនិង សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

ជំហានទី ២/ ២-២ ការរៀបចំគម្រោង CPIP
 ផ្អែកនេះ រៀបចំឡើងផ្នែកតាមតារាង២.១ គម្រោង CPIP

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងរៀបចំ សេចក្តី ណែនាំលម្អិត នៅពេលក្រោយ។

ជំហានទី២/ ២-៦ ការបញ្ចប់សេចក្តីព្រាង CPIP
 ផ្អែកនេះ រៀបចំ ផ្អែកតាមតារាង២.៤ ផែនការសកម្មភាព។ យោងតាម សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេស តារាង២.៤ នេះត្រូវ រៀបចំនៅជំហានទី២/ ២-៦ បន្ទាប់ពី រៀបចំសេចក្តីព្រាង ឯកសារស្តីពី CPIP ដែលទូលំទូលាយនៅជំហាន ទី២/ ២-៣។ ដូចនេះ ផ្អែកនេះអាចបន្ថែម ទៅលើឯកសារស្តីពី CPIP ដែលទូលំទូលាយទី២/ ២-៦។

ផ្នែកទី ១៣

លំហាត់៖

កាស គ ណាតាអំពីអត្ថប្រយោជន៍

របស់ គម្រោង

គ.ជ.អ.ប
NCDD



ផ្នែកទី ១៣

លំហាត់

ការគណនាអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោង

គម្រោងសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុង
ការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការនៅ
ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត (PILAC 2)

គោលបំណង និងមាតិកា

គោលបំណងនៃផ្នែកទី ១៣៖


សិក្ខាកាមនឹងមានសមត្ថភាពគណនា
អត្ថប្រសិទ្ធភាពតម្លៃក្នុង CPIP។

មាតិកា៖ ១.បទបង្ហាញ៖ ការគណនាអំពីអត្ថប្រយោជន៍
របស់គម្រោង

២. លំហាត់

ដំណើរការកសាង CPDP និង CPIP

■ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត (CPDP)



■ កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិល រាជធានី ខេត្ត (CPIP)



ការគណនាតម្លៃ (១)

- ការគណនាតម្លៃ ជាកិច្ចការបឋមដើម្បីវិភាគបន្ថែម ។
- សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេស CPIP បង្ហាញពីគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម៖

១. គណនាតម្លៃសរុបរបស់គម្រោងសម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំជាអតិបរមា
២. តម្លៃសរុបរបស់គម្រោងរួមមាន ១) តម្លៃវិនិយោគ និង ២) តម្លៃប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ

កំណត់សម្គាល់១៖ តម្លៃនៃតម្លៃវិនិយោគអាចអូសបន្លាយក្នុងរយៈពេលច្រើនជាង ១ ឆ្នាំ (ឧទាហរណ៍៖ ការងារសាងសង់ ត្រូវចំណាយពេលច្រើនជាង ១ឆ្នាំ)។

កំណត់សម្គាល់២៖ តម្លៃផ្ទៃកម្មគួរលើកតាមនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាពនានាដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តគម្រោងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ។

ការគណនាតម្លៃ (២)

- ឧទាហរណ៍ តម្លៃវិនិយោគ និងតម្លៃប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ

ប្រភេទតម្លៃ	ឧទាហរណ៍
តម្លៃវិនិយោគ	តម្លៃសាងសង់ និងការជួសជុលសំខាន់ៗនៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
តម្លៃប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ	តម្លៃសម្រាប់ការថែទាំ (ឧទាហរណ៍៖ សម្ភារៈថែរក្សា ដូចជាសម្ភារៈសម្រាប់លាបឆ្នាំងណា) តម្លៃលើផ្នែកបុគ្គលិក (ឧទាហរណ៍ ៖ កម្មករផ្នែកថែរក្សាសម្រាប់ការសាងសង់អាគារ)

- ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ តម្លៃដែលចាំបាច់ចំពោះការថែទាំសម្ភារៈបរិក្ខារនានាសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែង គួរចាត់ទុកជាតម្លៃប្រចាំ ។

4

ការគណនាតម្លៃ (៣)

- ឧទាហរណ៍នៃការគណនាតម្លៃគម្រោង

	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣	សរុប
តម្លៃវិនិយោគ				
តម្លៃប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ				
សរុប				



5

ការគណនាអត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោង

▪ ការគណនាអត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោង ត្រូវ៖

- > គណនាពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត
- > កំណត់ពិន្ទុបច្ចេកទេស
- > គណនាពិន្ទុអត្ថប្រយោជន៍ និង
- > គណនាអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ

6

វិធីសាស្ត្រក្នុងការគណនាពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត

១. ដាក់ពិន្ទុតាមគម្រោងនីមួយៗ៖ គម្រោងដែលមានអាទិភាពខ្ពស់ ទទួលបានពិន្ទុស្មើចំនួនគម្រោងដែលអង្គភាពនីមួយៗបានស្នើ ឡើង ។ ឧទាហរណ៍៖ ស្រុក "ក" ក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានគម្រោង ស្នើឡើងចំនួន 15 ដូចនេះគម្រោងដែលមានអាទិភាពខ្ពស់ជាងគេ ទទួលបាន 15 ពិន្ទុ រីឯគម្រោងមានអាទិភាពបន្ទាប់ទទួលបាន 14 ពិន្ទុ ចំណែកគម្រោងដែលមានអាទិភាពទាបជាងគេទទួលបាន 1 ពិន្ទុ។

7

វិធីសាស្ត្រក្នុងការគណនាពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត(បន្ត)

២. គណនាតម្លៃសន្ទស្សន៍ (ឬមេគុណទម្ងន់) តាមផ្នែកនីមួយៗ ដោយយកចំនួន 100 ចែកនឹងផលបូកពិន្ទុតាមគម្រោងនីមួយៗ ដែលមាននៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗ។
ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើ យើងអាចគណនារកតម្លៃសន្ទស្សន៍ក្នុង ផ្នែកសង្គមកិច្ចស្មើ៖

$$100/(15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1)= 0.83$$

វិធីសាស្ត្រក្នុងការគណនាពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត(បន្ត)

៣. គណនាពិន្ទុទម្ងន់អាទិភាពនៃគម្រោងនីមួយៗដែលមាននៅក្នុង ផ្នែកសង្គមកិច្ច ដោយយកតម្លៃសន្ទស្សន៍ គុណនឹងពិន្ទុអាទិភាព នៃគម្រោងនីមួយៗ។ តាមឧទាហរណ៍ខាងលើ គម្រោងដែល មានអាទិភាពខ្ពស់ជាងគេទទួលបាន $0.83 \times 15 = 12.4$ ពិន្ទុ ចំណែកគម្រោងមានអាទិភាពបន្ទាប់ ទទួលបានពិន្ទុអាទិភាព $0.83 \times 14 = 11.6$ ។

ឧទាហរណ៍ទី ១៖

ល.រ	លេខៈ គម្រោង	ចំនួនអ្នក ទទួលបាន	តម្លៃគម្រោង (លានរៀល)	លំដាប់ អាទិភាព	ពិន្ទុ អាទិភាព	ពិន្ទុទម្ងន់អាទិភាព
ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច						
1	AAAA	100	10.00	1	3	$[100/(3+2+1)] \times 3=50.00$
2	BBBB	150	15.00	2	2	$[100/(3+2+1)] \times 2=33.33$
3	CCCC	50	5.00	3	1	$[100/(3+2+1)] \times 1=16.67$

ល.រ	លេខៈ គម្រោង	ចំនួនអ្នក ទទួលបាន	តម្លៃគម្រោង (លានរៀល)	លំដាប់ អាទិភាព	ពិន្ទុ អាទិភាព	ពិន្ទុទម្ងន់អាទិភាព
ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច						
1	AAAA	100	10.00	1		50.00
2	BBBB	150	15.00	2		33.33
3	CCCC	50	5.00	3		16.67

10

ឧទាហរណ៍ទី ២៖

ល.រ	លេខៈ គម្រោង	ចំនួនអ្នក ទទួលបាន	តម្លៃគម្រោង (លានរៀល)	លំដាប់ អាទិភាព	ពិន្ទុ អាទិភាព	ពិន្ទុទម្ងន់អាទិភាព
ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច						
1	DDDD	100	11.00	1	5	$[100/(5+4+3+2+1)] \times 5= 33.33$
2	BBBB	150	15.00	2	4	$[100/(5+4+3+2+1)] \times 4= 26.67$
3	EEEE	50	8.00	3	3	$[100/(5+4+3+2+1)] \times 3= 20.00$
4	CCCC	80	7.00	4	2	$[100/(5+4+3+2+1)] \times 2= 13.33$
5	AAAA	90	12.00	5	1	$[100/(5+4+3+2+1)] \times 1= 6.67$

ល.រ	លេខៈ គម្រោង	ចំនួនអ្នក ទទួលបាន	តម្លៃគម្រោង (លានរៀល)	លំដាប់ អាទិភាព	ពិន្ទុ អាទិភាព	ពិន្ទុទម្ងន់អាទិភាព
ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច						
1	DDDD	100	11.00	1		33.33
2	BBBB	150	15.00	2		26.67
3	EEEE	50	8.00	3		20.00
4	CCCC	80	7.00	4		13.33
5	AAAA	90	12.00	5		6.67

11

ការគណនាពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត

គម្រោង ស្រុក "ក"					គម្រោងស្រុក "ខ"					គម្រោង មន្ទីរ "គ"							
ល.រ	ឈ្មោះ គម្រោង	ចំនួនអ្នក ទទួលបាន (លាងប៊ូល)	លំដាប់ អាទិភាព	ចំនួនមុខ អាទិភាព	ល.រ	ឈ្មោះ គម្រោង	ចំនួនអ្នក ទទួលបាន (លាងប៊ូល)	លំដាប់ អាទិភាព	ចំនួនមុខ អាទិភាព	ល.រ	ឈ្មោះ គម្រោង	ចំនួនអ្នក ទទួលបាន (លាងប៊ូល)	លំដាប់ អាទិភាព	ចំនួនមុខ អាទិភាព			
ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច					ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច					ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច							
1	AAAA	100	10.00	1	50.00	1	DDDD	100	11.00	1	33.33	1	CCCC	100	20.00	1	40.00
2	BBBB	150	15.00	2	33.33	2	BBBB	150	15.00	2	26.67	2	NNNN	150	15.00	2	30.00
3	CCCC	50	5.00	3	16.67	3	EEEE	50	8.00	3	20.00	3	BBBB	50	6.00	3	20.00
						4	CCCC	80	7.00	4	13.33	4	PPPP	80	1.00	4	10.00
						5	AAAA	90	12.00	5	6.67						

ពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត = $\frac{\text{ផលបូកនៃពិន្ទុមធ្យមអាទិភាពរបស់គម្រោងនីមួយៗ}}{\text{ចំនួនសរុបនៃអង្គការលើ}}$

ល.រ	ឈ្មោះ គម្រោង	ចំនួនអ្នកទទួលបាន			គម្រោងគ្រោង			ចំនួនមុខអាទិភាព			ពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់ ខេត្ត
		ស្រុក ក	ស្រុក ខ	មន្ទីរ គ	ស្រុក ក	ស្រុក ខ	មន្ទីរ គ	ស្រុក ក	ស្រុក ខ	មន្ទីរ គ	
1	AAAA	100	90	-	10	12	-	50.00	6.67	-	18.89
2	BBBB	150	150	50	15	15	6	33.33	26.67	20.00	26.67
3	CCCC	50	80	100	5	7	20	16.67	13.33	40.00	23.33
4	DDDD	-	100	-	-	11	-	33.33	-	-	11.11
5	EEEE	-	50	-	-	8	-	20.00	-	-	6.67
6	NNNN	-	-	150	-	-	15	-	-	30.00	10.00
7	PPPP	-	-	80	-	-	3	-	-	10.00	3.33

12

ការកំណត់ពិន្ទុបច្ចេកទេស

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ដោយមានជំនួយ បច្ចេកទេសពីមន្ទីរ អង្គការពាក់ព័ន្ធ ត្រូវពិនិត្យ និងដាក់ពិន្ទុ បច្ចេកទេសដោយផ្អែកលើភាពជោគជ័យនៃគម្រោង (ខ្ពស់ = ២ មធ្យម = ១ ទាប = ០)។
- ការកំណត់ភាពជោគជ័យនៃគម្រោងត្រូវផ្អែកលើលទ្ធភាពដែល គម្រោងអាចអនុវត្តបានដោយជោគជ័យ និងប្រកបដោយ និរន្តរភាព។ ក្នុងករណីដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការ កំណត់អំពីពិន្ទុបច្ចេកទេសសម្រាប់គម្រោងណាមួយ គម្រោងនោះ គួរទទួលបានពិន្ទុបច្ចេកទេសស្មើនឹង១។

13

ការកំណត់ពិន្ទុបច្ចេកទេស (បន្ត)

ឧទាហរណ៍៖

ល.រ	ឈ្មោះ គម្រោង	ចំនួនអ្នកទទួលបាន			តម្លៃគម្រោង			ពិន្ទុម្យ៉ាងអាទិភាព			ពិន្ទុ បច្ចេកទេស	
		ស្រុក ក	ស្រុក ខ	មន្ទីរ គ	ស្រុក ក	ស្រុក ខ	មន្ទីរ គ	ស្រុក ក	ស្រុក ខ	មន្ទីរ គ		
1	AAAA	100	90	-	10	12	-	50.00	6.67	-	18.89	2
2	BBBB	150	150	50	15	15	6	33.33	26.67	20.00	26.67	1
3	CCCC	50	80	100	5	7	20	16.67	13.33	40.00	23.33	2
4	DDDD	-	100	-	-	11	-	-	33.33	-	11.11	2
5	EEEE	-	50	-	-	8	-	-	20.00	-	6.67	1
6	NNNN	-	-	150	-	-	15	-	-	30.00	10.00	2
7	PPPP	-	-	80	-	-	3	-	-	10.00	3.33	2

ល.រ	ឈ្មោះ គម្រោង	ចំនួនអ្នកទទួលបាន			តម្លៃគម្រោង			ពិន្ទុម្យ៉ាងអាទិភាព			ពិន្ទុ បច្ចេកទេស	
		ស្រុក ក	ស្រុក ខ	មន្ទីរ គ	ស្រុក ក	ស្រុក ខ	មន្ទីរ គ	ស្រុក ក	ស្រុក ខ	មន្ទីរ គ		
1	AAAA	100	90	-	10	12	-	50.00	6.67	-	18.89	2
2	BBBB	150	150	50	15	15	6	33.33	26.67	20.00	26.67	1
3	CCCC	50	80	100	5	7	20	16.67	13.33	40.00	23.33	2
4	DDDD	-	100	-	-	11	-	-	33.33	-	11.11	2
5	EEEE	-	50	-	-	8	-	-	20.00	-	6.67	1
6	NNNN	-	-	150	-	-	15	-	-	30.00	10.00	2
7	PPPP	-	-	80	-	-	3	-	-	10.00	3.33	2

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចំនួនអ្នកទទួលបាន	តម្លៃគម្រោង	ពិន្ទុមធ្យមភ្នាក់ងារ	ពិន្ទុ បច្ចេកទេស
1	AAAA	190	22	18.89	2
2	BBBB	350	36	26.67	1
3	CCCC	230	32	23.33	2
4	DDDD	100	11	11.11	2
5	EEEE	50	8	6.67	1
6	NNNN	150	15	10.00	2
7	PPPP	80	3	3.33	2

ការគណនាពិន្ទុអត្ថប្រយោជន៍

$$\text{ពិន្ទុអត្ថប្រយោជន៍} = \text{ចំនួនអ្នកទទួលបានសរុប} \times \text{ពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត} \times \text{ពិន្ទុបច្ចេកទេស}$$

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចំនួនអ្នកទទួលបាន	តម្លៃគម្រោង	ពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់ ខេត្ត	ពិន្ទុបច្ចេកទេស	ពិន្ទុអត្ថប្រយោជន៍
1	AAAA	190	22	18.89	2	7178.2
2	BBBB	350	36	26.67	1	9334.5
3	CCCC	230	32	23.33	2	10731.8
4	DDDD	100	11	11.11	2	2222.0
5	EEEE	50	8	6.67	1	333.5
6	NNNN	150	15	10	2	3000.0
7	PPPP	80	3	3.33	2	532.8

ការគណនាអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ

$$\text{អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ} = \frac{\text{ពិន្ទុអត្ថប្រយោជន៍គម្រោង}}{\text{តម្លៃគម្រោងសរុប (គិតជាលានរៀល)}}$$

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចំនួនអ្នកទទួលបាន	តម្លៃគម្រោង	ពិន្ទុមធ្យមថ្នាក់ ខេត្ត	ពិន្ទុបច្ចេកទេស	ពិន្ទុអត្ថប្រយោជន៍	អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ
1	AAAA	190	22	18.89	2	7178.2	326.28
2	BBBB	350	36	26.67	1	9334.5	259.29
3	CCCC	230	32	23.33	2	10731.8	335.37
4	DDDD	100	11	11.11	2	2222.0	202.00
5	EEEE	50	8	6.67	1	333.5	41.69
6	NNNN	150	15	10	2	3000.0	200.00
7	PPPP	80	3	3.33	2	532.8	177.60

លំហាត់

- ១) សិក្ខាកាមចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រូវបែកចែកទៅជាបួន (៤) ក្រុម។
- ២) គណនាអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ ដោយផ្អែកលើតារាងនានាដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់អនុវត្តលំហាត់។

18

សូមអរគុណ!

19

ផ្នែកទី១៣ - ឯកសារបែបក្បួន

ក្រុង ភ្នំពេញ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេច គោលបំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផលគ្រោង	រយៈពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន				តម្លៃ គម្រោងសរុប (លានរៀល)	អាទិភាព
						ប្រភេទ	ទីតាំង	សរុប	ស្រី		
១	គម្រោងកែលម្អមន្ទីរពេទ្យបង្អែក	លើកកម្ពស់សេវាទទួលអ្នកជំងឺសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ	ក្រុង ភ្នំពេញ	កែលម្អសេវាគ្រួសារសម្រាប់ជំងឺសម្រាកអ្នកជំងឺ ១០០គ្រែ	៣ ខែ	ប្រជាជន ក្នុងខេត្ត	១០០០ /ឆ្នាំ	៥០០ /ឆ្នាំ	២០	៣	
២	គម្រោងកែលម្អផ្លូវថ្នល់	កែលម្អប្រព័ន្ធមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ	ក្រុង ភ្នំពេញ	ផ្លូវលំ ១០គីឡូម៉ែត	២ ឆ្នាំ	ប្រជាជន	៥០០.០០០ /ឆ្នាំ	៤៥០.០០០ /ឆ្នាំ	១០០	២	
៣	គម្រោងសាងសង់សាលាវិទ្យាល័យ	កែលម្អចំណុះសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនឲ្យប្រសើរឡើង	ក្រុង ភ្នំពេញ	កសាងអាគារដែលមាន ៣ បន្ទប់រៀន	៦ ខែ	សិស្ស	២៤០/ឆ្នាំ	១២០/ឆ្នាំ	៤០	៤	
៤	ការបណ្តុះបណ្តាលវដ្តបាលសាធារណៈសម្រាប់មន្ត្រីខេត្តស្រុក	ពង្រឹងជំនាញនិងចំណេះដឹង	ក្រុង ភ្នំពេញ	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីខេត្តនិងស្រុក	៥ ថ្ងៃ	មន្ត្រីខេត្ត/ ក្រុង/ ស្រុក	១០០	២០	៨	១	
៥	គម្រោងកែលម្អផ្សារ	កែលម្អផ្សារ	ក្រុង ភ្នំពេញ	ជួសជុលដំបូលផ្សារ	៦ ខែ	១)អ្នកលក់រាយ ២)ប្រជាជន	១)៥០ ២) ១០០.០០០ /ឆ្នាំ	១)៤០ ២)១០០.០០០ /ឆ្នាំ	៥០	៥	
សរុប											
គម្រោង	ល.រ ១	ល.រ ២	ល.រ ៣	ល.រ ៤	ល.រ ៥						
ពិន្ទុបច្ចេកទេស	២	១	១	០	១						

ត្រួតពិនិត្យ ១

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេចគោលបំណង	ទីតាំងគម្រោង	លទ្ធផលគម្រោង	រយៈពេលអនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន			កម្រៃ (លានរៀល)	អាទិភាព	
						ប្រភេទ	ទីតាំង	សរុប			ស្ត្រី
១	គម្រោងសាងសង់មណ្ឌលសុខភាព	កែលម្អសេវាសុខភាព	ស្រុក ខ	សាងសង់មណ្ឌលសុខភាព	៦ ខែ	ប្រជាជន	ស្រុកខ/យ	៩០០ /ឆ្នាំ	៦០០ /ឆ្នាំ	៦០	៣
២	គម្រោងសាងសង់ផ្លូវ	កែលម្អប្រព័ន្ធមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ	ស្រុក ខ/គ	សាងសង់ផ្លូវប្រវែង ២គ.ម	១ ឆ្នាំ	ប្រជាជន	ស្រុក ខ/គ	៣០០.០០០ /ឆ្នាំ	១៥០.០០០ /ឆ្នាំ	៥០	៤
៣	គម្រោងសាងសង់អាគារអនុវិទ្យាល័យ	កែលម្អចំណុះសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនឲ្យប្រសើរឡើង	ស្រុក ខ	សាងសង់បន្ទប់រៀនចំនួន៣	៦ ខែ	សិស្ស	ទូទាំងខេត្ត	២៥០ /ឆ្នាំ	១២០ /ឆ្នាំ	៤០	២
៤	ការបណ្តុះបណ្តាលរដ្ឋបាលសាធារណៈសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង/ស្រុក/ឃុំ	ពង្រឹងជំនាញនិងចំណេះដឹង	ក្រុង ក	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង/ស្រុក/ឃុំ	៣ ថ្ងៃ	ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង/ស្រុក/ឃុំ	ទូទាំងខេត្ត	១០០	២០	៤	១
សរុប											
គម្រោង		ល.រ ១	ល.រ ២	ល.រ ៣	ល.រ ៤						
ពិន្ទុបច្ចេកទេស		២	០	១	២						

ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេច គោលបំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផលគ្រោង	រយៈពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន				តម្លៃ គម្រោងសរុប (លានរៀល)	អាទិភាព
						ប្រភេទ	ទីតាំង	សរុប	ស្រី		
១	គម្រោងកែលម្អ មណ្ឌលសុខភាព	លើកកម្ពស់សេវា សុខភាព	ស្រុក គ	កែលម្អអាគារ មណ្ឌលសុខភាព	៣ ខែ	ប្រជាជន	ស្រុក គ/យ	៩០០/ឆ្នាំ	៦០០/ឆ្នាំ	២០	១
២	គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ ទឹកស្អាត	ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដល់ ប្រជាជន	ស្រុក គ	ដឹកអណ្តូង និង បំពាក់ស្នប់ដៃ ២០ កន្លែង	១ ឆ្នាំ	ប្រជាជន	ស្រុក ខ/គ/យ	៤០០	២០០	៥	២
សរុប											

គម្រោង	ល.រ ១	ល.រ ២
ពិន្ទុបច្ចេកទេស	១	១

ត្រួតពិនិត្យ និង ត្រួតពិនិត្យ ១

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេច គោលបំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផលគ្រោង	រយៈពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន			តម្លៃ គម្រោងសរុប (លានរៀល)	ភាពទំនាប
						ប្រភេទ	ទីតាំង	សរុប		
១	គម្រោងសាងសង់ ស្ពាន	កែលម្អប្រព័ន្ធ មធ្យោបាយធ្វើ ដំណើរ	ស្រុក យ សាងសង់ស្ពានថ្មី ភាគីទន្លេ ច	៦ ខែ	ប្រជាជន	ស្រុក គ/យ	៣០.០០០/ ឆ្នាំ	១៥.០០០ /ឆ្នាំ	៤០	៣
២	គម្រោងកែលម្អផ្លូវ	កែលម្អប្រព័ន្ធ មធ្យោបាយធ្វើ ដំណើរ	ស្រុក យ ផ្លូវលំ ប្រវែង ១គ.ម	១ ឆ្នាំ	ប្រជាជន	ស្រុក ខ/គ/យ	៣០.០០០ /ឆ្នាំ	១៥.០០០ /ឆ្នាំ	២០	២
៣	គម្រោងសាងសង់ អាគារអនុវិទ្យាល័យ	កែលម្អចំណុះសិស្ស ក្នុងថ្នាក់រៀន ឱ្យប្រសើរឡើង	ស្រុក យ សាងសង់បន្ទប់រៀន ចំនួន ២	៦ ខែ	សិស្ស	ស្រុក គ/យ	១៦០ /ឆ្នាំ	៨០ /ឆ្នាំ	៣០	៤
៤	គម្រោងសាងសង់ ផ្សារ	សាងសង់ផ្សារ	ស្រុក យ សាងសង់ផ្សារដែល មានទំហំ៤០០ ម៉ែត្រការ៉េ	២ ខែ	១)អ្នកលក់រាយ ២) ប្រជាជន	១) ស្រុក យ ២) ទូទាំង ប្រទេស	១) ២០ ២) ១.៩០០ /ឆ្នាំ	១) ២០ ២) ១.៩០០ /ឆ្នាំ	១០	១
សរុប										
គម្រោង	ល.រ ១	ល.រ ២	ល.រ ៣	ល.រ ៤						
ពិន្ទុបច្ចេកទេស	០	១	១	២						

ផ្នែកទី ១៤

លំហាត់៖ បំពេញតារាង

ផ្សេងៗគ្នា ក្នុង CPIP

ផ្នែកទី ១៤

លំហាត់៖ បំពេញតារាង ផ្សេងៗគ្នា ក្នុង CPIP

គម្រោងសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការនៅ
ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត (PILAC2)

គោលបំណង និងមាតិកា

គោលបំណងនៃផ្នែកទី ១៤៖


សិក្ខាកាមមានសមត្ថភាពបំពេញតារាងផ្សេងៗគ្នា
ក្នុង CPIP

មាតិកា៖

១. បទបង្ហាញ៖ វិធីបំពេញតារាងនានាក្នុង CPIP
២. លំហាត់

ដំណើរការកសាង CPDP និង CPIP

- ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត (CPDP)

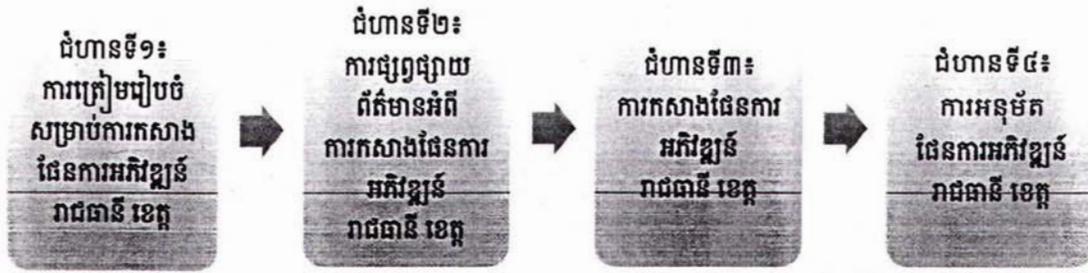

- កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិល រាជធានី ខេត្ត (CPIP)



ជំហានទី ១៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ CPIP

១-១ ការកំណត់ និងការរៀបចំសំណើគម្រោងគោលបំណង

ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីសំណើគម្រោងអាទិភាពសមាសភាព

- ក្រុមការងារកសាងផែនការ(PWG)
- គណៈអភិបាល (BOG)
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត និងតំណាងគណៈកម្មាធិការពាក់ព័ន្ធនានា
- តំណាងមន្ទីរ អង្គភាពក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល ក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងវិស័យឯកជនប្រចាំនៅរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- អ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតតាមការចាំបាច់

លទ្ធផល

- តារាង១.១ តារាង១.២ក/ខ នៃផ្នែក "ក" /"ខ" គម្រោងគាំទ្រមូលនិធិដោយរាជធានី ខេត្ត ក្រសួង ស្ថាប័ន និងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

តារាង១.១ សំណើគម្រោង (១)

តារាង១.១៖ សំណើគម្រោង

មន្ទីរ អង្គភាព ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ.....ឆ្នាំ.....

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចូលរួមសម្រេចគោលបំណង	ទីតាំងគម្រោង	លទ្ធផលគម្រោង	រយៈពេលអនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន				តម្លៃគម្រោងសរុប (គិតជាលានរៀល)	អាទិភាព
						ប្រភេទ	ទីតាំង	សរុប	ស្រី		
សរុប											

តារាង១.១ សំណើគម្រោង (២)

រាយនាម	បរិយាយ
ឈ្មោះគម្រោង	ឈ្មោះរបស់គម្រោងនីមួយៗ
ចូលរួមសម្រេចគោលបំណង	ត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងដែលមាននៅក្នុង តារាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត ដោយស្រង់យកលេខនៃគោលបំណង នោះ
ទីតាំងគម្រោង	កន្លែងដែលសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គម្រោងត្រូវអនុវត្ត

តារាង១.១ សំណើគម្រោង (៣)

រាយនាម	បរិយាយ
លទ្ធផលគ្រោង	<p>[ឧទាហរណ៍]</p> <p>១. គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៖ ការសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ មានប្រវែង ១គីឡូម៉ែត្រ ដើម្បីអាចគ្របដណ្តប់ផ្ទៃដី ៥០ហិកតា</p> <p>២. គម្រោងសាងសង់សាលារៀន៖ សាងសង់សាលាចំនួនបីដែលអាចទទួលសិស្សបានចំនួន៣០០នាក់ នៅភូមិធានី ខេត្ត</p> <p>៣. គម្រោងចាក់ថ្នាំបង្ការរោគសម្រាប់កុមារ៖ ផ្តល់ការចាក់ថ្នាំការពាររោគកញ្ជ្រើលដល់កុមារអាយុក្រោម៥ឆ្នាំ បានចំនួន៧០០នាក់ នៅខេត្ត</p>
រយៈពេលអនុវត្ត	រយៈពេលអនុវត្តគម្រោង
អ្នកទទួលបាន	[ឧទាហរណ៍]
-ប្រភេទ	- ការសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៖ ប្រភេទ/កសិករ ទីតាំង/ស្រុក ក និង
-ទីតាំង	ស្រុក ខ សរុប/កសិករចំនួន១២០០ ស្រ្តី/ចំនួន៥០០នាក់
-សរុប	- ការសាងសង់សាលារៀន៖ ប្រភេទ/កូនសិស្ស ទីតាំង/ស្រុក ក ខ គ
-ស្ត្រី	សរុប/កូនសិស្សចំនួន១០០០ នាក់ ស្ត្រី/ចំនួន៥០០នាក់

តារាង១.១ សំណើគម្រោង (៤)

រាយនាម	បរិយាយ
អាទិភាព	<p>ឧទាហរណ៍៖</p> <p>នៅពេលដែលសាលាស្រុក លើកសំណើគម្រោង</p> <p>ចំនួនប្រាំ គម្រោងអាទិភាពទី១ ត្រូវឲ្យលេខ១ និង</p> <p>គម្រោងអាទិភាពទី៥ ត្រូវឲ្យលេខ៥។</p>

**តារាង ១.២ គម្រោងវិនិយោគ (កំពុងដំណើរការ/ដែលមាន
ការសន្យាគាំទ្រ) (១)**

រាយនាម	បរិយាយ
ឈ្មោះគម្រោង	ឈ្មោះរបស់គម្រោងនីមួយៗ
ចូលរួមសម្រេច គោលបំណង	ត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងដែលមាននៅក្នុង តារាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត ដោយស្រង់ យកលេខនៃគោលបំណងនោះ
ទីតាំងគម្រោង	កន្លែងដែលសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គម្រោងត្រូវអនុវត្ត

**តារាង ១.២ គម្រោងវិនិយោគ (កំពុងដំណើរការ/ដែលមាន
ការសន្យាគាំទ្រ) (២)**

រាយនាម	បរិយាយ
លទ្ធផលគ្រោង	[ឧទាហរណ៍] ១. គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៖ ការសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមាន ប្រវែង ១គីឡូម៉ែត្រ ដែលអាចគ្របដណ្តប់ផ្ទៃដី ៥០ហិកតា ២. គម្រោងសាងសង់សាលាច្រៀង៖ សាងសង់សាលាចំនួនបីដែលអាចទទួល សិស្សបានចំនួន៣០០នាក់ នៅរាជធានី ខេត្ត ៣. គម្រោងចាក់ថ្នាំបង្ការរោគសម្រាប់តូមារ៖ ផ្តល់ការចាក់ថ្នាំការពារធាតុ កញ្ជ្រើលដល់តូមារអាយុក្រោម៥ឆ្នាំ បានចំនួន៧០០នាក់ នៅរាជធានី ខេត្ត
ប្រភពថវិកា	ឈ្មោះស្ថាប័ន ឬកម្មវិធីដែលផ្តល់មូលនិធិគាំទ្រ [ឧទាហរណ៍] - ថវិកាវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត (រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា) - មូលនិធិគាំទ្រដែលបានមកពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
អនុវត្តដោយ	ឈ្មោះស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវចម្រុងក្នុងការអនុវត្ត
រយៈពេលអនុវត្ត	រយៈពេលអនុវត្តគម្រោង

**តារាង ១.២ គម្រោងវិនិយោគ(អំពូលដំណើរការ/ដែលមាន
ការសន្យាគាំទ្រ)(៣)**

រាយនាម	បរិយាយ
អ្នកទទួលផល - សរុប - ស្ត្រី	ចំនួនអ្នកដែលទទួលផលដោយផ្ទាល់ពីគម្រោង [ឧទាហរណ៍] - ការសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៖ កសិករធ្វើស្រែចំនួន ៥០០នាក់ នៅក្នុងសង្កាត់ ក - ការសាងសង់សាលារៀន៖ កូនសិស្សប្រហែលជា ១០០០ នាក់ រៀនក្នុងសាលាទាំងបី - ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគសម្រាប់កុមារ៖ កុមារអាយុក្រោម ៥ ឆ្នាំ ចំនួន៧០០នាក់ ក្នុងរាជធានី ខេត្ត
កម្រិតទុនវិនិយោគ	ចំណាយសរុបប្រចាំឆ្នាំ រួមទាំងចំណាយវិនិយោគ និង ចំណាយប្រតិបត្តិការ

10

ជំហានទី ១ ៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ CPIP

- ១-៤ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរបស់រាជធានី ខេត្ត
 - បន្ទាប់ពីគណនាអត្ថប្រយោជន៍គម្រោង និងអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃគម្រោង PWG ត្រូវធ្វើការបូកសរុបសេចក្តីព្រាងបញ្ជីគម្រោងថ្មី ជាមួយនឹងគម្រោង CPIP នៅក្នុងឆ្នាំទី២ និងឆ្នាំទី ៣ (កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល កន្លងមក) រួមទាំងព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងទាំងនេះ។
 - បន្ទាប់មក PWG ត្រូវរៀបចំសេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរួមមួយ ដែលបញ្ចូលនូវសំណើគម្រោងថ្មី ជាមួយនឹងគម្រោងក្នុងឆ្នាំទី ២ និងឆ្នាំទី ៣ នៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ក្នុងឆ្នាំកន្លងមកតាមលំដាប់នៃអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃពីខ្ពស់មកទាប ទៅតាមវិស័យក្នុងផ្នែកនីមួយៗ នៅក្នុងតារាង១.៣។

11

ជំហានទី ១ ៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ CPIP

តារាង១.៣៖ សេចក្តីព្រាងបញ្ជីសំណើគម្រោងរបស់រាជធានី ខេត្ត

ល.រ	ឈ្មោះ គម្រោង	តួលេខសម្រេច គោលបំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផល គ្រោង	ស្នើ ដោយ	រយៈពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន		តម្លៃ គម្រោង	អ្នក ប្រសិទ្ធ ភាពតម្លៃ	
							សរុប	ស្រី			
១.ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច											
១.១ កសិកម្ម											
សរុបរង											
១.២.....											
សរុបរង											
២.ផ្នែកសង្គមកិច្ច											
២.១.....											

12

ជំហានទី ១ ៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ CPIP

១-៥ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងបញ្ជីគម្រោងអាទិភាព

គោលបំណង

ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់គ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិនិត្យ
ពិភាក្សា ផ្តល់មតិយោបល់ និងឯកភាពលើសេចក្តីព្រាង
សំណើគម្រោងរបស់រាជធានី ខេត្ត។

ជំហានទី ១ ៖ ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ CPIP

១-៥ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងបញ្ជីគម្រោងអាទិភាព (បន្ត)

សមាសភាព

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត (PWG)
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រី និងកុមាររាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងមន្ទីរ អង្គភាពក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- អ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត តាមការសម្រេចរបស់អភិបាលរាជធានី ខេត្ត

លទ្ធផល

- តារាង ១.៤ បញ្ជីគម្រោងអាទិភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត

14

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-២ ការរៀបចំគម្រោងនៃ CPIP

គោលបំណង

ការរៀបចំគម្រោងនៃ CPIP

សមាសភាព

- ក្រុមការងារកសាងផែនការ (PWG)

លទ្ធផល

- តារាង ២.១ គម្រោង CPIP
- តារាង ២.២ មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព
- តារាង ២.៣ ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម

15

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំ CPIP

១). ការបំពេញតារាង២.១ ផ្នែក "ក" "ខ" និង "គ"

ល.រ	ឈ្មោះ គម្រោង	ចូលរួម សម្រេច គោល បំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធ ផល គ្រោង	ប្រភព ថវិកា	អនុវត្ត ដោយ	រយៈ ពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនវិនិយោគ			
								សរុប	ស្រី	២០១០	២០១១	២០១២	សរុប
១.ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច													
១.១ កសិកម្ម													
សរុបរង													
១.២.....													
សរុបរង													
២.ផ្នែកសង្គមកិច្ច													
២.១.....													

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំ CPIP

១). ការបំពេញតារាង២.១ ផ្នែក "ក" "ខ" និង "គ" (បន្ត)

ល.រ	ឈ្មោះ គម្រោង	ចូលរួម សម្រេច គោល បំណង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធ ផល គ្រោង	ប្រភព ថវិកា	អនុវត្ត ដោយ	រយៈ ពេល អនុវត្ត	អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនវិនិយោគ			
								សរុប	ស្រី	២០១១	២០១២	២០១៣	សរុប
១.ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច													
១.១ កសិកម្ម													
សរុបរង													
១.២.....													
សរុបរង													
២.ផ្នែកសង្គមកិច្ច													
២.១.....													

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំ CPIP

- ក្រុមការងារកសាងផែនការ ដោយសហការជាមួយមន្ទីរ និង អង្គភាពជំនាញ ត្រូវជ្រើសរើសគម្រោងតាមវិស័យនីមួយៗ ដោយផ្អែកតាមអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ សម្រាប់ប្រើប្រាស់មូលនិធិមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌ។
- ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវជ្រើសរើសគម្រោងដែលនៅសល់សម្រាប់ប្រើប្រាស់មូលនិធិគ្មានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌ និងមូលនិធិផ្សេងៗទៀត (ចំណូលមូលដ្ឋាន និងចំណូលផ្សេងទៀត) ដោយផ្អែកតែទៅលើ
 ១. អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃនៃគម្រោងទាំងនោះ(ដោយមិនគិតពីវិស័យអាទិភាព) ឬដោយផ្អែកទៅលើ
 ២. អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ និង វិស័យអាទិភាព ដូចខាងក្រោម៖

20

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំ CPIP

២. អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ និង វិស័យអាទិភាព

២.១. ការជ្រើសរើសគម្រោងដោយផ្អែកតែលើអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ ៖ ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវរៀបចំគម្រោងទៅតាមឆ្នាំនីមួយៗឱ្យបានសមស្រប ដោយយកគម្រោងមានអត្រាប្រសិទ្ធភាព តម្លៃខ្ពស់បញ្ចូលក្នុងឆ្នាំទី១ គម្រោងមានអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃមធ្យមបញ្ចូលក្នុងឆ្នាំទី២ និងគម្រោងមានអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃទាបបញ្ចូលក្នុងឆ្នាំទី៣។ ការជ្រើសរើសយកគម្រោងនានាសម្រាប់អនុវត្ត ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗតាមវិធីសាស្ត្រនេះ ត្រូវធ្វើការប្តឹងថ្លែងជាមួយនឹងទំហំថវិកាសរុបតាមបណ្តាឆ្នាំនីមួយៗ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម។ ក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ “ខ្ពស់ មធ្យម ទាប” ត្រូវយកចំនួនគម្រោងសរុបចែកនឹងបី។ ផលចែក គឺជាចំនួនគម្រោងនៃចំណាត់ថ្នាក់នីមួយៗ។

21

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំ CPIP

២. អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ និង វិស័យអាទិភាព (បន្ត)

- ២.២. ការជ្រើសរើសគម្រោងដោយផ្អែកលើអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ និងវិស័យអាទិភាព ផង ៖ ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវរៀបចំគម្រោងទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃចំណាត់ថ្នាក់អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃពីខ្ពស់មកទាបក្នុងវិស័យនីមួយៗ។ បន្ទាប់មក ត្រូវរៀបចំគម្រោងតាមវិស័យអាទិភាព ដូច ដែលបានកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានី ខេត្ត ជា "ខ្ពស់ មធ្យម ទាប" ដោយ ៖
- ជ្រើសរើសយកគម្រោងទាំងឡាយណា ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃខ្ពស់ និង មានវិស័យអាទិភាពខ្ពស់សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគឆ្នាំទី១
 - ជ្រើសរើសយកគម្រោងទាំងឡាយណា ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ ខ្ពស់ ហើយ មានវិស័យអាទិភាពមធ្យម និងគម្រោងទាំងឡាយណាដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អត្រាប្រសិទ្ធភាព តម្លៃមធ្យមហើយមានវិស័យអាទិភាពខ្ពស់សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគឆ្នាំទី២ និង
 - ជ្រើសរើសយកគម្រោងដែលនៅសល់សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគឆ្នាំទី៣។

22

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំ CPIP

២. អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ និង វិស័យអាទិភាព (បន្ត)

២.៣. បន្ទាប់ពីតារាង២.១ ត្រូវបានរៀបចំ PWG ត្រូវធ្វើផ្នែក "គ" នៃតារាង២.១នេះ (គម្រោងវិនិយោគអាទិភាពដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ) ជូនPWG ដើម្បីធ្វើការបូកសរុប និងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្ម CPIP។ ជាមួយគ្នានេះដែរ PWG ក៏ត្រូវរៀបចំ សម្រាប់ការចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនេះ។

បញ្ជាក់បន្ថែម ៖

ក្នុងករណីតម្លៃសរុបនៃគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល មិនមានសង្គតិភាពជាមួយក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម អង្គប្រជុំត្រូវពិចារណាដូចខាងក្រោម ៖

- កាត់បន្ថយចំនួនលទ្ធផលគម្រោង ឬ
- កាត់បន្ថយចំនួនគម្រោងដែលមានអត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃទាបជាងគេ ឬ
- កាត់បន្ថយចំនួនគម្រោងក្នុងវិស័យ ដែលមានអាទិភាពទាប (ផ្អែកតាមគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោល នយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សា)។

23

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំ CPIP

២). ការបំពេញតារាង២.២៖ មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព
 បន្ទាប់ពីការរៀបចំគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត PWG ត្រូវ
 ស្រង់គម្រោងវិនិយោគនានាក្នុងផ្នែក "ក" និងផ្នែក "ខ" នៃតារាង២.១
 បញ្ចូលទៅក្នុងតារាង២.២ "មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព" ដោយដាក់តាម
 ប្រភពមូលនិធិគាំទ្រ។

ល.រ	ប្រភពមូលនិធិ	ចំនួនថវិកា	ចំនួន គម្រោង	អង្គភាព ឬទីភ្នាក់ងារ		
				ភ្នាក់ងារ	ចំនួនគម្រោង	តម្លៃ
១	ស្ថាប័ន ក	១០០	៥	ភ្នាក់ងារ ក ភ្នាក់ងារ ខ ភ្នាក់ងារ គ	១ ១ ៣	២០ ២០ ៦០
សរុប				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំ CPIP

៣). ការបំពេញតារាង២.៣

ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ដោយមានជំនួយពីទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ
 សាលារាជធានី ខេត្ត និងមន្ទីរ សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវសហការជាមួយមន្ទីរ
 អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីប្រមូលតួលេខថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំទី១ ព្យាករណ៍សម្រាប់
 ឆ្នាំទី២ ឆ្នាំទី៣ និងរៀបចំក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម(បីឆ្នាំ)។ ការរៀបចំ
 ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេល មធ្យម ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ "តុល្យភាព
 រវាងចំណូល និងចំណាយក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធនីមួយៗ"។ នីតិវិធីលម្អិត និងទម្រង់
 សម្រាប់រៀបចំក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យមនេះ នឹងមានការណែនាំ
 ជាក្រោយ។

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-៦ ការរៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាង CPIP

គោលបំណង

ដើម្បីបញ្ចប់សេចក្តីព្រាង CPIP

សមាសភាព

- ក្រុមការងារកសាងផែនការ (PWG)

លទ្ធផល

- កែសម្រួលតារាង ២.១ ខ/គ
- កែសម្រួលតារាង ២.២
- តារាង ២.៤ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

26

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-៦ ការរៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាង CPIP (បន្ត)

បន្ទាប់ពីសម្រេចប្រើប្រាស់មូលនិធិវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ត្រូវពិនិត្យ កែសម្រួល និងរៀបចំ ៖

- តារាង២.១ ៖ គម្រោងវិនិយោគប្តីភ្នំកំលរាជធានី ខេត្ត (ផ្នែក "ខ" និង "គ")
- តារាង២.២ ៖ គម្រោងគាំទ្រតាមប្រភពមូលនិធិ
- ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្តឆ្នាំទី១ ដោយប្រើប្រាស់តារាង២.៤។ ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពនេះ ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវសហការជាមួយភ្នាក់ងារអនុវត្តពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

27

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-៦ ការរៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាង CPIP (បន្ត)

តារាង២.៤៖ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគ
រាជធានី ខេត្ត ឆ្នាំទី១

ល.រ	ឈ្មោះ គម្រោង	ទីតាំង គម្រោង	លទ្ធផលគ្រោង		តម្លៃ គម្រោង	ប្រភព ថវិកា	អនុវត្ត ដោយ	កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត		អ្នកទទួលបាន	
			ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី

បន្ទាប់ពីកែសម្រួល និងរៀបចំតារាងនានាខាងលើរួចហើយ ក្រុមការងារកសាង
ផែនការត្រូវរៀបចំបញ្ចប់ សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីដាក់
ជូនគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្តពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ មុន ដាក់ជូនក្រុម
ប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ពិនិត្យ និងអនុម័ត។

ជំហានទី ២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាង CPIP

២-៦ ការរៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាង CPIP (បន្ត)

ចំពោះរាជធានី ក្រុមការងារផែនការ ត្រូវដាក់បញ្ចូលផងដែរនូវគម្រោងវិនិយោគ
បីឆ្នាំរំកិលរបស់ខណ្ឌ និង គម្រោងវិនិយោគរបស់សង្កាត់ទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅ
ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រាជធានី ទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគ បីឆ្នាំរំកិល
រាជធានី។ ដូចនេះ អភិបាលរាជធានី ត្រូវស្នើឱ្យអភិបាលខណ្ឌធ្វើតារាង២.១
“គម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ខណ្ឌ” និងចៅសង្កាត់រៀបចំ និងធ្វើគម្រោង
វិនិយោគរបស់សង្កាត់ (គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការដែលប្រើប្រាស់ ថវិកា
សង្កាត់ គម្រោងវិនិយោគមានការសន្យាគាំទ្រដែលប្រើប្រាស់ថវិកាសង្កាត់ និង
គម្រោងវិនិយោគដែលមិនទាន់មាន ការសន្យាគាំទ្រ) តាមតារាងដូចខាងក្រោម
បន្ទាប់ពីកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ខ្លួនត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សា។

តារាង២.៤ ផែនការសកម្មភាព

ល.រ	ទីតាំងគម្រោង	ឈ្មោះគម្រោង	លទ្ធផលគ្រោងទុក		ប្រភពថវិកា
			ឯកតា	ចំនួន	
១	ស្រុក ក	គម្រោងសាងសង់សាលាបឋមសិក្សា	អាគារ ក	២០	ថវិការិនិយោគរាជធានី ខេត្ត
			អាគារ ខ	៣៥	

ល.រ	អនុវត្តដោយ	កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត		អ្នកទទួលបាន	
		ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី
១	ឃុំ ខ	កក្កដា ២០១២	សីហា ២០១២	៥០០	២៥០
	ឃុំ គ	សីហា ២០១២	តុលា ២០១០	៧៥០	២៧៥

30

លំហាត់

- ១) សិក្ខាកាមចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រូវបែងចែកទៅជាបួន (៤) ក្រុម។
- ២) រៀបចំតារាង ១.៣ និង ១.៤ ដោយប្រើប្រាស់តារាងនានាដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់អនុវត្តលំហាត់។
- ៣) រៀបចំតារាង ២.១ ផ្នែក គ)

កំណត់សម្គាល់៖ ភាពខុសគ្នារវាងតារាង ១.៣ និងតារាង ២.១ ផ្នែក គ)

- ១) ប្រភពថវិកា "មូលនិធិមានភ្ជាប់លក្ខខ័ណ្ឌ" ឬ "មូលនិធិគ្មានភ្ជាប់លក្ខខ័ណ្ឌ និងមូលនិធិផ្សេងៗ"
- ២) តម្លៃសរុបរបស់គម្រោង ត្រូវបែងចែកទៅតាមឆ្នាំមូលដ្ឋាន៖
"កម្រិតទុនវិនិយោគ តាមឆ្នាំ"
- ៣) បញ្ជីសំណើរគម្រោងពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានពិនិត្យ។

31

សូមអរគុណ!

